

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國115年3月9日
發文字號：雲環行字第1150002765號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第七次估驗，既經監造單位同意，同意核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所115年2月12日碩環字第1150212001號函。
- 二、第七次估驗資料1式3份，由久木營造有限公司、貴事務所及本局各執1份據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

電子交換

雲林縣環境保護局

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第七次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：115.01.01~115.01.31

共同投標估驗計價款各成員分配表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

估驗日期：115年01月31日

估驗次別：第七次

成員名稱	本期分配金額	累計分配金額	廠商確認核章
久木營造有限公司	16,639,140	截至上期:130411179 (如後附第6期估驗) 130411179+16639140 = 147,050,319	 
祥旺機電工程有限公司	0	0	 
正益空調工程有限公司	0	0	 
合計	16,639,140	147,050,319	

۱۰۰





雲林縣環境保護局
工程採購估驗申請書(第七次估驗)

填表日期：115年01月31日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	18,783,936 ✓	已估驗金額 <small>原估驗金額</small>	134,461,011 ✓
本次估驗金額	17,514,884 ✓	累計估驗金額	151,975,895 <small>134461011 + 17514884</small>
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月16日
本次估驗基準日	115年01月31日	前次估驗基準日	114年12月31日
本次估驗基準日之預定進度	19.774%	前次估驗基準日之預定進度	16.588%
本次估驗基準日之實際進度	25.069%	前次估驗基準日之實際進度	22.154%

檢附：估驗計價文件(1式3份)：

- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。(無者免)
- 9. 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
	柯乃文 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合契約約定。 <input type="checkbox"/> 未符契約約定。	 

100

100

100

100

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

11514884/601000000

第1頁共1頁 單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		估驗次別	7	完成百分比	本次 2.89
工程編號	開工日期	114年06月17日	原契約金額	607,000,000	累計	25.04
契約編號	履約期限	610日曆天	最近一次契約變更後之契約金額		已工作日數	229
廠商名稱	估驗期間	115年01月31日	累計撥付預付款		累計撥付未扣回預付款	
估驗詳細表						
	物價指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)	備註
本次	估驗計價款(C)		875,744	→ 估驗款已在114年11月截止·收放	16,639,140	
截至前次累計	17,514,884	16000	4,033,832	0.05 · 11514884 × 0.05	130,411,179	
截至本次累計	134,461,011	16,000	4,909,576		147,050,319	
本次「扣款」(E1)欄位內容說明：						

本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「建約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：






監造單位	承辦人	科長	秘書	副局長	局長
	 科員馬弘任	 科長馬弘任	 115.2.6	 黃富義	 張喬維
承包廠商	柯乃文				
承包廠商專任工程師					
 柯乃文					

雲林縣環境保護局 估驗請款計價單

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		第7次付款		第1頁共1頁	
工程編號	114-041	實際開工日期	114年06月17日	預算施工金額	607,000,000	本期核發金額	16,639,140
契約編號	雲林縣虎尾鎮	規定完工期限	610日曆天	承包金額	607,000,000	本期應扣金額	
工程地點	久木營造有限公司	估驗日期	115年01月31日	變更設計 增減金額	0	本期實發金額	16,639,140
施工單位				結果淨增·減	0	以前核發金額	130,411,179
					0	總計核發金額	147,050,319

估驗項目	原契約或追加減後總價	完成百分率		估驗計價		保留金額		核發金額		備註
		本次	累計	本次	累計	本次	累計	本次	累計	
施工費(115年01月31日)	607,000,000	2.89	25.04	17,514,884	151,975,895	875,744	4,909,576	16,639,140	147,066,319	→ 加入之前估驗金額 16,000,000
物價指數調整款(115年01月)										
合計				17,514,884	151,975,895	875,744	4,909,576	16,639,140	147,066,319	

項 目	金額	專任工程人員：柯乃文
本 次 應 扣 還 金 額		
合 計		

承辦人	科長	秘書	副局長	局長
 科員馬弘任	 科長馬弘任	 秘書張富義	 副局長黃富義	 局長張喬維

雲林縣環境保護局

計價保留金額計算(第8期,截至115年01月31日止)

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼 構、木構、門窗、金屬、裝 修、防水、雜項、設備、景觀 工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工 程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	15,193,976.00		
甲.貳	機電工程	15,193,976.00		
	小計	100.00%		
	第07期			
甲.參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	86,209.35		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	183,948.50		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	1,215,518.08		
甲.陸	臨時設施,工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%	833,982.60		
甲.捌	營業稅 5%	17,514,884.53		
	小計	17,514,884		
	合計	875,744	17,514,884	
	保留金額小計		875,744	
	(B)保留金額合計		875,744	

物調保留金額計算

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計			
	合計			
	物調保留金額小計			
	(D)保留金額合計			

核發金額核算

	本期估驗計價	17,514,884	
	-估驗計價保留款	875,744	
	本期物調指數		
	-物調指數保留款		
	總價(總計)	16,639,140	
	(E)核發金額合計	16,639,140	

註：以上保留金額計算方式(第1成員：久木-5%)、(第2成員：祥旺-5%)、(第3成員：正益-5%)

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價總表

核對前期資料 數字水


核對契約及契約變更數字

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	發包工程費									
壹	建築工程									
一	假設及拆除工程		1	20,206,750	✓	20,206,750	1	290,430.00	1	8,888,890.00
二	基礎工程		1	22,152,085	✓	22,152,085	1	21,623,615.34	1	21,623,615.34
三	建築結構體工程		1	122,725,370	✓	122,725,370	1	80,784,930.00	1	92,081,070.00
四	鋼構工程		1	28,800,734	✓	28,800,734				
五	木構工程		1	25,366,336	✓	25,366,336				
六	門窗工程		1	51,756,778	✓	51,756,778			1	476,256.00
七	金屬工程		1	44,582,805	✓	44,582,805				
八	地坪裝修工程		1	18,757,610	✓	18,757,610	1	174,800.00	1	174,800.00
九	牆面裝修工程		1	23,725,575	✓	23,725,575				
十	坪頂裝修工程		1	20,177,200	✓	20,177,200			1	2,186,150.00
十一	防水工程		1	9,913,150	✓	9,913,150	1	3,223,300.00	1	4,168,300.00
十二	雜項工程		1	12,147,925	✓	12,147,925				
十三	設備工程		1	3,817,880	✓	3,817,880				
十四	景觀工程		1	12,526,947	✓	12,526,947				
貳	建築工程合計(甲.壹)			416,657,145	✓	416,657,145		15,193,976.00		129,599,081.34
	機電工程									
一	電氣工程		1	33,970,706	✓	33,970,706				
二	弱電工程		1	24,731,200	✓	24,731,200				
三	給排水設備工程		1	12,340,000	✓	12,340,000				
四	消防工程		1	7,196,210	✓	7,196,210				
五	空調工程		1	31,644,846	✓	31,644,846				
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集		1	874,000	✓	874,000				
	機電工程合計(甲.貳)			110,756,962	✓	110,756,962				
	直接工程費用			527,414,107	✓	527,414,107		114,405,105.34		129,599,081.34

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價總表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 2 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)					99	234,187	234,187	1	81,965.45	1	234,187	1	93,674.80
一	職業安全衛生，可量化部分		1	234,187	234,187	1	234,187	234,187	1	81,965.45	1	234,187	1	93,674.80
二	職業安全衛生，不可量化部分		1	990,000	990,000	1	990,000	990,000	1	346,500.00	1	990,000	1	396,000.00
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)		1	2,178,677	2,178,677	1	2,178,677	2,178,677	1	307,206.20	1	2,178,677	1	1,307,206.20
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)		1	500,000	500,000	1	500,000	500,000	1	175,000.00	1	500,000	1	200,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)													
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1	2,650,000	2,650,000	1	2,650,000	2,650,000	1	927,500.00	1	2,650,000	1	1,060,000.00
二	品質管理，材料設備檢驗費		1	514,485	514,485	1	514,485	514,485	1	257,242.50	1	514,485	1	308,691.00
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標準申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)		1	42,193,129	42,193,129	1	42,193,129	42,193,129	1	9,152,408.43	1	42,193,129	1	10,367,926.51
陸	合計(甲.壹~甲.伍)			576,674,585	576,674,585	1	576,674,585	576,674,585	1	126,652,927.92	1	576,674,585	1	143,332,579.85
柒	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)		1	50,000	50,000	1	50,000	50,000	1	33,750.00	1	50,000	1	35,000.00
捌	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1	1,441,686	1,441,686	1	1,441,686	1,441,686	1	1,441,686.00	1	1,441,686	1	1,441,686.00
捌	營業稅(甲.壹~甲.伍合計5%)		1	28,833,729	28,833,729	1	28,833,729	28,833,729	1	6,332,646.40	1	28,833,729	1	7,166,628.99
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)			607,000,000	607,000,000	1	607,000,000	607,000,000	1	134,461,010.31	1	607,000,000	1	151,975,894.84
	總價(總計)			607,000,000	607,000,000	1	607,000,000	607,000,000	1	134,461,011	1	607,000,000	1	151,975,895

承包廠商：

監造單位：



估驗數量
計算表

2000/20月工期
200發
估驗數量
計算表

5300000/20月工期
2265000/20

132,500.00

51,448.50

1,215,518.08

16,679,651.93

1,250.00

833,982.60

17,514,884.53

17,514,884

雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
甲	發包工程費													
壹	建築工程													
一	假設及拆除工程													
1	工地拆除、拆除、清除與整平，含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	✓ 350,000	0.50	✓ 175,000.00					0.50	175,000.00	
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	✓ 465,000	150.00	✓ 232,500.00					150.00	232,500.00	
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬	M	525.00	6,000	✓ 3,150,000	472.00	✓ 2,832,000.00					472.00	2,832,000.00	
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	✓ 97,000	1.70	✓ 82,450.00					1.70	82,450.00	
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	✓ 28,500	0.80	✓ 22,800.00					0.80	22,800.00	
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆	座	1.00	77,500	✓ 77,500	0.90	✓ 69,750.00					0.90	69,750.00	
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	120,000	✓ 120,000	0.68	✓ 81,000.00			0.025	3,000.00	0.700	84,000.00	
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	✓ 36,000	0.50	✓ 18,000.00					0.50	18,000.00	
9	竣工文件，竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	✓ 50,000									
10	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等	棟	1.00	230,000	✓ 230,000	1.00	✓ 230,000.00					1.00	230,000.00	

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
11	工地臨時建築設施,辦公設備,租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	✓ 66,890	1.00	✓ 66,890.00	1.00	66,890.00	1.00	66,890.00	1.00	66,890.00	
12	工地臨時建築設施,臨時廁所	組	1.00	37,800	✓ 37,800	1.00	✓ 37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	1.00	37,800.00	
13	臨時設施,工程用電設備、用水、資通訊設備,含申請及設備架設	式	1.00	150,000	✓ 150,000	1.00	✓ 150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	1.00	150,000.00	
14	臨時設施,臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	✓ 760,000	7.00	✓ 266,000.00	1.00	38,000.00	8.00	304,000.00	8.00	304,000.00	
15	施工輔助設施,施工架及防護網,鋼管,裝拆(含租金),扶手先行,含上下設備及其他所需配件,pc鋪底,圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	✓ 5,982,990	3,783.00	✓ 2,610,270.00	447.00	308,430.00	4,230.00	2,918,700.00	4,230.00	2,918,700.00	
16	施工輔助設施,內部施工活動架,鍍鋅鋼管,裝拆(含租金),含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	✓ 1,681,680	550.00	✓ 242,000.00	200.00	88,000.00	750.00	330,000.00	750.00	330,000.00	
17	施工輔助設施,內部施工活動架,鍍鋅鋼管,裝拆(含租金),含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	✓ 1,296,680	2,800.00	✓ 1,232,000.00	2,800.00	- 1,232,000.00	- 2,800.00	- 1,232,000.00	- 2,800.00	- 1,232,000.00	
18	施工輔助設施,支撐排架,鋼管,裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	✓ 2,591,910	310	✓ 2,591,910	3,500.00	1,085,000.00	3,500.00	1,085,000.00	3,500.00	1,085,000.00	
19	工地清理,交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	✓ 1,000,000									
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.50	✓ 250,000.00					0.50	250,000.00	
21	工地清理,營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	✓ 1,052,800									
22	資料送審(含竣工圖、竣工資料製作、建築勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標章作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用)	式	1.00	350,000	✓ 350,000									
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	✓ 132,000									

承包廠商：




監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額			
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
	小計				√20,206,750			√8,598,460.00					290,430.00		8,888,890.00
二	基礎工程														
1	施工測量, 工地放樣	M2	19,980.00	50	✓ 999,000	10,460.00	✓ 523,000.00	10,460.00	✓ 523,000.00	10,460.00	✓ 523,000.00	10,460.00	✓ 523,000.00	10,460.00	523,000.00
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存	M3	17,789.895	300	✓ 5,336,969	17,789.90	✓ 5,336,968.50	17,789.895	✓ 5,336,968.50	17,789.895	✓ 5,336,968.50	17,789.895	✓ 5,336,968.50	17,789.895	5,336,968.50
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度	M3	4,874.895	300	✓ 1,462,469	4,700.00	✓ 1,410,000.00	4,700.00	✓ 1,410,000.00	4,700.00	✓ 1,410,000.00	4,700.00	✓ 1,410,000.00	4,700.00	1,410,000.00
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置	M3	12,915.00	247	✓ 3,190,005	12,915.00	✓ 3,190,005.00	12,915.00	✓ 3,190,005.00	12,915.00	✓ 3,190,005.00	12,915.00	✓ 3,190,005.00	12,915.00	3,190,005.00
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm2, t=5cm	M2	1,435.00	1,390	✓ 1,994,650	1,435.00	✓ 1,994,650.00	1,435.00	✓ 1,994,650.00	1,435.00	✓ 1,994,650.00	1,435.00	✓ 1,994,650.00	1,435.00	1,994,650.00
6	安全觀測系統	式	1.00	140,200	✓ 140,200	1.00	✓ 140,200.00	1.00	✓ 140,200.00	1.00	✓ 140,200.00	1.00	✓ 140,200.00	1.00	140,200.00
7	抽水, 點井, 深度<6m	支	48.00	40,000	✓ 1,920,000	48.00	✓ 1,920,000.00	48.00	✓ 1,920,000.00	48.00	✓ 1,920,000.00	48.00	✓ 1,920,000.00	48.00	1,920,000.00
8	擋土設施, 鋼板樁L=9M	M	235.60	11,874.15	✓ 2,797,550	235.60	✓ 2,797,549.74	235.60	✓ 2,797,549.74	235.60	✓ 2,797,549.74	235.60	✓ 2,797,549.74	235.60	2,797,549.74
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15, L=13M	支	295.00	14,614.38	✓ 4,311,242	295.00	✓ 4,311,242.10	295.00	✓ 4,311,242.10	295.00	✓ 4,311,242.10	295.00	✓ 4,311,242.10	295.00	4,311,242.10
	小計				√22,152,085			√21,623,615.34							21,623,615.34
三	建築結構體工程														
1	普通模板, (建築, 建築物)	M2	31,257.00	1,110	✓ 34,695,270	18,113.00	✓ 20,105,430.00	18,113.00	✓ 20,105,430.00	3,649.00	4,050,390.00	21,762.00	24,155,820.00	21,762.00	24,155,820.00
2	清水模板, (建築, 建築物)	M2	6,717.00	1,200	✓ 8,060,400	3,540.00	✓ 4,248,000.00	3,540.00	✓ 4,248,000.00	810.00	972,000.00	4,350.00	5,220,000.00	4,350.00	5,220,000.00
3	鉚接鋼線網, 點焊鋼線網 \$ 7x150x150mm	M2	57.00	500	✓ 28,500										
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.00	33,000	✓ 46,563,000	1,005.00	✓ 33,165,000.00	1,005.00	✓ 33,165,000.00	162.00	5,346,000.00	1,167.00	38,511,000.00	1,167.00	38,511,000.00
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級	個	4,729.00	250	✓ 1,182,250	3,923.00	✓ 980,750.00	3,923.00	✓ 980,750.00			3,923.00	980,750.00	3,923.00	980,750.00
6	結構用混凝土, 140kgf/cm2, 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	✓ 885,000	295.00	✓ 885,000.00	295.00	✓ 885,000.00			295.00	885,000.00	295.00	885,000.00
7	結構用混凝土, 280kgf/cm2, 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	✓ 29,578,500	5,829.50	✓ 20,403,250.00	5,829.50	✓ 20,403,250.00	241.50	845,250.00	6,071.00	21,248,500.00	6,071.00	21,248,500.00
8	水泥混凝土鋪面, t=40cm, 輕質混凝土	M3	55.00	2,500	✓ 137,500										



監造單位:



承包廠商:

雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 4 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1:3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	✓ 15,750									
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	✓ 1,579,200	6,650.00	✓ 997,500.00	550.00	82,500.00	7,200.00	1,080,000.00			
	小計				✓ 122,725,370		✓ 80,784,930.00				11,296,140.00		92,081,070.00	
四	鋼構工程													
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	✓ 4,182,000									
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	✓ 164,000									
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	✓ 738,000									
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	✓ 16,287,000									
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	✓ 712,000									
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	✓ 57,200									
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	✓ 145,600									
8	高拉力螺柱 M2 S10T	支	1,294.00	85	✓ 109,990									
9	剪力釘 ϕ 22mm L=125mm	支	504.00	36	✓ 18,144									
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	✓ 43,200									
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	✓ 61,500									
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	✓ 234,000									
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	✓ 5,606,280									
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	✓ 41,820									
15	建築鋼結構，鋼構梯(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	✓ 400,000									

承包廠商：




監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 6 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
8	W140*H240 鋁窗，推射+橫拉式，電動排煙，WD04-F， W140*H240	樞	15.00	28,560	✓ 428,400									
9	鋁窗，鋁百葉，WD11，W140*H240	樞	3.00	25,200	✓ 75,600									
10	鋁窗，防火檢修門，60A，WD12，W50*H80	樞	5.00	7,200	✓ 36,000									
11	鋁窗，推射式，鋁百葉，WD13，W130* H240	樞	6.00	24,960	✓ 149,760									
12	防水閘門，不銹鋼，D03	樞	1.00	504,000	✓ 504,000									
13	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板 門，D01，W90*H220	樞	9.00	15,260	✓ 137,340									
14	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板 門，D04，W120*H220	樞	2.00	19,160	✓ 38,320									
15	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門， D05，W80*H220	樞	6.00	12,320	✓ 73,920									
16	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門， D06，W100*H220	樞	15.00	15,400	✓ 231,000									
17	鋼門扇及門樞，推射式，防火門，60A， D06-F，W100*H220	樞	6.00	39,600	✓ 237,600			0.90	35,640.00			0.90	35,640.00	
18	鋁門扇及門樞，橫拉門，熱固性樹脂板門 ，D07，W100*H220	樞	7.00	14,960	✓ 104,720									
19	鋼門扇及門樞，推射式，防火門，60A， D08-F，W120*H220	樞	16.00	47,520	✓ 760,320			1.80	85,536.00			1.80	85,536.00	
20	鋁門扇及門樞，橫拉門，紙蕊蜂巢美耐板 門，D09，W100*H220	樞	1.00	20,000	✓ 20,000									
21	鋼門扇及門樞，推射式，防火門，60A， D10F，W100*H220	樞	14.00	39,600	✓ 554,400			1.50	59,400.00			1.50	59,400.00	



監造單位：



承包廠商：

雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 7 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
22	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D11，W100*H320	樞	6.00	19,200	✓ 115,200									
23	鋁門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220	樞	8.00	79,200	✓ 633,600			2.40	190,080.00	2.40	190,080.00			190,080.00
24	鋁門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220	樞	12.00	88,000	✓ 1,056,000			1.20	105,600.00	1.20	105,600.00			105,600.00
25	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D15，W140*H320	樞	2.00	29,120	✓ 58,240									
26	鐵捲門，(A種防火門，1小時防火時效)，SD01，W600*H370	樞	1.00	375,000	✓ 375,000									
27	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GDI，W120*H220	樞	19.00	17,160	✓ 326,040									
28	鋁門扇及門樘，推射式，防火玻璃門，60A，GD01F，W120*H220	樞	3.00	52,800	✓ 158,400									
29	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD02，W180*H220	樞	1.00	29,700	✓ 29,700									
30	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD03，W150*H220	樞	2.00	24,750	✓ 49,500									
31	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD04，W150*H240	樞	1.00	27,000	✓ 27,000									
32	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD05，W200*H240	樞	1.00	36,000	✓ 36,000									
33	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD07，W130*H220	樞	11.00	21,450	✓ 235,950									
34	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD08，W100*H220	樞	21.00	14,300	✓ 300,300									

承包廠商：




監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 8 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
35	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD09，W120*H240	樘	3.00	18,720	✓ 56,160									
36	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD10，W240*H240	樘	1.00	43,200	✓ 43,200									
37	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD11，W220*H240	樘	1.00	39,600	✓ 39,600									
38	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD12，W155*H210	樘	1.00	16,300	✓ 16,300									
39	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD13，W125*H210	樘	1.00	13,150	✓ 13,150									
40	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD14，W160*H210	樘	1.00	16,800	✓ 16,800									
41	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD15，W180*H210	樘	1.00	18,900	✓ 18,900									
42	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD16，W245*H210	樘	1.00	25,750	✓ 25,750									
43	鋁窗，鋁樞，強化玻璃隔間	M2	728.50	4,000	✓ 2,914,000									
44	鋁窗，鋁樞，防火玻璃隔間	M2	35.00	9,240	✓ 323,400									
45	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆鋁樞架暨強化玻璃帷幕	M2	1,200.00	18,900	✓ 22,680,000									
46	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆造型鋁樞架暨強化玻璃帷幕	M2	530.00	23,800	✓ 12,614,000									
	小計				✓ 51,756,778							476,256.00	476,256.00	
七	金屬工程													
1	建築鋼結構，鋼樑外框架收邊	M2	4,550.00	2,000	✓ 9,100,000									
2	金屬製品，水平花架金屬包板與被襯骨架	M2	495.00	8,600	✓ 4,257,000									



監造單位：



承包廠商：

雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
21	建築鋼結構，鋼構戶外梯面板及收邊	式	1.00	50,000	✓ 50,000									
22	建築鋼結構，並木收邊(國際會議廳屋頂)	M	66.00	6,900	✓ 455,400									
	小計				✓ 44,582,805									
八	地坪裝修工程													
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	✓ 918,000									
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	✓ 6,000,200									
3	鋪地磚，鑿面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	✓ 2,544,360									
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	✓ 302,680	380.00	✓ 174,800.00				380.00	174,800.00		
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	✓ 346,725									
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	✓ 203,550									
7	地毯，建工帶料，含底塗料、防水粘膠及工資，1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	✓ 676,480									
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	✓ 169,550									
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	✓ 2,005,740									
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	✓ 3,228,500									
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	✓ 2,361,525									
	小計				✓ 18,757,610		✓ 174,800.00						174,800.00	
九	牆面裝修工程													
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	✓ 14,230,100						1,496.00	1,720,400.00	1,496.00	1,720,400.00
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	✓ 2,594,025									
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	✓ 1,762,550						405.00	465,750.00	405.00	465,750.00

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
4	外牆紋理碎石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2,150	✓1,784,500									
5	外牆紋理碎石塗料，水泥砂漿打底，一底二度，(W8)	M2	1,560.00	2,150	✓3,354,000									
	小計				✓23,725,575								2,186,150	2,186,150.00
十	坪頂裝修工程													
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	✓6,380,850									
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	✓6,721,000									
3	暗架碎酸鈣板天花，含面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	✓2,409,750									
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	✓4,665,600									
	小計				✓20,177,200									
十一	防水工程													
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含回填保護(後基外牆)，(WP1)	M2	1,390.00	920	✓1,278,800			1,390.00	✓1,278,800.00			1,390.00	1,278,800.00	
2	塗液類防潮，後基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	600	✓1,725,000			1,300.00	✓780,000.00			1,575.00	945,000.00	
3	塗液類防潮，電梯機坑防水(五面施工)，(WP3)	M2	57.00	600	✓34,200									
4	塗液類防潮，地下室外露地坪及牆面防水，H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	✓1,609,500									
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)	M2	2,740.00	425	✓1,164,500			2,740.00	✓1,164,500.00			2,740.00	1,164,500.00	
6	塗液類防潮，外牆樓層接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	280	✓260,400									

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	✓ 583,550					
8	塗液類防潮，屋頂平台及牆面防水，H=30cm，(WP8)	M2	1,989.00	1,500	✓ 2,983,500					
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9)	M2	782.00	350	✓ 273,700					
	小計				✓ 9,913,150			✓ 3,223,300.00	✓ 945,000.00	4,168,300.00
十二	雜項工程									
1	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F,7停)，12人座	台	1.00	2,280,500	✓ 2,280,500					
2	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F,7停)，15人座	台	2.00	2,428,000	✓ 4,856,000					
3	捲簾，電動式，電梯遮運用	組	21.00	52,000	✓ 1,092,000					
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	✓ 44,280					
5	金屬製品(筏基水池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	✓ 124,740					
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	✓ 90,000					
7	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	19.00	1,860	✓ 35,340					
8	浴廁強化美耐板隔間，隔間及門板	M2	193.00	4,215	✓ 813,495					
9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	✓ 272,500					
10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	✓ 42,880					
11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	✓ 115,240					

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
p	戶外單向洗牆壁燈,連工帶料	盞	9.00	4,000	✓ 36,000									
q	戶外雙向洗牆壁燈,連工帶料	盞	21.00	5,000	✓ 105,000									
r	閱讀壁燈,連工帶料	盞	6.00	820	✓ 4,920									
s	戶外插地式投射燈,連工帶料	盞	30.00	4,300	✓ 129,000									
t	上項燈具用防水型變壓器,20W,連工帶料	個	30.00	500	✓ 15,000									
u	戶外嵌入式壁燈,連工帶料	盞	13.00	4,300	✓ 55,900									
v	線性泛光嵌燈,連工帶料	盞	203.00	3,800	✓ 771,400									
w	泛光圓嵌燈,連工帶料	盞	122.00	600	✓ 73,200									
	小計				✓ 3,817,880									
十四	景觀工程													
1	鋪地磚,30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	✓ 3,850,425									
2	鋪地磚,30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	✓ 1,554,300									
3	瀝青混凝土鋪面,(第1類型,密級配),粗粒料37.5mm,黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	✓ 2,616,000									
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	✓ 143,982									
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	✓ 15,000									
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	✓ 132,000									
7	排水管溝,UA型,場鑄,含不銹鋼化妝蓋版	M	282.00	12,780	✓ 3,603,960									
8	排水管溝,UB型,暗溝,場鑄	M	32.00	6,290	✓ 201,280									
9	陰井,含蓋,GA型	組	20.00	8,000	✓ 160,000									
10	陰井,含蓋,GB型	組	15.00	10,000	✓ 150,000									
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	✓ 100,000									
	小計				✓ 12,526,947									
	建築工程合計(甲.壹)				✓ 416,657,145					✓ 114,405,105.34			15,193,976.00	
貳	機電工程												129,599,081.34	

承包廠商:

監造單位:




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 135 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
d	壓及平衡調整													
	空調系統測試、調整及平衡，電力及中央監控系統測試及平衡調整	式	1.00	100,886	✓ 100,886									
	小計				✓ 398,202									
	空調工程合計(甲.貳.五)				✓ 31,644,846									
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	✓ 874,000									
	機電工程合計(甲.貳)				✓ 110,756,962									
	直接工程費用				✓ 527,414,107									129,599,081.34
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)													
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	234,187	✓ 234,187									
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	990,000	✓ 990,000									
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	✓ 2,178,677									
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	✓ 500,000									
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用。(合計約直接工程費用0.6%)													
一	品質管理，品質事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	✓ 2,650,000									
二	品質管理，材料設備檢驗費	式	1.00	514,485	✓ 514,485									
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機													
			1.00	42,193,129	✓ 42,193,129									
			1.00	2,650,000	✓ 2,650,000									
			0.35	927,500.00	✓ 927,500.00									
			0.50	257,242.50	✓ 257,242.50									
			0.10	51,448.50	✓ 51,448.50									
			0.60	1,215,518.08	✓ 1,215,518.08									
			0.40	132,500.00	✓ 132,500.00									
			0.40	11,709.35	✓ 11,709.35									
			0.40	49,500.00	✓ 49,500.00									
			0.60	1,307,206.20	✓ 1,307,206.20									
			0.40	200,000.00	✓ 200,000.00									
			0.05	25,000.00	✓ 25,000.00									
			0.05	81,965.45	✓ 81,965.45									
			0.35	346,500.00	✓ 346,500.00									
			0.60	1,307,206.20	✓ 1,307,206.20									
			0.35	175,000.00	✓ 175,000.00									
			0.35	114,405,105.34	✓ 114,405,105.34									
			0.05	15,193,976.00	✓ 15,193,976.00									



監造單位：



承包廠商：

雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 136 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.~壹.二合計之8%)										
	合計(甲.壹~甲.伍)		1.00	50,000	576,674.535	0.68	33,750.00	0.025	1,250.00	0.700	35,000.00
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	576,674.535	0.68	33,750.00	0.025	1,250.00	0.700	35,000.00
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	1,441,686	1.00	1,441,686.00			1.00	1,441,686.00
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	28,833,729		6,332,646.40		833,982.60		7,166,628.99
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				607,000,000		134,461,010.31		17,514,884.53		151,975,894.84
	總價(總計)				607,000,000		134,461,011		17,514,884		151,975,895

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止)

第 1 頁 共 4 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
一	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	●請款比例：設備0.5+抽排水0.5式，截至12月底已請0.675式 ●本期請款數量0.5/20月=0.025式	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	本期請款數量1月(115年1月)	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	●3F:733.2+113.39+155.2=1001.79 M2 ●截至12月底已請3783 M2 ●本期請款數量4230-3783=447 M2	447.00	附件1
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	●B1~2F挑高區:159.46+2278+367.88=2805.34 M2 ●B1~3F電梯井:150.12+127.88+111.2*2=500.4 M2 ●合計:2805.34+500.4=3305.74 M2，截至12月底已請550 M2 ●本期請款數量750-550=200 M2	200.00	附件2
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	●1F:2251.59+2116.73=4368.26 M3，截至12月底已請2800 M3 ●本期請款數量3500-2800=700 M3	700.00	附件3
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	●2F:5284.78-1121.94-3000(12月已請)=1162.84 M2 3F:4041.03-925.67=3115.36 M2 合計1162.84+3115.36=4278.2 M2 ●截至12月底已請19613 M2 ●本期請款數量23263-19613=3649 M2	3,649.00	附件4
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	●3F頂版925.67 M2 ●截至12月底已請3540 M2 ●本期請款數量4350-3540=810 M2	810.00	附件4
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	●材料進出管制表:1150116累計進料(3F頂樑版)1172.19 T ●截至12月底已請1005 T ●本期請款數量1167-1005=162 T	162.00	附件5

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 2 頁 共 4 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
7	結構用混凝土，280kgf/cm ² ，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 1/17 國際會議廳3F頂版247.5 M3 ● 截至12月底已請5829.5 M3 ● 本期請款數量6071.5829.5=241.5 M7 	241.50	附件6
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 3F國際會議廳:24.5*22.5=551.25 M2 ● 截至12月底已請6650 M2 ● 本期請款數量7200-6650=550 M2 	550.00	
九	牆面裝修工程					
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 請款比例：油漆30%+粉光25%+打底45% ● B1F:2374.71 M2→粉光完成約90%→2374.71*0.9=2137.24 M2 ● 截至12月底已請450 M2 ● 本期請款數量2137.24*70%=1496 M2 	1,496.00	附件7
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	<ul style="list-style-type: none"> ● B1F:450 M2→粉光完成約90%→450*0.9=405 M2 ● 本期請款數量405 M2 	405.00	附件7
十一	防水工程					
2	塗液類防潮，筏基水池防水防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	<ul style="list-style-type: none"> ● B1F外牆內側:220.5*3.4=749.7 M2 ● 筏基水池:773.05+3*4.55+1017.7=2125.3 M2 ● 合計749.7+2125.3=2875 M2 ● 截至12月底已請1300 M2 ● 本期請款數量2875-1300=1575 M2 	1,575.00	
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 前期已施作完成金額128,919.4元 第12~21項59,940 元 第1.3~9.11項68,979.4 元 ● 前期未請款金額46,953.95 元 OK ● 本期施作完成金額7,235.2 元 第1.3~9.11項7,235.2 元 	0.05	

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 3 頁 共 4 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
				<ul style="list-style-type: none"> ● 本期請款金額11,709.35元 ● 本期尚未請款金額42,479.8 元 → 46953.95 + 7235.2 - 11009.35 		
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額49,500元 ● 本期請款金額49,500元 ● 本期尚未請款金額0 元 	0.05	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額25,000 元 ● 本期請款金額25,000 元 ● 本期尚未請款金額0 元 	0.05	
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額132,500 元 ● 本期請款金額132,500 元 ● 本期尚未請款金額0 元 	0.05	
二	品質管理，材料設備檢試驗費	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 前期已施作完成金額258,001 元 第1項: 50*1300=65,000 元 第2項: 50*350=17,500 元 第3項: 50*500=25,000 元 第4項: 25*600=15,000 元 第5項: 10*1780=17,800 元 第6項: 3*7809=23,427 元 第7項: 5*2659=13,295 元 第9項: 1*5000=5,000 元 第10項: 20*3000=60,000 元 第12項: 2*4000=8,000 元 第15項: 7,979 元 ● 前期未請款金額757.5 元 	0.10	

承包廠商：




監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 7 次，第 8 期估驗工程款(截至115年01月31日止) 第 4 頁 共 4 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
				<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額 51,663 元 第5項: 10*1780=17,800 元 第6項: 2*7809=15,618 元 第9項: 1*5000=5,000 元 第12項: 3*4000=12,000 元 第14項: 1*1245=1,245 元 ● 本期請款金額 51,448.5 元 ✓ ● 本期尚未請款金額 972 元 		
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 請款比例: 設備 0.5+ 剪輯 0.5 式 ● 本期請款數量 0.5/20 = 0.025 式 	0.025	



承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局

115年1月份計算式

項次	項目及說明	單位	契約數量	BI	1F	合計	請款數量	備註
17	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220	樘	6		1	1	0.9	3*0.3=0.9
17.1	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D06-F-1，W110*H220	樘	0		2	2		
19	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220	樘	16	4	2	6	1.8	6*0.3=1.8
21	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220	樘	14	1		1		
21.1	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D10F-1，W110*H220	樘	0	2	2	4	1.5	5*0.3=1.5
23	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220	樘	8	8		8	2.4	8*0.3=2.4
24	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220	樘	12	1	2	3	1.2	4*0.3=1.2
24.1	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F-1，W180*H220	樘	13		1	1		

★防火門：本期請門框安裝完成30%

承包廠商：



監造單位：



工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架	計算式	A	B	= $(A) \times (B)$
	單位	M	M	M ²
1	B1F	177.7	6.8	1208.36
2	1F	226.5	4.6	1041.90
3	2F	233	4	932.00
4	3F	183.3	4	733.20
5	3F女兒牆	66.7	1.7	113.39
6	4F	168.5	4	674.00
7	4F挑空區	58.4	4	233.60
8	5F	168.5	4	674.00
9	5F挑空區	58.4	4	233.60
10	6F	137.6	5.1	701.76
11	6F女兒牆	119.2	1.7	202.64
12	6F挑空區	34.6	5.1	176.46

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架 (第二排)	計算式	A	B	= $(A) \times (B)$
	單位	M	M	M ²
1	1F	134.3	4.6	617.78
2	2F	140	4	560.00
3	3F	38.8	4	155.20




工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
挑高區室內架

編號(B3~2F)	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	內架周長	樓高	鋼管鷹架
室內鷹架	計算式	A	B	=(A)*(B)
	單位	M	M	M2
1	B1F	46.9	3.4	159.46
2	1F	268	8.5	2278.00
3	2F	54.1	6.8	367.88

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
電梯用施工架

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架	計算式	A	B	=(A)*(B)
	單位	M	M	M2
1	B1F	27.8	5.4	150.12
2	1F	27.8	4.6	127.88
3	2F	27.8	4	111.20
4	3F	27.8	4	111.20
5	4F	27.8	4	111.20
6	5F	27.8	4	111.20
7	6F	27.8	4	111.20



工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

挑空區

項次	(A)	(B)	(1)
工項名稱	滿鋪面積	樓高	挑空模板支撐架(M3)
計算式	A	B	=(A)*(B)
單位	M2	M	M3
1F國際會議廳	333.56	6.75	2251.53
1F大廳	250.5	8.45	2116.73
1F木構造區	165.89	12.45	2065.33
5F挑高區	206.52	7.4	1528.25



工程編號：H241103

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別:A

各施工樓層統計表(物件)


各施工樓層*模版*總結果(單位:M2)

列表日期:2024/12/25
共 1 頁 第 1 頁

樓層	柱	樑	版	牆	樓梯	基礎	額 外	扣 接 頭	小 計	累 計
R				119.13					119.13	33,177.44
6	218.00	676.68	386.67	2,184.30				-683.96	2,781.68	33,058.31
5	400.40	1,193.50	731.17	2,734.99	43.13			-844.71	4,258.48	30,276.63
4	400.40	1,061.00	743.16	2,483.81	43.13			-819.02	3,912.48	26,018.14
3	408.40	1,113.73	925.67	2,309.09	43.13			-758.99	4,041.03	22,105.67
2	524.80	1,622.00	1,121.94	2,806.14	43.13			-833.23	5,284.78	18,064.64
1	629.28	1,147.21	711.57	3,537.63	47.13			-748.10	5,324.73	12,779.86
B1	825.12	2,603.69	1,996.25	3,034.64	40.80	36.00	-95.45	-985.92	7,455.13	7,455.13
F	409.60	4,361.98	839.02				-83.00	-1,837.76	3,689.84	
小計	3,816.00	13,779.79	7,455.45	19,209.72	260.45	36.00	-178.45	-7,511.68	36,867.28	36,867.28
損耗										
合計	3,816.00	13,779.79	7,455.45	19,209.72	260.45	36.00	-178.45	-7,511.68	36,867.28	36,867.28



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
7月11日	#4	102.84	102.84	
7月11日	#6	11	113.84	
7月11日	#8	12.82	126.66	
7月11日	#10	117.4	244.06	
7月15日	#4	10.14	254.2	
7月15日	#5	1.65	255.85	
7月15日	#8	20.99	276.84	
7月15日	#10	1.42	278.26	
7月18	#4	42.36	320.62	
7月18	#5	8.86	329.48	
7月18	#6	10.74	340.22	
7月18	#10	1.19	341.41	
8月18	#3	3.2	344.61	筏基版
8月18		61.89	406.5	筏基版
8月18	#5	0.6	407.1	筏基版
8月29	#3	10.26	417.36	地下室柱牆
8月29	#4	36.53	453.89	地下室柱牆
8月29	#5	20.66	474.55	地下室柱牆
8月29	#8	20.19	494.74	地下室柱牆
8月29	#10	1.6	496.34	地下室柱牆
9月29	#3	0.73	497.07	地下室頂版梁
9月29	#4	36.52	533.59	地下室頂版梁
9月29	#5	1.28	534.87	地下室頂版梁
9月29	#6	1.12	535.99	地下室頂版梁
9月29	#7	14.88	550.87	地下室頂版梁
9月29	#8	63.4	614.27	地下室頂版梁
10月1	#3	4.6	618.87	地下室頂版版
10月1	#4	59.75	678.62	地下室頂版版
10月13	#3	22.66	701.28	1樓柱牆
10月13	#4	21.81	723.09	1樓柱牆
10月13	#5	5.6	728.69	1樓柱牆
10月13	#8	17.24	745.93	1樓柱牆
10月13	#10	1.31	747.24	1樓柱牆
10月28	#3	1.43	748.67	國際會議廳
10月28	#4	8.59	757.26	國際會議廳
10月28	#8	6.65	763.91	國際會議廳
11月3日	#4	3.27	767.18	車道
11月3日	#5	4.71	771.89	車道
11月3日	#7	0.31	772.2	車道



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
11月3日	#8	0.8	773	車道
11月3日	#10	2.3	775.3	車道
011月13	#4	2.98	778.28	補料
11月15	#4	2.89	781.17	補料
11月17日	#3	2.66	783.83	1樓頂版
11月17日	#4	35.41	819.24	1樓頂版
11月17日	#5	1.37	820.61	1樓頂版
11月17日	#6	0.18	820.79	1樓頂版
11月17日	#7	6.37	827.16	1樓頂版
11月17日	#8	30.3	857.46	1樓頂版
11月17日	#10	0.65	858.11	1樓頂版
11月28日	#3	16.41	874.52	2樓柱牆
11月28日	#4	14.12	888.64	2樓柱牆
11月28日	#5	4.33	892.97	2樓柱牆
11月28日	#8	11.48	904.45	2樓柱牆
11月28日	#10	1.16	905.61	2樓柱牆
12月17日	#3	2.46	908.07	2樓頂版
12月17日	#4	48.3	956.37	2樓頂版
12月17日	#5	1.16	957.53	2樓頂版
12月17日	#6	0.13	957.66	2樓頂版
12月17日	#7	7.53	965.19	2樓頂版
12月17日	#8	33.17	998.36	2樓頂版
12月17日	#10	0.1	998.46	2樓頂版
12月29日	#3	15.31	1013.77	3樓柱牆
12月29日	#4	13.61	1027.38	3樓柱牆
12月29日	#5	5.16	1032.54	3樓柱牆
12月29日	#8	8.38	1040.92	3樓柱牆
1月2日	#3	2.05	1042.97	國際會議廳2f頂版
1月2日	#4	20.4	1063.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#7	4	1067.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#8	14.2	1081.57	國際會議廳2f頂版
1月16日	#3	1.97	1083.54	3樓頂版
1月16日	#4	47.37	1130.91	3樓頂版
1月16日	#5	1.1	1132.01	3樓頂版
1月16日	#6	0.12	1132.13	3樓頂版
1月16日	#7	4.83	1136.96	3樓頂版
1月16日	#8	30.66	1167.62	3樓頂版
1月16日	#10	4.57	1172.19	3樓頂版




瑁育預拌混凝土股份有限公司

斗六廠

工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新築預拌混凝土送貨單
 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司
 施工地點：日期：115/01/17

編號：SH15010354
 下料序號：

第三聯：客戶存執

車 號	KLM-2237	強 度	280	Kg/cm ²
車 次	第 28 車	設計坍度	18	CM
數 量	4.5 M ³	最大骨材	19	MM
累計數量	247.5 M ³			
總 重	23,080 Kg			
空 重	12,400 Kg			
淨 重	10,680 Kg			
施 工 點	虎尾高鐵學府一路-B棟三F頂板 0923-383-819陳主任			
出車時間	14:50	到達時間		卸料時間
調 度 員	ML林湘詒	工地簽收		
備 註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地 址	電 話



工程預算項目總表

列表日期:2024/12/25
共 1 頁 第 1 頁

工程編號: H241103
工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別: A

工 料 名 稱	單 位	F	B1	1	2	3	4	5	6	R
W1 牆面1:3水泥粉光+批土+水泥漆(一底二度)	M2		2,374.71	2,079.18	1,882.00	1,599.35	1,612.82	1,645.61	1,180.33	
W5 牆面水泥砂漿打底, 面層粉光			450.00	180.50	180.50	180.50	180.50	180.50	180.50	
WP2 滯洪池防水層+1:2水泥砂漿粉光打底(五面施工)	M2	773.05								
WP2 消防水池防水層+1:2水泥砂漿粉光打底(五面施工)	M2	334.55								
WP2 雨水回收池防水層+1:2水泥砂漿粉光打底(五面施工)	M2	1,017.70								





公共工程監造報表

表報編號：雲A01_1150131

本日天氣：上午：晴☀️ 下午：晴☀️

填報日期：115年01月31日(星期六)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程					
契約工期	600天	開工日期	114年06月17日	預定完工日期	116年02月16日	實際完工日期	-
契約變更次數		1次	工期展延天數		10.0天	契約金額	原契約： 607,000,000元
預定進度(%)	19.7740%		實際進度(%)		25.0690%		變更後契約： 607,000,000元
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):							
預留筋綁紮_A棟_3F頂板 模板放樣_A棟_3F頂板 泥作放樣_1F_牆 鑽孔植筋工程_B1F_水箱蓋							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):							
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):							
四、督導工地職業安全衛生事項:							
(一)施工前檢查事項辦理情形: <input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成							
(二)其他工地安全衛生督導事項:							
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):							
監造單位簽章:							
 115.1.31.							

註：

1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

建築物施工日誌

表報編號： 229

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/1/31

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0		天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	229	日曆天	剩餘工期		381
預定進度(%)	19.774%	實際進度(%)	25.069%	本日實際進度(%)	0.033%	展延工期	10		天
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
甲	發包工程費								
一	假設及拆除工程								
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)			式	1.00		0.50		
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬			M	300.00		150.00		
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬			M	525.00		525.00		
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)			檯	2.00		2.00		
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)			檯	1.00		1.00		
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆			座	1.00		1.00		
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池			式	1.00		1.00		
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)			式	1.00		1.00		
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 二層建築), 長16.5m, (跨度, 3k, 5.4-5.64m), 含水電空調等			棟	1.00		1.00		
11	工地臨時建築設施, 辦公設備, 租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)			式	1.00		1.00		
12	工地臨時建築設施, 臨時廁所			組	1.00		1.00		
13	臨時設施, 工程用電設備、用水、資通訊設備, 含申請及設備架設			式	1.00		1.00		
14	臨時設施, 臨時水、電、電信通訊費			月	20.00		8.00		
15	施工輔助設施, 施工架及防護網, 鋼管, 裝拆(含租金), 扶手先行, 含上下設備及其他所需配件, pc鋪底, 圓盤系統施工架			M2	8,671.00		4,230.00		
16	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(結構挑高區室內架)			M2	3,822.00		750.00		
18	施工輔助設施, 支撐排架, 鋼管, 裝拆(含租金)			M3	8,361.00		3,500.00		
20	動土典禮及完工啟用典禮			式	1.00		0.50		
二	基礎工程								
1	施工測量, 工地放樣			M2	19,980.00		10,460.00		
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存			M3	17,789.90		17,789.90		
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85% ≤ 壓實度			M3	4,874.90		4,800.00		
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置			M3	12,915.00		12,915.00		
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm ² , t=5cm			M2	1,435.00		1,435.00		
6	安全觀測系統			式	1.00		1.00		
7	祛水, 點井, 深度 < 6m			支	48.00		48.00		
8	擋土設施, 鋼板樁 L=9M			M	235.60		235.00		
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15*20 L=13M			支	295.00		295.00		
三	建築結構體工程								
1	普通模板, (建築, 建築物)			M2	31,257.00		23,263.0		
2	清水模板, (建築, 建築物)			M2	6,717.00		4,350.0		
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料			T	1,411.00	5.00	1,167.00		
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級			個	4,729.00		3,923.00		
6	結構用混凝土, 140kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實			M3	295.00		295.00		
7	結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實			M3	8,451.00		6,071.00		
10	混凝土表面處理, 地坪整體粉光處理			M2	10,528.00		7,200.00		
四	鋼構工程								
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24			支	224.00		148.00		

建築物施工日誌

表報編號： 229

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/1/31

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0 天			
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	229 日曆天	剩餘工期	381 天		
預定進度(%)	19.774%	實際進度(%)	25.069%	本日實際進度(%)	0.033%	展延工期	10 天		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
9	剪力釘 $\phi 22\text{mm}$ L=125mm			支	504.00		204.00		
六	門窗工程								
17	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220			樘	6.00		0.90		
19	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220			樘	16.00		2.40		
21	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220			樘	14.00		2.10		
23	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220			樘	8.00		2.40		
24	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220			樘	12.00		1.80		
八	地坪裝修工程								
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)			M2	658.00		430.00		
九	牆面裝修工程								
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)			M2	12,374.00	10.00	1,670.00		
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)			M2	1,533.00		450		
十一	防水工程								
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含凹填保護(含夜基外牆)，(WP1)			M2	1,390.00		1,390		
2	塗液類防潮，筏基水池防水防水(五面施工)及地下室外牆內牆防水，(WP2)			M2	2,875.00		2,875		
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)			M2	2,740.00		2,740		
貳	機電工程								
一	電氣工程			式					
3	照明插座動力工程			式					
k	接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$			只	5.00		5		
1	裸銅線 100 mm^2			米	78.00		78		
二	弱電工程			式					
1	電信工程			式					
z	接地工程接地電阻值小於10歐姆(內設接地端子)及接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$ 及裸銅線 60 mm^2 等工程完成所需材料			式	1.00		1		
11	避雷接地工程			式					
d	接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$			只	7.00		7		
e	裸銅線 100 mm^2			米	23.00		23		
三	給排水設備工程			式					
2	排水工程			式					
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mm Φ (4") \times 6.6mm			米	141.00		141		
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通管 配管另件另料			式	1.00		1		
一	職業安全衛生，可量化部分			式	1.00		0.40		
二	職業安全衛生，不可量化部分			式	1.00		0.40		
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)			式	1.00		0.60		
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)			式	1.00		0.40		
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)			式	1.00		0.40		
二	品質管理，材料設備檢試驗費			式	1.00		0.60		
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申				1.00	0.033%	25.069%		

建築物施工日誌

表報編號： 229

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/1/31

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0		天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16	累計工期	229	日曆天	剩餘工期	381	天
預定進度(%)	19.774%	實際進度(%)	25.069%	本日實際進度(%)	0.033%	展延工期	10		天

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
	請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~					
陸	臨時設施,工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00		100.000%	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00		100.000%	
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	0.033%	25.069%	
營造業專業工程特定施工項目						

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋,SD420W,連工帶料	T	1,411.0	5.00	1,167.0	
鋼筋,鋼筋續接器,D25mm(#8),連工帶料,柱	組	4,729.0		3,386.0	
建築用混凝土,140kgf/cm2,含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土,280kgf/cm2,含澆置及搗實	M3	8,451.0		6,071.0	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組工		603	施工架工		243	挖(鏟)土機		69
鐵工		17	泥作工	3	387	混凝土運輸車		635
水電工		334	油漆工		14	混凝土泵輸車		19
續接工		13	技術工		271	移動式全吊車		27
鋼筋工	9	1264	門窗工		11	吊卡車		9
模板工		2146				拖車		1
混凝土工		172				搬運車		34

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

有 無 (此項如勾選"有",則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：有 無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：有 無 無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：有 無


(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(註4)：三樓頂版預留筋綁紮、模板版面放樣、1F泥作貼邊條、B1F水箱蓋植筋鑽孔

簽章：【工地主任】(註5)：



主
任
地



註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
 2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。
 3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
 4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
 5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

雲林縣環境保護局

物價指數(總指數)調整工程款明細表

工程名稱：	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		契約編號	114-041		增減均調整
	開標(議價)日	開標(議價)當月物價指數：(A)		預付款E%：(註1)	0%	
估驗日期 (估驗基準日)	估驗日期 (估驗基準日)	估驗金額(D)	估驗金額(E)	估驗日當月物價指數(B)	調整方式：	備註：應扣除金額E 之明細說明
			應扣除金額(E) (註2)	估驗日當月物價指數(B)	H*(C之絕對值-調整門檻)*1.05	
			估驗金額(D)	估驗日當月物價指數(B)	調整方式：	
			當期直接工程費	估驗日當月物價指數(B)	0%	
			應扣除金額(E) (註2)	估驗日當月物價指數(B)	指數增減率 C=(B/A-1)*100%	
1	114.06.30	9,301,917	1,256,708	111.97	-0.5242%	0
2	114.07.31	33,335,922	5,389,717	111.83	-0.6485%	0
3	114.08.31	14,357,822	2,590,182	112.15	-0.3643%	0
4	114.09.30	17,995,460	2,823,540	112.09	-0.4176%	0
5	114.10.31	20,596,460	2,793,297	112.43	-0.1155%	0
6	114.11.30	20,089,494	2,779,231	112.66	0.0888%	0
7	114.12.31	18,783,936	2,423,230	112.82	0.2310%	0
8	115.01.31	17,514,884	2,320,909	113.81	1.1105%	0
合計		151,975,895	22,376,813			0

註：
 1. 係指已付預付款之最高額估價約總價之百分比。
 2. 係指契約規定應扣除項目：(例如：規劃費、設計費、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……)、營業稅、保險費、利潤、訓練費、檢(試)驗費……等)之當期估驗總金額。
 3. 指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償；指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。
 4. 工程款物價指數調整處理原則、計算方式(範例)、函釋等，參見工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整。
 5. 契約訂有辦理物價指數調整者，未表應併入款(法)算、估驗等計價明細表內。
 6. 物價指數調整款依契約第5條契約價金之給付條件第(6)款本契約依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過2.5%之部分。



承包商商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1


115.01.02-工區粉刷用砂進場取樣



相片說明

2


115.01.02-國際會議廳2樓頂版鋼筋進場取樣



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

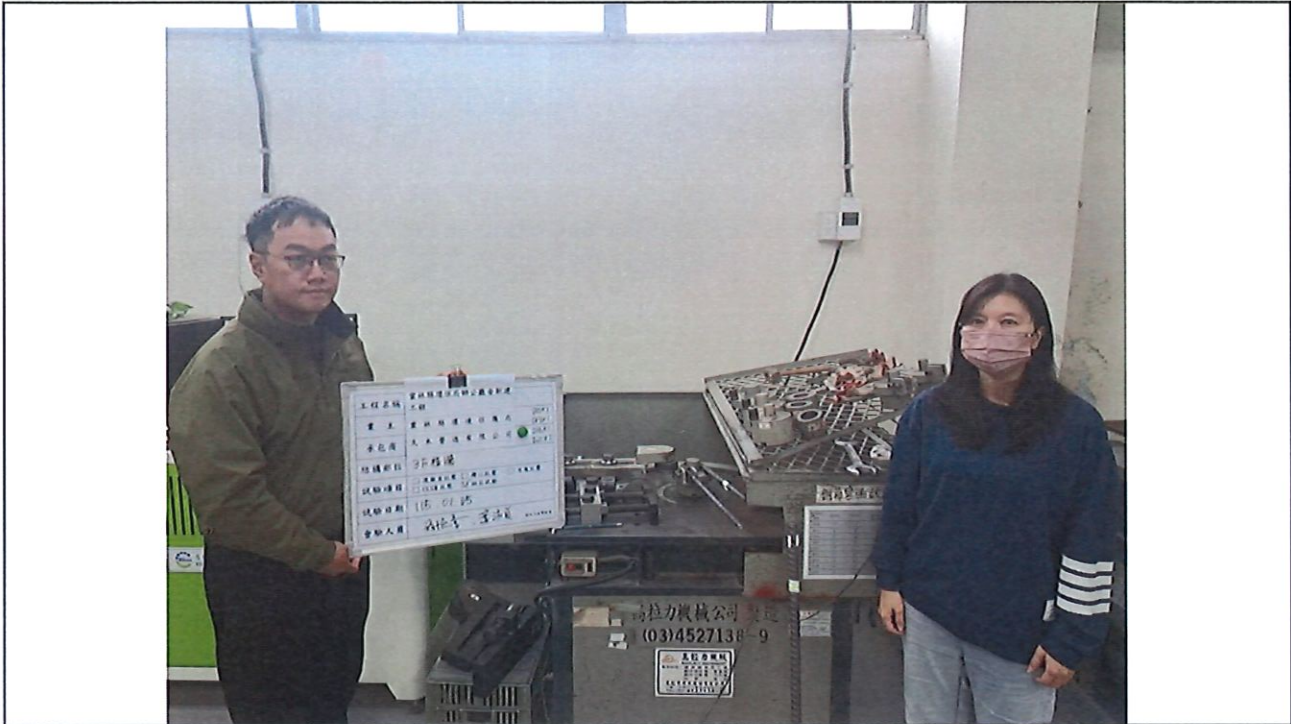

相片說明

115.01.05-辦公室3F柱牆鋼筋試驗


3



相片說明

115.01.06-筏基水池防水施工查驗(第1道)

4



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

5


115.01.06-筏基水池防水施工查驗(第2道)



相片說明

6

115.01.07-3F模板材料進場抽驗



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
 承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

7

115.01.09-混凝土鑽心取樣14天(2F)



相片說明

8

115.01.13-鑽心試體抗壓試驗14天(2F頂版-瑁育)



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

9


115.01.16-國際會議廳2F頂版鋼筋綁紮完成



相片說明

10

.115.01.16-國際會議廳2F頂版灌漿前樓版清洗



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

11


115.01.17-國際會議廳2F頂版整體粉光施作



相片說明

12

115.01.17-國際會議廳2F頂版混凝土試體取樣



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

13


115.01.18-國際會議廳2F頂版混凝土澆置完成



相片說明

14


115.01.18-國際會議廳2F頂版澆置後灑水養護



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

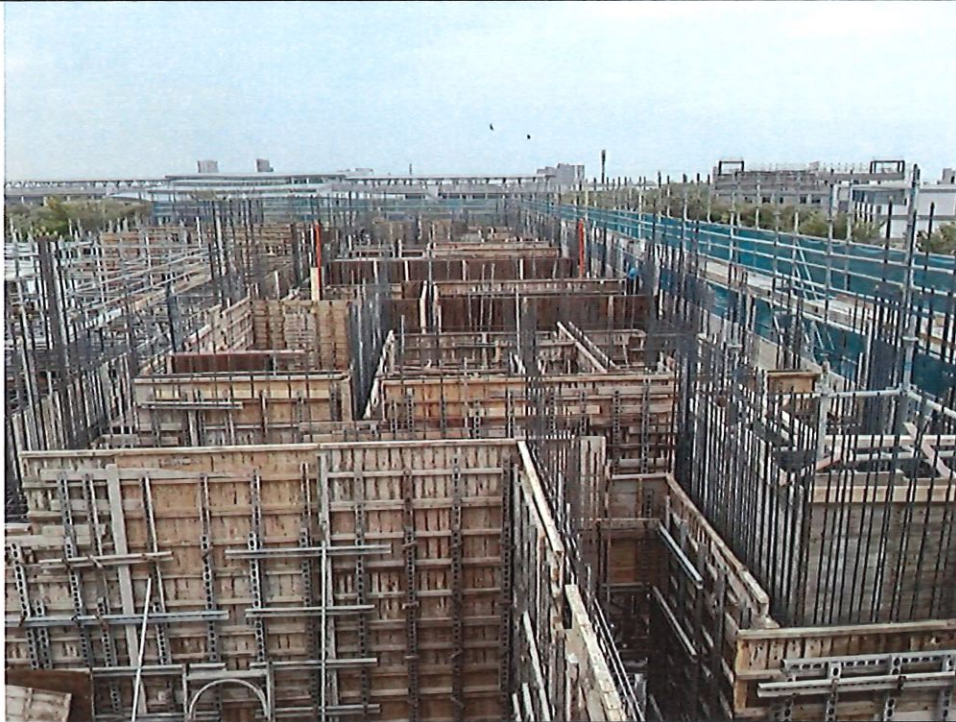

相片說明

115.01.18-辦公室3F牆封模


15



相片說明

115.01.21-辦公室3F頂版鋼筋試驗

16



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

17


115.01.21-筏基水池防水施工查驗(第3道)



相片說明

18

115.01.23-辦公室3F頂版清水模組立完成



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

19


115.01.23-混凝土鑽心取樣28天(2F)



相片說明

20


115.01.26-辦公室2F頂版抗壓試驗30天(瑁育)



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

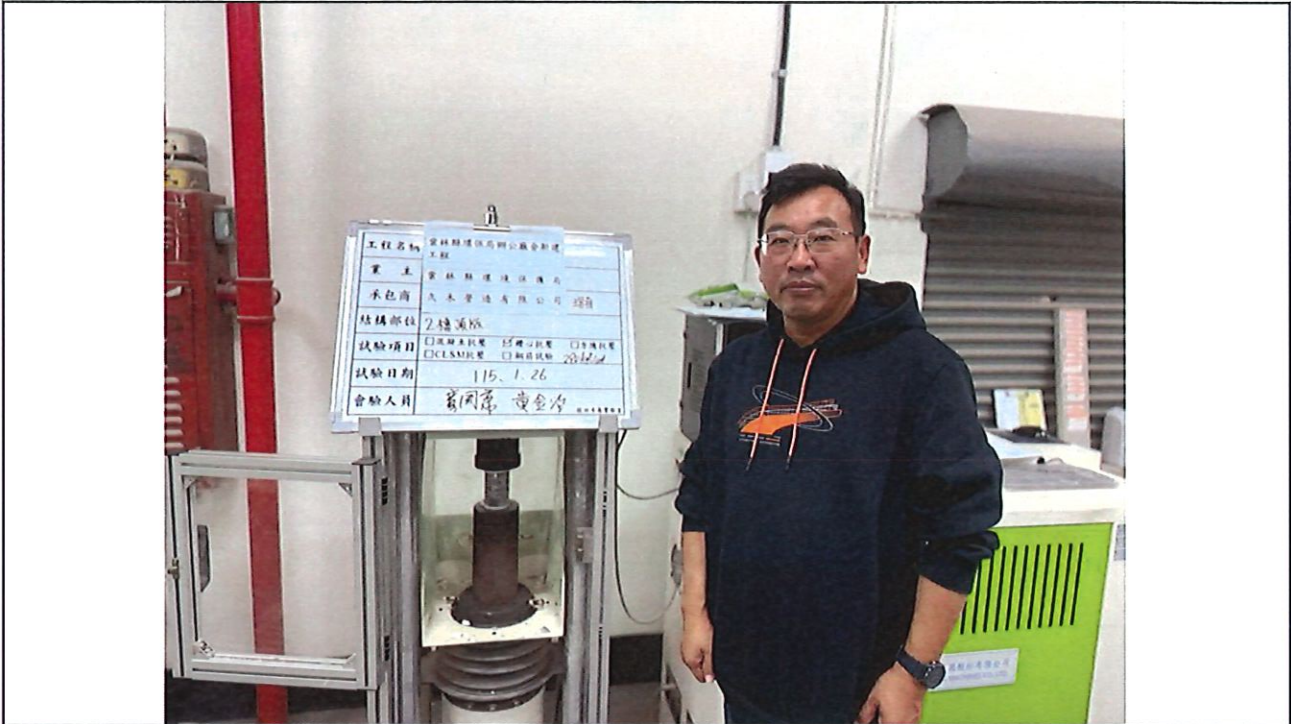

相片說明

21


115.01.26-鑽心試體抗壓試驗28天(2F頂版-瑋育)



相片說明

22

115.01.30-辦公室4F柱續接器試驗



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

23


115.01.31-辦公室3F頂版鋼筋綁紮完成

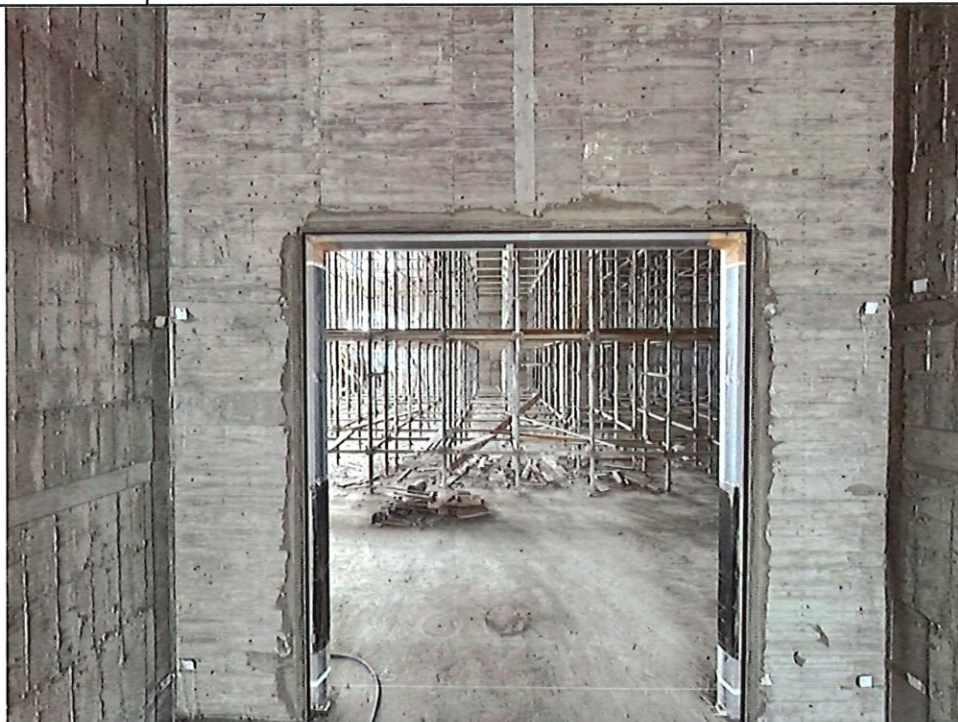

相片說明

24

115.01.31-1F防火門框安裝完成



雲林縣環境保護局

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商：久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

25

115.01.31-地下室牆面粉光



相片說明

26

115.01.31-外牆3F施工架搭設

