

檔 號：  
保存年限：

## 雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號  
承辦人：馬弘任  
電話：05-5526323  
傳真：05-5370420  
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國115年5月12日  
發文字號：雲環行字第1150005652號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第九次估驗，既經監造單位同意，同意核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所115年4月22日碩環字第1150422001號函。
- 二、第九次估驗資料1式3份，由久木營造有限公司、貴事務所及本局各執1份據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所  
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

已電子交換

裝

訂

線



雲林縣環境保護局  
雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第九次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：115.03.01~115.03.31








雲林縣環境保護局  
工程採購估驗申請書(第九次估驗)

填表日期：115年03月31日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	9,527,427	已估驗金額	161,503,322
本次估驗金額	20,033,057	累計估驗金額	181,536,379
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月16日
本次估驗基準日	115年03月31日	前次估驗基準日	115年02月28日
本次估驗基準日之預定進度	24.214%	前次估驗基準日之預定進度	22.005%
本次估驗基準日之實際進度	30.017%	前次估驗基準日之實際進度	26.628%

檢附：估驗計價文件(1式3份)：





































































































































- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。(無者免)
- 9. 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
 	 柯乃文	<input checked="" type="checkbox"/> 符合契約約定。  <input type="checkbox"/> 未符契約約定。	 



雲林縣環境保護局  
估驗請款計價單

第1頁共1頁 單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		估驗次別	9	完成百分率	本次	備註
工程編號	開工日期	114年06月17日	原契約金額	607,000,000	已工作日數	累計	3.29
契約編號	履約期限	610日曆天	最近一次契約變更後之契約金額		累計撥付未扣回預付款		29.90
廠商名稱	估驗期間	115年03月31日	累計撥付預付款				288
估驗詳細表							
	估驗指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)		備註
本次	36,769		1,001,652		19,031,405		
截至前次累計	161,503,322	16,000	5,385,947		156,101,375		
截至本次累計	181,499,610	16,000	6,387,599		175,132,780		
本次「扣款」(B1)欄位內容說明：							
本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「違約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：							
監造單位		承辦人		科長		秘書	
 		 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>		 <b>黃富義</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王厚然</b>		 <b>115.5.7</b>	
				 <b>王</b>			



# 雲林縣環境保護局 估驗請款計價單

第9次付款  
第1頁共1頁

工程名稱 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		預算施工金額		本期核發金額	19,031,405
工程編號	114-041	實際開工日期	114年06月17日	本期核發金額	19,031,405
契約編號	雲林縣虎尾鎮	規定完工期限	610日曆天	本期應扣金額	0
工程地點	久木營造有限公司	估驗日期	115年03月31日	本期實發金額	156,101,375
施工單位		變更設計 增減金額	應 增 應 減 結果淨增、減	以前核發金額	175,132,780
		總計核發金額		總計核發金額	175,132,780


  

估驗項目	原契約或追加減後總價	完成百分率		估驗計價		保留金額		核發金額		備註
		本次	累計	本次	累計	本次	累計	本次	累計	
施工費(115年03月31日)	607,000,000	3.29	29.90	19,996,288	181,499,610	999,814	6,385,761	18,996,474	175,113,849	
物價指數調整款(115年03月)				36,769	36,769	1,838	1,838	34,931	34,931	
合計					181,536,379	1,001,652	6,387,599	19,031,405	175,148,780	


  

項 目	金額	專任工程人員：
本單所計價款及完成百分率已核對無訛，請此致謝！		柯乃文
施工廠商：久木營造有限公司		
負責人：賴雪燕		
中華民國 年 月 日(發票送達日期)		
承辦人	科長	秘書
監造單位	局長	副局長


  



科長 王厚然



科長 黃富義



局長 張喬維



雲林縣環境保護局

計價保留金額計算 (第10期, 截至115年03月31日止)

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼 構、木構、門窗、金屬、裝 修、防水、雜項、設備、景觀 工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工 程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	17,440,642.00		
甲.貳	機電工程	17,440,642.00		
	小計	100.00%		
	第09期			
甲.叁	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	74,500.00		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	132,500.00		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	1,395,251.36		
甲.陸	臨時設施, 工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%	952,144.67		
甲.捌	營業稅 5%	19,996,288.03		
	小計	999,814	19,996,288	
	合計			999,814
	保留金額小計			
	(B)保留金額合計			

物調保留金額計算

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計	36,769.00		
	合計		36,769	
	物調保留金額小計	1,838		
	(D)保留金額合計		1,838	


核發金額核算

	本期估驗計價	19,996,288
	-估驗計價保留款	999,814
	本期物調指數	36,769
	-物調指數保留款	1,838
	總價(總計)	19,031,405
	(E)核發金額合計	19,031,405

註：以上保留金額計算方式(第1成員：久木-5%)、(第2成員：祥旺-5%)、(第3成員：正益-5%)

承包廠商：

監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價總表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	發包工程費										
壹	建築工程										
一	假設及拆除工程		1	20,206,750	20,206,750	1	9,599,190.00	1	731,000.00	1	10,330,190.00
二	基礎工程		1	22,152,085	22,152,085	1	21,684,115.34	1	47,000.00	1	21,731,115.34
三	建築結構體工程		1	122,725,370	122,725,370	1	99,508,270.00	1	9,801,770.00	1	109,310,040.00
四	鋼構工程		1	28,800,734	28,800,734						
五	木構工程		1	25,366,336	25,366,336						
六	門窗工程		1	51,756,778	51,756,778	1	476,256.00	1	105,072.00	1	581,328.00
七	金屬工程		1	44,582,805	44,582,805						
八	地坪裝修工程		1	18,757,610	18,757,610	1	174,800.00			1	174,800.00
九	牆面裝修工程		1	23,725,575	23,725,575	1	2,186,150.00	1	2,166,600.00	1	4,352,750.00
十	坪頂裝修工程		1	20,177,200	20,177,200			1	4,589,200.00	1	4,589,200.00
十一	防水工程		1	9,913,150	9,913,150	1	4,168,300.00			1	4,168,300.00
十二	雜項工程		1	12,147,925	12,147,925						
十三	設備工程		1	3,817,880	3,817,880						
十四	景觀工程		1	12,526,947	12,526,947						
	建築工程合計(甲.壹)			416,657,145	416,657,145		137,797,081.34		17,440,642.00		155,237,723.34
貳	機電工程										
一	電氣工程		1	33,970,706	33,970,706						
二	弱電工程		1	24,731,200	24,731,200						
三	給排水設備工程		1	12,340,000	12,340,000						
四	消防工程		1	7,196,210	7,196,210						
五	空調工程		1	31,644,846	31,644,846						
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集		1	874,000	874,000						
	機電工程合計(甲.貳)			110,756,962	110,756,962						
	直接工程費用			527,414,107	527,414,107		137,797,081.34		17,440,642.00		155,237,723.34

承包廠商：



監造單位：






# 雲林縣環境保護局 估驗計價總表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 2 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)										
一	職業安全衛生，可量化部分		1	234,187	234,187	1	105,384.15			1	105,384.15
二	職業安全衛生，不可量化部分		1	990,000	990,000	1	445,500.00	1	49,500.00	1	495,000.00
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)		1	2,178,677	2,178,677	1	1,307,206.20			1	1,307,206.20
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)		1	500,000	500,000	1	225,000.00	1	25,000.00	1	250,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)										
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1	2,650,000	2,650,000	1	1,192,500.00	1	132,500.00	1	1,325,000.00
二	品質管理，材料設備檢驗費		1	514,485	514,485	1	308,691.00			1	308,691.00
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)		1	42,193,129	42,193,129	1	11,023,766.51	1	1,395,251.36	1	12,419,017.87
	合計(甲.壹~甲.伍)			576,674,585	576,674,585		152,405,129.20		19,042,893.36		171,448,022.56
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)		1	50,000	50,000	1	36,250.00	1	1,250.00	1	37,500.00
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1	1,441,686	1,441,686	1	1,441,686.00			1	1,441,686.00
捌	營業稅，(甲.壹~甲.伍合計5%)		1	28,833,729	28,833,729	1	7,620,256.46	1	952,144.67	1	8,572,401.13
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)			607,000,000	607,000,000		161,503,321.66		19,996,288.03		181,499,609.69
	總價(總計)			607,000,000	607,000,000		161,503,322		19,996,288		181,499,610



承攬廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局

## 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額					
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價				
甲	發包工程費																
壹	建築工程																
一	假設及拆除工程																
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有行人道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	350,000	0.50	175,000.00					0.50	175,000.00				
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	465,000	150.00	232,500.00					150.00	232,500.00				
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬	M	525.00	6,000	3,150,000	472.00	2,832,000.00					472.00	2,832,000.00				
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	97,000	1.70	82,450.00					1.70	82,450.00				
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	28,500	0.80	22,800.00					0.80	22,800.00				
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆	座	1.00	77,500	77,500	0.90	69,750.00					0.90	69,750.00				
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池	式	1.00	120,000	120,000	0.73	87,000.00			0.025	3,000.00	0.750	90,000.00				
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	36,000	0.50	18,000.00					0.50	18,000.00				
9	竣工文件, 竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	50,000												
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 二層建築), 長16.5m, (跨度, 3k, 5.4~5.64m), 含水電空調等	棟	1.00	230,000	230,000	1.00	230,000.00					1.00	230,000.00				230,000.00

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	66,890	1.00	66,890.00			1.00	66,890.00		66,890.00	
12	工地臨時建築設施，臨時廁所	組	1.00	37,800	37,800	1.00	37,800.00			1.00	37,800.00		37,800.00	
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設	式	1.00	150,000	150,000	1.00	150,000.00			1.00	150,000.00		150,000.00	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	760,000	9.00	342,000.00			1.00	38,000.00		380,000.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	5,982,990	5,200.00	3,588,000.00			1,000.00	690,000.00		4,278,000.00	
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	1,681,680	750.00	330,000.00			750.00	330,000.00		330,000.00	
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	1,296,680									
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	2,591,910	3,500.00	1,085,000.00			3,500.00	1,085,000.00		1,085,000.00	
19	工地清理，交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	1,000,000									
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	500,000	0.50	250,000.00			0.50	250,000.00		250,000.00	
21	工地清理，管建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	1,052,800									
22	資料送審(含竣工圖、竣工資料製作、建築勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標章作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用)	式	1.00	350,000	350,000									
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	132,000									

承包廠商：



監造單位：






# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
	小計				20,206,750			9,599,190.00			731,000.00			10,330,190.00
二	基礎工程													
1	施工測量, 工地放樣	M2	19,980.00	50	999,000	11,670.00	583,500.00	940.00	47,000.00	12,610.00	630,500.00			
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存	M3	17,789.895	300	5,336,969	17,789.90	5,336,968.50			17,789.895	5,336,968.50			
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度	M3	4,874.895	300	1,462,469	4,700.00	1,410,000.00			4,700.00	1,410,000.00			
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置	M3	12,915.00	247	3,190,005	12,915.00	3,190,005.00			12,915.00	3,190,005.00			
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm2, t=5cm	M2	1,435.00	1,390	1,994,650	1,435.00	1,994,650.00			1,435.00	1,994,650.00			
6	安全觀測系統	式	1.00	140,200	140,200	1.00	140,200.00			1.00	140,200.00			
7	祛水, 點井, 深度<6m	支	48.00	40,000	1,920,000	48.00	1,920,000.00			48.00	1,920,000.00			
8	擋土設施, 鋼板樁L=9M	M	235.60	11,874.15	2,797,550	235.60	2,797,549.74			235.60	2,797,549.74			
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15, L=13M	支	295.00	14,614.38	4,311,242	295.00	4,311,242.10			295.00	4,311,242.10			
	小計				22,152,085			21,684,115.34			47,000.00			21,731,115.34
三	建築結構體工程													
1	普通模板, (建築, 建築物)	M2	31,257.00	1,110	34,695,270	24,777.00	27,502,470.00	2,707.00	3,004,770.00	27,484.00	30,507,240.00			
2	清水模板, (建築, 建築物)	M2	6,717.00	1,200	8,060,400	4,350.00	5,220,000.00	750.00	900,000.00	5,100.00	6,120,000.00			
3	鉚接鋼線網, 點焊鋼絲網 7x7x150x150mm	M2	57.00	500	28,500									
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.00	33,000	46,563,000	1,216.00	40,128,000.00	109.00	3,597,000.00	1,325.00	43,725,000.00			
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級	個	4,729.00	250	1,182,250	4,413.00	1,103,250.00	316.00	79,000.00	4,729.00	1,182,250.00			
6	結構用凝土, 140kgf/cm2, 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	885,000	295.00	885,000.00			295.00	885,000.00			
7	結構用凝土, 280kgf/cm2, 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	29,578,500	6,699.50	23,448,250.00	596.00	2,086,000.00	7,295.50	25,534,250.00			
8	水泥凝土鋪面, t=40cm, 輕質凝土	M3	55.00	2,500	137,500									



監造單位：


承包廠商：



# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 4 頁共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1:3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	15,750						
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	1,579,200	8,142.00	1,221,300.00	900.00	135,000.00	9,042.00	1,356,300.00
	小計				122,725,370		99,508,270.00		9,801,770.00		109,310,040.00
四	鋼構工程										
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	4,182,000						
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	164,000						
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	738,000						
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	16,287,000						
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	712,000						
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	57,200						
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	145,600						
8	高拉力螺栓 M22 S10T	支	1,294.00	85	109,990						
9	剪力釘 $\phi$ 22mm L=125mm	支	504.00	36	18,144						
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	43,200						
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	61,500						
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	234,000						
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	5,606,380						
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	41,820						
15	建築鋼結構，鋼構梯(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	400,000						



承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局


## 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 6 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
	W140*H240													
8	鋁窗，推射+橫拉式，電動排煙，WD04-F，W140*H240	樞	15.00	28,560	428,400									
9	鋁窗，鋁百葉，WD11，W140*H240	樞	3.00	25,200	75,600									
10	鋁窗，防火檢修門，60A，WD12，W50*H80	樞	5.00	7,200	36,000									
11	鋁窗，推射式，鋁百葉，WD13，W130*H240	樞	6.00	24,960	149,760									
12	防水閘門，不銹鋼，D03	樞	1.00	504,000	504,000									
13	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D01，W90*H220	樞	9.00	15,260	137,340									
14	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D04，W120*H220	樞	2.00	19,160	38,320									
15	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門，D05，W80*H220	樞	6.00	12,320	73,920									
16	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門，D06，W100*H220	樞	15.00	15,400	231,000									
17	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220	樞	6.00	39,600	237,600	0.90	35,640.00	35,640.00				0.90	35,640.00	
18	鋁門扇及門樞，橫拉門，熱固性樹脂板門，D07，W100*H220	樞	7.00	14,960	104,720									
19	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220	樞	16.00	47,520	760,320	1.80	85,536.00	85,536.00	0.60	28,512.00	28,512.00	2.40	114,048.00	
20	鋁門扇及門樞，橫拉門，紙蕊蜂巢美耐板門，D09，W100*H220	樞	1.00	20,000	20,000									
21	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220	樞	14.00	39,600	554,400	1.50	59,400.00	59,400.00	0.60	23,760.00	23,760.00	2.10	83,160.00	



監造單位：



承包廠商：




# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 7 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
22	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D11，W100*H320	樘	6.00	19,200	115,200									
23	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220	樘	8.00	79,200	633,600	2.40	190,080.00			2.40	190,080.00			
24	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220	樘	12.00	88,000	1,056,000	1.20	105,600.00	0.60	52,800.00	1.80	158,400.00			
25	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D15，W140*H320	樘	2.00	29,120	58,240									
26	鐵捲門，(A種防火門，1小時防火時效)，SD01，W600*H370	樘	1.00	375,000	375,000									
27	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD1，W120*H220	樘	19.00	17,160	326,040									
28	鋼門扇及門樘，推射式，防火玻璃門，60A，GD01F，W120*H220	樘	3.00	52,800	158,400									
29	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD02，W180*H220	樘	1.00	29,700	29,700									
30	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD03，W150*H220	樘	2.00	24,750	49,500									
31	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD04，W150*H240	樘	1.00	27,000	27,000									
32	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD05，W200*H240	樘	1.00	36,000	36,000									
33	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD07，W130*H220	樘	11.00	21,450	235,950									
34	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD08，W100*H220	樘	21.00	14,300	300,300									



監造單位：



承包廠商：



# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 8 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
35	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD09，W120*H240	樘	3.00	18,720	56,160						
36	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD10，W240*H240	樘	1.00	43,200	43,200						
37	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD11，W220*H240	樘	1.00	39,600	39,600						
38	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD12，W155*H210	樘	1.00	16,300	16,300						
39	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD13，W125*H210	樘	1.00	13,150	13,150						
40	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD14，W160*H210	樘	1.00	16,800	16,800						
41	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD15，W180*H210	樘	1.00	18,900	18,900						
42	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD16，W245*H210	樘	1.00	25,750	25,750						
43	鋁窗，鋁框，強化玻璃隔間	M2	728.50	4,000	2,914,000						
44	鋁窗，鋁框，防火玻璃隔間	M2	35.00	9,240	323,400						
45	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆鋁框架暨強化玻璃帷幕	M2	1,200.00	18,900	22,680,000						
46	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆造型鋁框架暨強化玻璃帷幕	M2	530.00	23,800	12,614,000						
	小計				51,756,778			476,256.00		105,072.00	581,328.00
七	金屬工程										
1	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	M2	4,550.00	2,000	9,100,000						
2	金屬製品，水平花架金屬包板與被襯骨架	M2	495.00	8,600	4,257,000						

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
21	建築鋼結構，鋼構戶外梯面板及收邊	式	1.00	50,000	50,000									
22	建築鋼結構，豎木收邊(國際會議廳屋頂)	M	66.00	6,900	455,400									
	小計				44,582,805									
八	地坪裝修工程													
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	918,000									
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	6,000,200									
3	鋪地磚，鑿面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	2,544,360									
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	302,680	380.00	174,800.00				380.00	174,800.00		
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	346,725									
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	203,550									
7	地毯，建工帶料，含底塗料、防水黏膠及工資,1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	676,480									
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	169,850									
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	2,005,740									
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	3,228,500									
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	2,361,525									
	小計				18,757,610		174,800.00						174,800.00	
九	牆面裝修工程													
1	水性水泥漆，1底2面，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	14,230,100	1,496.00	1,720,400.00	1,884.00	2,166,600.00		3,380.00	3,887,000.00		
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	2,594,025									
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	1,762,950	405.00	465,750.00				405.00	465,750.00		

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
4	外牆紋理碎石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2.150	1,784,500									
5	外牆紋理碎石塗料，水泥砂漿打底，一底二度，(W8)	M2	1,560.00	2.150	3,354,000									
	小計				23,725,575			2,186,150.00					2,166,600	4,352,750.00
十	坪頂裝修工程													
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	6,380,350									
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	6,721,000							4,172.00	4,589,200.00	4,589,200.00
3	暗架矽酸鈣板天花，合面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	2,409,750									
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	4,665,600									
	小計				20,177,200								4,589,200	4,589,200.00
十一	防水工程													
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，舍回填保護(筏基外牆)，(WP1)	M2	1,390.00	920	1,278,800							1,390.00	1,278,800.00	1,278,800.00
2	塗液類防潮，筏基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	600	1,725,000							2,875.00	1,725,000.00	1,725,000.00
3	塗液類防潮，電梯機坑防水(五面施工)，(WP3)	M2	57.00	600	34,200									
4	塗液類防潮，地下室外牆地坪及牆面防水，H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	1,609,500									
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)	M2	2,740.00	425	1,164,500							2,740.00	1,164,500.00	1,164,500.00
6	塗液類防潮，外牆縫層接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	280	260,400									

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表


估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	583,550									
8	塗液類防潮，屋頂平台及牆面防水，H=30cm，(WP8)	M2	1,989.00	1,500	2,983,500									
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9)	M2	782.00	350	273,700									
	小計				9,913,150			4,168,300.00						4,168,300.00
十二	雜項工程													
1	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(B1F-6F,7停)，12人座	台	1.00	2,280,500	2,280,500									
2	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(B1F-6F,7停)，15人座	台	2.00	2,428,000	4,856,000									
3	捲簾，電動式，電梯遮煙用	組	21.00	52,000	1,092,000									
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	44,280									
5	金屬製品(袋基水池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	124,740									
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	90,000									
7	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	19.00	1,860	35,340									
8	浴廁強化美耐板隔間，隔間及門板	M2	193.00	4,215	813,495									
9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	272,500									
10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	42,380									
11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	115,240									

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
p	戶外單向洗牆壁燈，連工帶料	盞	9.00	4,000	36,000									
q	戶外雙向洗牆壁燈，連工帶料	盞	21.00	5,000	105,000									
r	閱讀壁燈，連工帶料	盞	6.00	820	4,920									
s	戶外插地式投射燈，連工帶料	盞	30.00	4,300	129,000									
t	上項燈具用防水型變壓器.20W，連工帶料	個	30.00	500	15,000									
u	戶外嵌入式壁燈，連工帶料	盞	13.00	4,300	55,900									
v	線性泛光嵌燈，連工帶料	盞	203.00	3,800	771,400									
w	泛光圓嵌燈，連工帶料	盞	122.00	600	73,200									
	小計				3,817,380									
十四	景觀工程													
1	鋪地磚，30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	3,850,425									
2	鋪地磚，30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	1,554,300									
3	滙青混凝土鋪面，(第1類型，密級配)，粗粒料37.5mm，黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	2,616,000									
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	143,982									
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	15,000									
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	132,000									
7	排水管溝，UA型，場鑄，含不銹鋼化妝蓋版	M	282.00	12,780	3,603,960									
8	排水管溝，UB型，暗溝，場鑄	M	32.00	6,290	201,280									
9	陰井，合蓋，GA型	組	20.00	8,000	160,000									
10	陰井，合蓋，GB型	組	15.00	10,000	150,000									
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	100,000									
	小計				12,526,947									
	建築工程合計(甲.壹)				416,657,145									
貳	機電工程													
	小計				137,797,081.34									
	建築工程合計(甲.壹)				17,440,642.00									
	機電工程												155,237,723.34	

承包廠商：



監造單位：







# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止),第 135 頁共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
	壓及平衡調整													
d	空調系統測試、調整及平衡，電力及中央監控系統測試及平衡調整	式	1.00	100.886	100.886									
	小計				398,202									
	空調工程合計(甲.貳.五)				31,644,846									
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	874,000									
	機電工程合計(甲.貳)				110,756,962									
	直接工程費用				527,414,107			137,797,081.34				17,440,642.00		155,237,723.34
參	職業安全衛生管理作業費及環境保證經費(合計約直接工程費用0.74%)													
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	234,187	234,187								0.45	105,384.15
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	990,000	990,000								0.50	495,000.00
三	環境保證，環境保證措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	2,178,677								0.60	1,307,206.20
四	環境保證，環境保證措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	500,000								0.50	250,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用)(合計約直接工程費用0.6%)													
一	品質管理，品質事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	2,650,000								0.45	1,192,500.00
二	品質管理，材料設備檢驗試驗費	式	1.00	514,485	514,485								0.60	308,691.00
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機													
			1.00	42,193,129	42,193,129								0.60	1,395,251.36
			1.00	514,485	514,485								0.60	308,691.00
			1.00	42,193,129	42,193,129								0.60	12,419,017.87



監造單位：




承包廠商：



# 雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止)第 136 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~壹.二合計之8%)										
	合計(甲.壹~甲.伍)		1.00	50,000	576,674,585		152,405,129.20		19,042,893.36		171,448,022.56
陸	臨時設施,工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	50,000	0.73	36,250.00	0.025	1,250.00	0.750	37,500.00
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	1,441,686	1.00	1,441,686.00			1.00	1,441,686.00
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	28,833,729		7,620,256.46		952,144.67		8,572,401.13
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				607,000,000		161,503,321.66		19,996,288.03		181,499,609.69
	總價(總計)				607,000,000		161,503,322		19,996,288		181,499,610



承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 1 頁 共 3 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
一	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	●請款比例：設備0.5+抽排水0.5式，截至2月底已請0.725式 ●本期請款數量0.5/20月=0.025式	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	●本期請款數量3月	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	●4F:674+233.6-415.21(2月已請)=492.39 M2 5F:674+233.6=907.6 M2 合計:492.39+907.6=1399.99 M2 ●截至2月底已請5200 M2 ●本期請款數量6200-5200=1000 M2	1,000.00	附件1
二	基礎工程					
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	●依樓地板面積5F:1208.43 M2 ●截至2月底已請11670 M2 ●本期請款數量12610-11670=940 M2	940.00	附件2
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	●4F:樑1092.83 M2 ●5F:(柱412.41+牆2817.04)/2(單面模)=1614.725 M2 合計:1092.83+1614.725=2707.555 M2 施工日誌完成數量:8163-24777=3386 M2 ●本期請款數量2707 M2	2,707.00	附件3
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	●4F頂版765.45 M2 ●截至2月底已請4350 M2 ●本期請款數量5100-4350=750 M2	750.00	附件3
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	●材料進出管制表:1150319累計進料(SF柱牆)1333.95 T ●截至2月底已請1216 T ●本期請款數量1325-1216=109 T	109.00	附件4

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 2 頁 共 3 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>●鋼筋料單:5F柱454 個</li> <li>●截至2月底已請4413 個</li> <li>●本期請款數量4729-4413=316 個</li> </ul>	316.00	附件5
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3/20:4F頂版286+294=580 M3</li> <li>3/7:水箱底4 M3 3/24:B1F人孔蓋12 M3</li> <li>合計:580+4+12=596 M3</li> <li>●截至2月底已請6699.5 M3</li> <li>●本期請款數量7295.5-6699.5=596 M3</li> </ul>	596.00	附件6
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>●5F:55.64*22.69-210.42-15.24-15.03-12.09-7.56-3.75=1010.06 M2</li> <li>●截至2月底已請8142 M2</li> <li>●本期請款數量9042-8142=900 M2</li> </ul>	900.00	
九	牆面裝修工程					
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>●請款比例:油漆30%+粉光25%+打底45%</li> <li>●B1F→油漆完成→2374.71 M3</li> <li>1F→油漆約完成50%→2079.18*0.5=1039.59 M2</li> <li>合計:2374.71+1039.59=3414.3 M2</li> <li>●截至2月底已請1496 M2</li> <li>●本期請款數量3380-1496=1884 M2</li> </ul>	1,884.00	附件7
十	坪頂裝修工程					
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>●B1F平頂/樑→油漆完成→1966.88+1886.19=3853.07 M2</li> <li>1F平頂/樑→油漆完成→158.81+160.38=319.19 M2</li> <li>合計:3853.07+319.19=4172.26 M2</li> <li>●本期請款數量4172 M2</li> <li>●本期施作完成金額49,500元</li> <li>●本期請款金額49,500元</li> <li>●本期尚未請款金額0 元</li> </ul>	4,172.00	
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00		0.05	

承包廠商：



監造單位：





# 雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 9 次，第 10 期估驗工程款(截至115年03月31日止) 第 3 頁 共 3 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本期施作完成金額25,000 元</li> <li>● 本期請款金額25,000 元</li> <li>● 本期尚未請款金額0 元</li> </ul>	0.05	
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本期施作完成金額132,500 元</li> <li>● 本期請款金額132,500 元</li> <li>● 本期尚未請款金額0 元</li> </ul>	0.05	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請款比例：設備0.5+剪輯0.5 式，截至2月底已請0.725 式</li> <li>● 本期請款數量0.5/20=0.025 式</li> </ul>	0.025	

承包廠商：



監造單位：






# 雲林縣環境保護局 115年3月份計算式

項次	項目及說明	單位	契約數量	已請數量	2F	合計	請款數量	備註
17	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，D06-F， W100*H220	樑	6	0.9	1	1		
17.1	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，D06-F-1， W110*H220	樑	0		1	1		
19	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，D08-F， W120*H220	樑	16	1.8	2	2	2*0.3=0.6	
21	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220	樑	14	1.5				
21.1	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，D10F-1， W110*H220	樑	0		2	2	2	2*0.3=0.6
23	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F， W180*H220	樑	8	2.4				
24	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F， W200*H220	樑	12	1.2	2	2		
24.1	鋼門扇及門樑，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F-1， W180*H220	樑	13				2	2*0.3=0.6

★防火門：本期請門框安裝完成30%

承包廠商：



監造單位：





## 工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架	計算式	A	B	=(A)*(B)
	單位	M	M	M2
1	B1F	177.7	6.8	1208.36
2	1F	226.5	4.6	1041.90
3	2F	233	4	932.00
4	3F	183.3	4	733.20
5	3F女兒牆	66.7	1.7	113.39
6	4F	168.5	4	674.00
7	4F挑空區	58.4	4	233.60
8	5F	168.5	4	674.00
9	5F挑空區	58.4	4	233.60
10	6F	137.6	5.1	701.76
11	6F女兒牆	119.2	1.7	202.64
12	6F挑空區	34.6	5.1	176.46





層數	原有建物	新建建物A棟 辦公棟	新建建物B棟 國際會議廳	
建築面積		2685.29		
地面層	B1F	2,699.44		
	1F	2,171.49	513.80	
	2F	1,114.34	218.23	
	3F	1,242.91		
	4F	1,211.90		
	5F	1,208.43		
	6F	528.12		
	合計	0.00	10,908.66	






工程編號：H241103  
 工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別:A 各施工樓層\*模板\*總結果(單位:M2)

樓層	柱	樑	版	牆	樓	梯	基礎	額	外	扣	接	頭	小	計
R				122.70									122.70	
6	224.54	696.98	398.27	2,249.83								-704.48	2,865.14	
5	412.41	1,229.31	753.11	2,817.04		44.42						-870.05	4,386.23	
4	412.41	1,092.83	765.45	2,558.32		44.42						-843.59	4,029.85	
3	420.65	1,147.14	953.44	2,378.36		44.42						-781.76	4,162.26	
2	540.54	1,670.66	1,155.60	2,890.32		44.42						-858.23	5,443.32	
1	648.16	1,181.63	732.92	3,643.76		48.54						-770.54	5,484.46	
B1	849.87	2,681.80	2,056.14	3,125.68		42.02	37.08		-98.31			-1,015.50	7,678.78	
F	421.89	4,492.84	864.19						-85.49			-1,892.89	3,800.54	
小計	3,930.48	14,193.18	7,679.11	19,786.02		268.26	37.08		-183.80			-7,511.68	37,973.30	





環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
7月11日	#4	102.84	102.84	
7月11日	#6	11	113.84	
7月11日	#8	12.82	126.66	
7月11日	#10	117.4	244.06	
7月15日	#4	10.14	254.2	
7月15日	#5	1.65	255.85	
7月15日	#8	20.99	276.84	
7月15日	#10	1.42	278.26	
7月18	#4	42.36	320.62	
7月18	#5	8.86	329.48	
7月18	#6	10.74	340.22	
7月18	#10	1.19	341.41	
8月18	#3	3.2	344.61	筏基版
8月18		61.89	406.5	筏基版
8月18	#5	0.6	407.1	筏基版
8月29	#3	10.26	417.36	地下室柱牆
8月29	#4	36.53	453.89	地下室柱牆
8月29	#5	20.66	474.55	地下室柱牆
8月29	#8	20.19	494.74	地下室柱牆
8月29	#10	1.6	496.34	地下室柱牆
9月29	#3	0.73	497.07	地下室頂版梁
9月29	#4	36.52	533.59	地下室頂版梁
9月29	#5	1.28	534.87	地下室頂版梁
9月29	#6	1.12	535.99	地下室頂版梁
9月29	#7	14.88	550.87	地下室頂版梁
9月29	#8	63.4	614.27	地下室頂版梁
10月1	#3	4.6	618.87	地下室頂版版
10月1	#4	59.75	678.62	地下室頂版版
10月13	#3	22.66	701.28	1樓柱牆
10月13	#4	21.81	723.09	1樓柱牆
10月13	#5	5.6	728.69	1樓柱牆
10月13	#8	17.24	745.93	1樓柱牆
10月13	#10	1.31	747.24	1樓柱牆
10月28	#3	1.43	748.67	國際會議廳
10月28	#4	8.59	757.26	國際會議廳
10月28	#8	6.65	763.91	國際會議廳



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
11月3日	#4	3.27	767.18	車道
11月3日	#5	4.71	771.89	車道
11月3日	#7	0.31	772.2	車道
11月3日	#8	0.8	773	車道
11月3日	#10	2.3	775.3	車道
011月13	#4	2.98	778.28	補料
11月15	#4	2.89	781.17	補料
11月17日	#3	2.66	783.83	1樓頂版
11月17日	#4	35.41	819.24	1樓頂版
11月17日	#5	1.37	820.61	1樓頂版
11月17日	#6	0.18	820.79	1樓頂版
11月17日	#7	6.37	827.16	1樓頂版
11月17日	#8	30.3	857.46	1樓頂版
11月17日	#10	0.65	858.11	1樓頂版
11月28日	#3	16.41	874.52	2樓柱牆
11月28日	#4	14.12	888.64	2樓柱牆
11月28日	#5	4.33	892.97	2樓柱牆
11月28日	#8	11.48	904.45	2樓柱牆
11月28日	#10	1.16	905.61	2樓柱牆
12月17日	#3	2.46	908.07	2樓頂版
12月17日	#4	48.3	956.37	2樓頂版
12月17日	#5	1.16	957.53	2樓頂版
12月17日	#6	0.13	957.66	2樓頂版
12月17日	#7	7.53	965.19	2樓頂版
12月17日	#8	33.17	998.36	2樓頂版
12月17日	#10	0.1	998.46	2樓頂版
12月29日	#3	15.31	1013.77	3樓柱牆
12月29日	#4	13.61	1027.38	3樓柱牆
12月29日	#5	5.16	1032.54	3樓柱牆
12月29日	#8	8.38	1040.92	3樓柱牆
1月2日	#3	2.05	1042.97	國際會議廳2f頂版
1月2日	#4	20.4	1063.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#7	4	1067.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#8	14.2	1081.57	國際會議廳2f頂版
1月16日	#3	1.97	1083.54	3樓頂版
1月16日	#4	47.37	1130.91	3樓頂版



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
1月16日	#5	1.1	1132.01	3樓頂版
1月16日	#6	0.12	1132.13	3樓頂版
1月16日	#7	4.83	1136.96	3樓頂版
1月16日	#8	30.66	1167.62	3樓頂版
1月16日	#10	4.57	1172.19	3樓頂版
2月4日	#3	14.51	1186.7	4樓柱牆
2月4日	#4	15.47	1202.17	4樓柱牆
2月4日	#5	6	1208.17	4樓柱牆
2月4日	#8	8.22	1216.39	4樓柱牆
3月6日	#3	3.82	1220.21	4樓頂版
3月6日	#4	40.27	1260.48	4樓頂版
3月6日	#5	1.2	1261.68	4樓頂版
3月6日	#6	0.12	1261.8	4樓頂版
3月6日	#7	7.68	1269.48	4樓頂版
3月6日	#8	22.19	1291.67	4樓頂版
3月19日	#3	16.23	1307.9	5樓柱牆
3月19日	#4	13.95	1321.85	5樓柱牆
3月19日	#5	6.19	1328.04	5樓柱牆
3月19日	#8	5.91	1333.95	5樓柱牆






# 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

## 辦公大樓5F柱牆料單

統計日期:2026.02.22 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
柱筋續接	#8	#8公	4.00	#8母	4.00	224	3.98	3566
柱筋續接	#8		3.80	#8母	3.80	1	3.98	15
柱筋續接	#8		3.00	#8母	3.00	1	3.98	12
柱筋續接	#8		2.80	#8母	2.80	114	3.98	1270
柱筋續接	#8		2.00	#8母	2.00	114	3.98	907
					合計	454		





# 盛記預拌混凝土有限公司

## 預拌混凝土送貨單

附件6

B151-3

客戶名稱：久木營造-環保局

契約編號：

出貨單號：SH15030311

工程名稱：


地址：雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話：05-5571542 傳真：05-5574439

澆置地點：虎尾環保局(高鐵前)


日期：115/03/20 出廠時間：12:23 到達時間： 卸完時間： 車次：33

車 號	KEF-3213 林銘鍵	總 重	33,750 kg	水泥型式	I型水泥
規 格	28日強度	280久木環保 $\text{kgf/cm}^2$	空 重	12,780 kg	爐石型式
	設計塌度	18 cm	淨 重	20,970 kg	飛灰型式
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.45 %	附加劑型式
	設計塌流度	cm	交貨數量	9.0 $\text{m}^3$	累計數量
備 註	1.在施工现场加水而影響品質，賣方概不負責。 2.材料計量許可差依CNS3090規定。 3.本配比得視早期強度及原料變異機動調整。			調 度 員	林春足
				工 地 簽 收	黃金治


<b>瑞育預拌混凝土股份有限公司</b>				斗六廠
工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司 施工地點：		預拌混凝土送貨單 日期：115/03/20		編 號：SH15030308 下料序號：
車 號	KEF-3680	強 度	280	$\text{Kg/cm}^2$
車 次	第 34 車	設計塌度	18	CM
數 量	2.0 $\text{M}^3$	最大骨材	19	MM
累計數量	294.0 $\text{M}^3$			
總 重	17,400 Kg			
空 重	12,640 Kg			
淨 重	4,760 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-四F頂板 0923-383-819陳主任			
出車時間	15:10	到達時間		卸料時間
調 度 員	DL張淑麗	工地簽收		
備 註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責	地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號	
		電 話	05-5576664	

第三聯：客戶存執



<p style="text-align: center;"><b>瑯育預拌混凝土股份有限公司 斗六廠</b></p> <p>           工地名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程            客戶名稱: F3A059 久木營造有限公司            施工地點: _____         </p> <p style="text-align: center;">日期: 115/03/07</p> <p style="text-align: right;">           編號: SH15030069            下料序號: _____         </p>				
車號	KLM-2236	強度	280	Kg/cm <sup>2</sup>
車次	第 1 車	設計坍度	18	CM
數量	4.0 M <sup>3</sup>	最大骨材	19	MM
累計數量	4.0 M <sup>3</sup>			
總重	21,920 Kg			
空重	12,400 Kg			
淨重	9,520 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-水箱底 0923-388-819陳主任			
出車時間	14:50	到達時間		卸料時間
調度員	DL張淑麗	工地簽收		
備註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號 05-5576664

第二聯：請款聯

<p style="text-align: center;"><b>瑯育預拌混凝土股份有限公司 斗六廠</b></p> <p>           工地名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程            客戶名稱: F3A059 久木營造有限公司            施工地點: _____         </p> <p style="text-align: center;">日期: 115/03/24</p> <p style="text-align: right;">           編號: SH15030367            下料序號: _____         </p>				
車號	KLP-8722	強度	280	Kg/cm <sup>2</sup>
車次	第 2 車	設計坍度	18	CM
數量	6.0 M <sup>3</sup>	最大骨材	19	MM
累計數量	12.0 M <sup>3</sup>			
總重	26,600 Kg			
空重	12,360 Kg			
淨重	14,240 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-地下室人孔蓋 0965-424-027			
出車時間	14:15	到達時間		卸料時間
調度員	DL張淑麗	工地簽收		
備註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號 05-5576664

第二聯：請款聯





## 工程預算項目總表

工程編號：H241103  
 工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工 料 名 稱	單位	F	B1	1	2	3	4	5	6	R	合 計
W1 牆面1:3水泥粉光+批土+水泥漆(一底二度)	M2		2,374.71	2,079.18	1,882.00	1,599.35	1,612.82	1,645.61	1,180.33		12,374.00
C2A 平頂清水模磨平批土+水泥漆(一底二度)	M2		1,966.88	158.81	313.62	305.60	214.69	54.63	80.14		3,094.38
C2B 梁底側1:3水泥粉光+批土水泥漆(一底二度)	M2		1,886.19	160.38	327.46	310.43	195.83	66.22	68.35		3,014.86





# 公共工程監造報表

表報編號：雲A01\_1150331

本日天氣：上午：晴☀ 下午：晴☀

填報日期：115年03月31日(星期二)

工程名稱								雲林縣環保局辦公廳舍新建工程							
契約工期		600天		開工日期		114年06月17日		預定完工日期		116年02月16日		實際完工日期		-	
契約變更次數			1次			工期展延天數			10.0天			契約金額		原契約： 607,000,000元	
預定進度(%)		24.2140%		實際進度(%)		30.0170%		變更後契約： 607,000,000元							
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):															
機電管線佈設_B1F_吊管施工 鋼筋綁紮_5F_牆 泥作施作_2F_牆 泥作施作_3F_牆															
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):															
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):															
四、督導工地職業安全衛生事項:															
(一)施工前檢查事項辦理情形: <input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成															
(二)其他工地安全衛生督導事項:															
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):															
召開3月份協議組織會 施工介面協調會 機關督導：雲K01_25 會議：雲H01_1150331_40 - 第040次工務會議 收文記錄： ●收_1150331_雲環行字第1151007952號_115年2月工作月報與施工日誌，同意核定 ●收_1150331_雲環行字第1151010561號_工地負責人「陳義隆」先生，因身體因素自115年3月24日起至115年4月6日止請假，期間職務由「江明城」先生代理，同意核定 ●1150331_發_久營環字第1150331001號_戶外排水系統高程平面圖															
監造單位簽章：															



*R. Galan*  
115.3.31

註：

1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。



# 建築物施工日誌

表報編號： 288

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/3/31

(星期二)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼		(114)(雲)營建字第00144號				不計工期		0	天	
開工日期		114年06月17日	核定竣工日期		116年2月16	累計工期		288	日曆天	
預定進度(%)		24.214%	實際進度(%)		30.017%	本日實際進度(%)		0.070%	展延工期	
								10	天	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：										
項次	施工項目					單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
甲	發包工程費									
一	假設及拆除工程									
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)					式	1.00		0.50	
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬					M	300.00		150.00	
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬					M	525.00		525.00	
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)					樁	2.00		2.00	
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)					樁	1.00		1.00	
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆					座	1.00		1.00	
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池					式	1.00		1.00	
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)					式	1.00		1.00	
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 二層建築), 長16.5m, (跨度, 3k, 5.4~5.64m), 含水電空調等					棟	1.00		1.00	
11	工地臨時建築設施, 辦公設備, 租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)					式	1.00		1.00	
12	工地臨時建築設施, 臨時廁所					組	1.00		1.00	
13	臨時設施, 工程用電設備、用水、資通訊設備, 含申請及設備架設					式	1.00		1.00	
14	臨時設施, 臨時水、電、電信通訊費					月	20.00		10.00	
15	施工輔助設施, 施工架及防護網, 鋼管, 裝拆(含租金), 扶手先行, 含上下設備及其他所需配件, pc鋪底, 圓盤系統施工架					M2	8,671.00		6,200.00	
16	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(結構挑高區室內架)					M2	3,822.00		950.00	
17	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(裝修挑高區室內架)					M2	2,947.00		200.00	
18	施工輔助設施, 支撐排架, 鋼管, 裝拆(含租金)					M3	8,361.00		3,500.00	
20	動土典禮及完工啟用典禮					式	1.00		0.50	
21	工地清理, 營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件					m2	10,528.00		2,600.00	
二	基礎工程									
1	施工測量, 工地放樣					M2	19,980.00		12,610.00	
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存					M3	17,789.90		17,789.90	
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度					M3	4,874.90		4,874.00	
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置					M3	12,915.00		12,915.00	
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm <sup>2</sup> , t=5cm					M2	1,435.00		1,435.00	
6	安全觀測系統					式	1.00		1.00	
7	祛水, 點井, 深度<6m					支	48.00		48.00	
8	擋土設施, 鋼板樁 L=9M					M	235.60		235.00	
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15*20 L=13M					支	295.00		295.00	
三	建築結構體工程									
1	普通模板, (建築, 建築物)					M2	31,257.00		28,163.00	
2	清水模板, (建築, 建築物)					M2	6,717.00		5,100.00	
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料					T	1,411.00	10.00	1,325.00	
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級					個	4,729.00		4,729.00	
6	結構用混凝土, 140kgf/cm <sup>2</sup> , 第1型水泥, 含澆置及搗實					M3	295.00		295.00	
7	結構用混凝土, 280kgf/cm <sup>2</sup> , 第1型水泥, 含澆置及搗實					M3	8,451.00		7,295.50	
10	混凝土表面處理, 地坪整體粉光處理					M2	10,528.00		9,042.00	
四	鋼構工程									
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24					支	224.00		196.00	

# 建築物施工日誌

表報編號： 288

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/3/31

(星期二)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號					不計工期	0		天
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16	累計工期	288	日曆天	剩餘工期	322	天
預定進度(%)	24.214%	實際進度(%)	30.017%	本日實際進度(%)	0.070%	展延工期	10		天
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
9	剪力釘 $\phi 22\text{mm}$ L=125mm				支	504.00		204.00	
六	門窗工程								
17	鋼門扇及門樘, 推射式, 防火門, 60A, D06-F, W100*H220				樘	6.00		0.90	
19	鋼門扇及門樘, 推射式, 防火門, 60A, D08-F, W120*H220				樘	16.00		2.40	
21	鋼門扇及門樘, 推射式, 防火門, 60A, D10F, W100*H220				樘	14.00		2.10	
23	鋼門扇及門樘, 推射式, 防火門, 60A, 雙開, D13-F, W180*H220				樘	8.00		2.40	
24	鋼門扇及門樘, 推射式, 防火門, 60A, 雙開, D14-F, W200*H220				樘	12.00		1.80	
八	地坪裝修工程								
4	混凝土表面處理, 水泥粉光處理, 混合金鋼砂(F4)				M2	658.00		492.00	
九	牆面裝修工程								
1	水性水泥漆, 1底2度, 水泥砂漿打底, 面層粉光(W1)				M2	12,374.00	20.00	3,380.00	
2	鋪貼壁磚, 含打底(W3)				M2	1,281.00		100.00	
3	水泥砂漿打底, 面層粉光(W5)				M2	1,533.00		500.00	
十	坪頂裝修工程								
2	水性水泥漆, 1底2度, 水泥砂漿打底, 面層批土磨平(C2)				M2	6,110.00	20.00	4,680.00	
十一	防水工程								
1	塗液類防潮, 地下室外牆防水, 含回填保護(含筏基外牆), (WP1)				M2	1,390.00		1,390.00	
2	塗液類防潮, 筏基水池防水防水(五面施工)及地下室外牆內牆防水, (WP2)				M2	2,875.00		2,875.00	
5	塗液類防潮, 基礎底板防水, (WP5)				M2	2,740.00		2,740.00	
6	塗液類防潮, 外牆樓層接縫防水, W=30cm, (WP6)				M	930.00		230.00	
貳	機電工程								
一	電氣工程								
3	照明插座動力工程								
k	接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$				只	5.00		5.00	
1	裸銅線 100 mm <sup>2</sup>				米	78.00		78.00	
二	弱電工程								
1	電信工程								
z	接地工程接地電阻值小於10歐姆(內設接地端子)及接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$ 及裸銅線 60 mm <sup>2</sup> 等工程完成所需材料				式	1.00		1.00	
11	避雷接地工程								
d	接地銅棒3m $\times \phi 19(3/4")\text{mm}$				只	7.00		7.00	
e	裸銅線 100 mm <sup>2</sup>				米	23.00		23.00	
三	給排水設備工程								
2	排水工程								
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mm $\phi(4")\times 6.6\text{mm}$				米	141.00		141.00	
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通管 配管另件另料				式	1.00		1.00	
一	職業安全衛生, 可量化部分				式	1.00		0.45	
二	職業安全衛生, 不可量化部分				式	1.00		0.50	
三	環境保護, 環境保護措施(可量化部分)				式	1.00		0.60	
四	環境保護, 環境保護措施(不可量化部分)				式	1.00		0.50	
一	品質管理, 品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)				式	1.00		0.50	
二	品質管理, 材料設備檢試驗費				式	1.00		0.60	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利					1.00	0.070%	30.017%	

# 建築物施工日誌

表報編號： 288

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/3/31

(星期二)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0	天		
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	288	日曆天	剩餘工期	322	天
預定進度(%)	24.214%	實際進度(%)	30.017%	本日實際進度(%)	0.070%	展延工期	10	天	

## 一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用), (壹. 一~壹. 二合計之8%)								
陸 臨時設施, 工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00				100.000%		
柒 營造綜合保險(甲. 壹~甲. 伍合計0.25%)		1.00				100.000%		
捌 營業稅, (甲. 壹~甲. 伍合計5%)		1.00			0.070%	30.017%		
營造業專業工程特定施工項目								

## 二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.0	10.00	1,325.0	
鋼筋, 鋼筋續接器, D25mm(#8), 連工帶料, 柱	組	4,729.0		4,729.0	
建築用混凝土, 140kgf/cm <sup>2</sup> , 含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土, 280kgf/cm <sup>2</sup> , 含澆置及搗實	M3	8,451.0		7,283.5	

## 三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組工	3	765	施工架工		313	挖(鏟)土機		69
鐵工		17	泥作工	13	790	混凝土運輸車		771
水電工	5	538	油漆工		86	混凝土泵輸車		23
續接工		18	技術工		311	移動式全吊車		29
鋼筋工	15	1460	門窗工		13	吊卡車		10
模板工		2669				拖車		3
混凝土工		218				搬運車		34

## 四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

有 無 (此項如勾選“有”, 則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)

## 五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：

### (一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：有 無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：有 無 無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：有 無

### (二)其他事項：


## 六、施工取樣試驗紀錄：

## 七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(註4)地下室吊管、5樓牆鋼筋綁紮、二樓泥作粉刷、三樓泥作粉刷、召開3月份協議組織會議、召開施工介面協調會議、召開第40次工務會議、環保局秘書至工地督導

簽章：【工地主任】(註5)：

任地  
陳義  
修



註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。

3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。



雲林縣環境保護局

物價指數(總指數)調整工程款明細表

工程名稱：	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		契約編號	114-041	
開標(議價)日	114年03月07日	開標(議價)當月物價指數：(A)	112.56	預付款E%：(註1)	0%
估驗期別	估驗日期 (估驗基準日)	當期直接工程費		調整日當月物價指數(B)	指數增減率 C=(B/A-1)*100%
		估驗金額(D)	應扣除金額(E) (註2)		
1	114.06.30	9,301,917	1,256,708	111.97	-0.5242%
2	114.07.31	33,335,922	5,389,717	111.83	-0.6485%
3	114.08.31	14,357,822	2,590,182	112.15	-0.3643%
4	114.09.30	17,995,460	2,823,540	112.09	-0.4176%
5	114.10.31	20,596,460	2,793,297	112.43	-0.1155%
6	114.11.30	20,089,494	2,779,231	112.66	0.0888%
7	114.12.31	18,783,936	2,423,230	112.82	0.2310%
8	115.01.31	17,514,884	2,320,909	113.81	1.1105%
9	115.02.28	9,527,427	1,329,427	114.69	1.8923%
10	115.03.31	19,996,288	2,555,646	115.60	2.7008%
合計		181,499,610	26,261,887	155,237,718	36,769

註：  
 1. 係指已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。  
 2. 係指契約規定應扣除項目：(例如：規劃費、設計費、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……)、營業稅、保險費、利潤、訓練費、檢(試)驗費……等)之當期估驗總金額。  
 3. 指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償；指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。  
 4. 工程款物價指數調整處理原則、計算方式(範例)、函釋等，參見工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整。  
 5. 契約訂有辦理物價指數調整者，本表應併入結(決)算、估驗等計價明細表內。  
 6. 物價指數調整款係指新訂標準物價之給付條件第(6)款本契約依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過2.5%之部分。

承包廠商：

監造單位：





營造工程物價指數 ( 總指數 ) 銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97	111.83	112.15	112.09	112.43	112.66	112.86	112.27
115	113.81	114.69	115.60										114.70

註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。





# 雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1


115. 03. 03-3F頂版混凝土抗壓試驗(辦公室)



相片說明

2

115. 03. 09-2F防火門框安裝完成






雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調

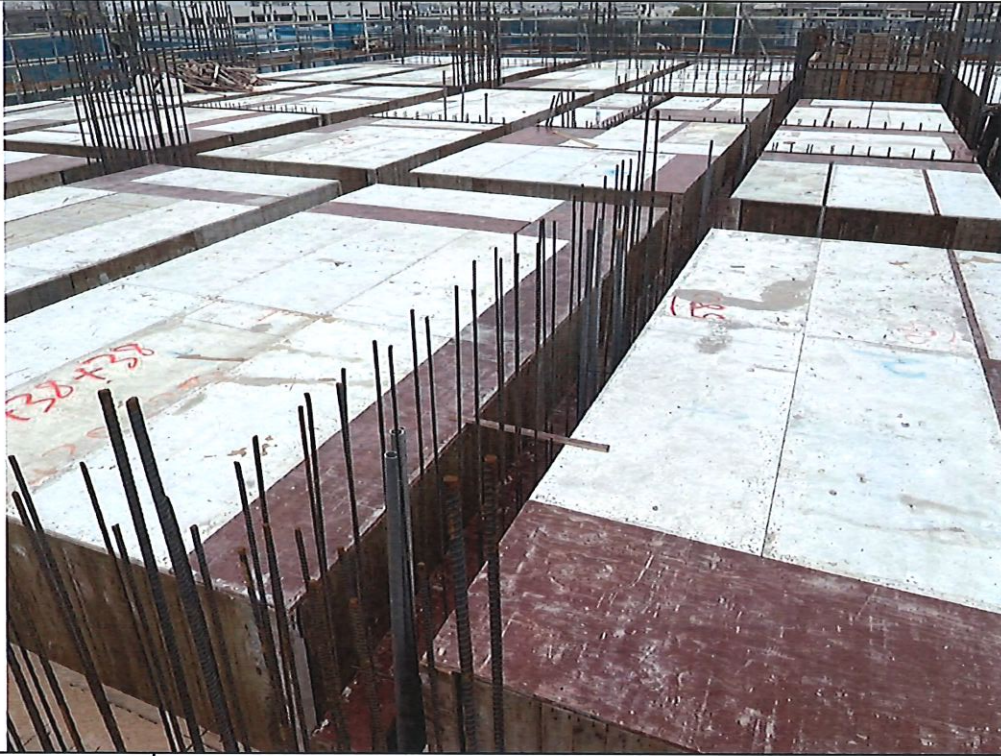

相片說明

3

115.03.10-4F頂版清水模組立完成(辦公室)



相片說明

4

115.03.10-B1F天花板.牆面水泥漆完成





# 雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

115.03.10-B1F水泥漆施工查驗

5

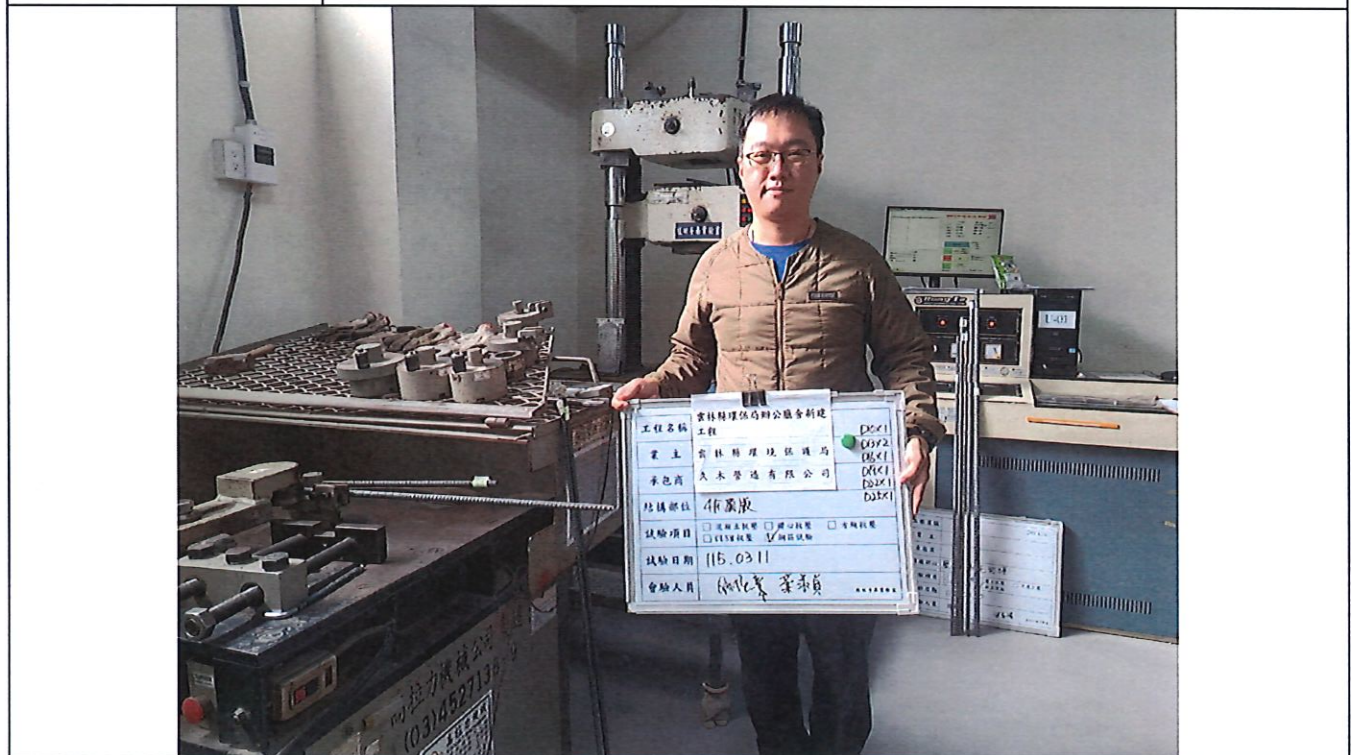

相片說明

115.03.11-4F頂版鋼筋試驗(辦公室)

6





雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

115.03.17-4F頂版樑鋼筋施工查驗(辦公室)


7



相片說明

115.03.18-4F頂版鋼筋施工查驗(辦公室)

8





雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

9

115.03.18-4F模板工程施工查驗(辦公室)



相片說明

10

115.03.19-5F柱牆鋼筋材料進場取樣(辦公室)





# 雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

11


115.03.20-4F頂版鋼筋綁紮完成(辦公室)



相片說明

12

115.03.20-4F頂版混凝土試體取樣(辦公室)





雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

13

115.03.20-4F頂版整體粉光施作(辦公室)



相片說明

14

115.03.20-4F頂版混凝土澆置完成(辦公室)





# 雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明	115.03.23-5F柱牆鋼筋試驗(辦公室)
15	



相片說明	115.03.23-5F柱續接器扭力值查驗
16	





雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

17

115.03.25-5F放樣施工查驗(辦公室)



相片說明

18

115.03.31-5F柱牆單面模組立.鋼筋綁紮完成(辦公室)





雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

19

115.03.31-1F天花板.牆面水泥漆



相片說明

20

115.03.31-外牆5F施工架搭設

