

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國114年12月29日
發文字號：雲環行字第1140019752號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第五次估驗，既經監造單位同意，同意核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所114年12月18日碩環字第1141218001號函。
- 二、第五次估驗資料1式3份，由久木營造有限公司、貴事務所及本局各執1份據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環境保護局
雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第五次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：114.11.01~114.11.30

共同投標估驗計價款各成員分配表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

估驗日期：114年11月30日

估驗次別：第五次

成員名稱	本期分配金額	累計分配金額	廠商確認核章
久木營造有限公司	19,470,809	112,190,761	 
祥旺機電工程有限公司	0	0	 
正益空調工程有限公司	0	0	 
合計	19,470,809	112,190,761	


雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

(契約編號：114-041)


工期計算統計表

項目 月別	日曆 天	免計日曆天		展延 日曆天	實際 日曆天	累計 日曆天	備註
		民俗 例假	其他 原因				
114年6月	14	0	0	0	14	14	1. 本工程 114.6.17 開工
114年7月	31	0	0	4	27	41	1. 114.07.07 丹納斯颱風申請展延工期 1 日 2. 114.07.08~114.07.10 申請展延工期 2.5 日 3. 114.07.28 申請展延工期 0.5 日
114年8月	31	0	0	4	27	68	1. 114.08.02~114.08.04 申請展延工期 3 日 2. 114.08.13 楊柳颱風申請展延工期 1 日
114年9月	30	0	0	1	29	97	1. 114.09.19、114.09.23 申請展延工期 1 日
114年10月	31	0	0	0	31	128	
114年11月	30	0	0	1	29	157	1. 114.11.12 鳳凰颱風申請展延工期 1 日
合計	167	0	0	10	157	157	

施工廠商



監造廠商



雲林縣環境保護局

工程採購估驗申請書(第五次估驗)

填表日期：114年11月30日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	20,596,460 ✓	已估驗金額	✓ 95,587,581
本次估驗金額	20,089,494	累計估驗金額	✓ 115,677,075
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月16日
本次估驗基準日	114年11月30日	前次估驗基準日	114年10月31日
本次估驗基準日之預定進度	✓ 13.074%	前次估驗基準日之預定進度	✓ 10.342%
本次估驗基準日之實際進度	✓ 19.072%	前次估驗基準日之實際進度	✓ 15.765%

檢附：估驗計價文件（1式3份）：

- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。（無者免）
- 9. 施工照片（以施工計價項目代表性照片為主）。

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
 	 	☒ 符合契約約定。 ☐ 未符契約約定。	 

雲林縣環境保護局

估驗請款計價單

200894914/601000000

第1頁共1頁

單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程			估驗次別	5	完成百分率	本次	備註
工程編號	開工日期	114年06月17日	原契約金額	607,000,000	19.06	已工作日數	167日曆天	
契約編號	履約期限	610日曆天	最近一次契約變更後之契約金額			累計撥付未扣回預付款	115,617,075	601000000
廠商名稱	估驗期間	114年11月30日	累計撥付預付款					
估驗詳細表								
	估價指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)	備註		
本次	估驗計價款(C)	20,089,494 ✓	602,685 ✓	19,470,809 ✓				
截至前次累計	95,587,581 ✓	2,867,629 ✓	92,719,952 ✓					
截至本次累計	115,677,075 ✓	3,470,314 ✓	112,190,761 ✓					
本次「扣款」(E1)欄位內容說明：								
114.10.28縣府施工查核缺失計2點，合計扣款16,000元								
本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「建約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：								
本期實付金額=19,486,809-16,000=19,470,809元								
承包廠商				承辦廠商專任工程師				
								
								
監造單位		承辦人	科長	秘書	副局長	局長		
								

卷之三

七

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

第5次付款
第1頁共1頁

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				預算施工金額	607,000.000	本期核發金額	19,486.809
工程編號					承包金額	607,000.000	本期應扣金額	16,000
契約編號	114-041				變更設計 增減金額	0	本期實發金額	19,470.809
工程地點	雲林縣虎尾鎮				應	0	以前核發金額	92,719.952
施工單位	久木營造有限公司				結果淨增、減	0	總計核發金額	112,190.761

估			驗		詳		細		表	
估驗項目	原契約或追加減後總價	完成百分率		估驗計價		保留金額		核發金額		備註
		本次	累計	本次	累計	本次	累計	本次	累計	
施工費(114年11月30日)	607,000.000	3.31	19.06	20,089.494	115.677.075	602.685	3,470.314	19,486.809	112,206.761	
物價指數調整款(116年11月)										
合計				20,089.494	115.677.075	602.685	3,470.314	19,486.809	112,206.761	

項 目	金額	本單所計價數及完成百分率已核對無訛，謹此發認。
施工廠商：久木營造有限公司		
負責人：賴雪燕		
中華民國	年 月 日(發票送達日期)	
合計		

監造單位	承辦人	科長	秘書	副局長	局長
------	-----	----	----	-----	----



專任工程人員：朱宗信

副本

檔 號：

保存年限：

行政院公共工程委員會 函

630

雲林縣斗南鎮長安路一段115號

受文者：久木營造有限公司

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)李青蔚

(聯絡電話)02-87897728

(傳真)02-87897741

(E-mail)wei@mail.pcc.gov.tw

發文日期：中華民國112年12月29日

發文字號：工程管字第1120301425號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：「第23屆公共工程金質獎」得獎名單已公布於本會全球資訊網，請依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定辦理，請查照並轉知所屬(轄)。

說明：

- 一、依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定辦理。
- 二、旨揭得獎廠商已公告於政府電子採購網「優良廠商名單」資料庫，對得獎廠商之獎勵如下：

(一)公共工程品質優良獎及公共設施維護管理獎：

- 1、機關依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第33條之5規定，辦理減收優良廠商押標金、履約保證金或保固保證金之作業；其減收額度為原定應繳總額之百分之五十。
- 2、機關辦理工程及技術服務採購，依優良廠商得獎紀錄納為最有利標、評分及格最低標之評選加分項目，其方式為評審項目單獨列項。特優者，加五分；優等者，加三分；佳作者，加二分。
- 3、機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留款額度，特優者，減低百分之三；優等者，減低百分之二；佳作者，減低百分之一。
- 4、特優及優等者，得由機關依政府採購法規定優先邀請比價。

(二)特別貢獻獎：機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留款額度，特別貢獻獎五屆者（為獲公共工程品質優良獎連續五屆），減低百分之零點五；特別貢獻獎十屆者，減低百分之一；特別貢獻獎十五屆者，減低百分之一點五。

- 三、本案得獎廠商之獎勵期間，「佳作」自113年1月1日起1年，「特優」及「優等」自113年1月1日起2年。
- 四、如上述廠商已參與投標，並繳納相關押標金或保證金後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。
- 五、「第23屆公共工程金質獎」得獎名單請逕至本會全球資訊網(<https://www.pcc.gov.tw/>)工程管裡>公共工程金質獎項下下載。


正本：總統府第三局、行政院秘書處、立法院秘書處、司法院秘書處、考試院秘書處、監察院秘書處、國家安全局、國家安全會議秘書處、審計部、行政院各部會行總處、直轄市政府、各縣市政府、各鄉鎮市區公所

副本：台灣世曦工程顧問股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、泰興工程顧問股份有限公司、榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、宏義工程股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、恆康工程顧問股份有限公司、翔益營造有限公司、旭盛營造有限公司、仲冠工程顧問有限公司、義力營造股份有限公司、黎明工程顧問股份有限公司、松東營造股份有限公司、林同棧工程顧問股份有限公司、開源營造股份有限公司、嘉盛工程顧問有限公司、協誠營造股份有限公司、和建工程顧問股份有限公司、逢國營造有限公司、總福營造有限公司、新綠主義股份有限公司、富石營造有限公司、長泰營造股份有限公司、宜大國際景觀科技股份有限公司、正岳營造股份有限公司、鼎侑工程顧問有限公司、甲曄營造有限公司、泰普營造有限公司、洋活有限公司、金永發營造有限公司、境觀設計有限公司、金煌營造有限公司、湧基營造工程有限公司、吳旗清建築師事務所、許正環建築師事務所、建皇營造工程有限公司、立成工程顧問有限公司、友宏營造股份有限公司、鼎晟工程顧問有限公司、來永營造有限公司、忠彥工程技術顧問股份有限公司、裕元營造股份有限公司、聯安工程顧問有限公司、皇林工程股份有限公司、坤鉅營造有限公司、永鉅技術顧問有限公司、瑞鋒營造股份有限公司、東山林工程有限公司、岡山營造有限公司、冠偉工程顧問有限公司、田茂營造事業有限公司、傑朋集成有限公司、中棧工程顧問股份有限公司、安倉營造股份有限公司、三源興股份有限公司、崇峻工程顧問有限公司、久旺營造股份有限公司、鴻成工程顧問有限公司、甲頂營造有限公司、大桂環境科技股份有限公司、黃苑景觀設計顧問有限公司、唐億營造股份有限公司、鴻威國際工程顧問股份有限公司、振勝營造有限公司、開巨技術顧問有限公司、郝東營造有限公司、源隆技術顧問有限公司、群輝營造工程有限公司、造齊工程顧問有限公司、昕豐營造有限公司、友上營造有限公司、豐華工程顧問股份有限公司、湧泉營造有限公司、亞際工程技術顧問有限公司、泰邦營造有限公司、立上營造有限公司、鋒環工程顧問企業股份有限公司、昇意營造有限公司、王騰建築師事務所、三星營造股份有限公司、永龍企業股份有限公司、宗邁建築師事務所、春原營造股份有限公司、喻台生建築師事務所、建國工程股份有限公司、九典聯合建築師事務所、華興聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司、豪志工程股份有限公司、王正源建築師事務所、石昭永建築師事務所、美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、帆宣系統科技股份有限公司、吳嘉棚建築師事務所、合隆發營造股份有限公司、吳坤曜建築師事務所、日富營造股份有限公司、九建工程股份有限公司、馮則維建築師事務所、央典建築師事務所、東久營造工程有限公司、晁豎企業有限公司、高聚工程有限公司、誠蓄工程顧問股份有

限公司、余曉嵐建築師事務所、劉漢卿建築師事務所、億展聯合建築師事務所、鼎信營造有限公司、力曜機電科技有限公司、趙文弘建築師事務所、新科營造股份有限公司、賴銘昌建築師事務所、許育嘉建築師事務所、大將作營造股份有限公司、程俊強建築師事務所、福泰營造股份有限公司、李浚熒建築師事務所、久木營造有限公司、欣聯合建築師事務所、三暘營造有限公司、台灣高野景觀規劃股份有限公司、陳尚鋒建築師事務所、佳恩營造實業有限公司、詹益寧建築師事務所、張巽堯建築師事務所、見安營造股份有限公司、謝明修建築師事務所、坤達營造工程有限公司、楊宗維建築師事務所、百豐營造股份有限公司、吉興工程顧問股份有限公司、高堃營造股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、川崎重工株式會社、中國鋼鐵股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、華電聯網股份有限公司、中興電工機械股份有限公司、揚盛工程顧問股份有限公司、聖大營造股份有限公司、弘業聯合電機技師事務所、瑋辰工程有限公司、恒基工程顧問股份有限公司、翊榕環境設計有限公司、全勝園藝事業有限公司、喜來登水電工程有限公司、家有興營造有限公司、惠民實業股份有限公司、禾銘環境工程顧問有限公司、青山工程顧問股份有限公司、杜風工程服務股份有限公司、仁德工程有限公司、仝葉工程顧問有限公司、中欣行股份有限公司、定洋實業股份有限公司、台灣整合防災工程技術顧問有限公司、牛埔生態文史工作室、財團法人中興工程顧問社、昇樑科技有限公司

主任委員

吳澤成



司、限公
限公
造齊
股份
良公
公司、
萬建
限公
公司、
商傑
明建
師公
東久
營有
股份

第23屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」得獎名單及等第

項次	類別	機關別	類別	工程名稱	主辦機關	洽辦單位	設計單位	監造單位	施工單位	分包單位	專業管理單位	等第	
												佳作	特優
52	建築	地方	2	臺中市南屯區精武路區三立體育場新建工程	臺中市停車管理處	-	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	新科營造股份有限公司	-	賴紹昌建築師事務所	V	
53	建築	中央	3	祝山車站改建工程	農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處	-	許育嘉建築師事務所	許育嘉建築師事務所	大傑作營造股份有限公司	-	-		V
54	建築	地方	3	臺北通象站(板橋站區)及通象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程	新北市政府新建工程處	交通部中央氣象署	程俊強建築師事務所	程俊強建築師事務所	福泰營造股份有限公司	-	-	V	
55	建築	地方	3	朱魯國小老舊校舍拆除重建工程	雲林縣二崙鄉朱魯國民小學	-	李茂榮建築師事務所	李茂榮建築師事務所	久木營造有限公司	-	-	V	
56	建築	地方	3	板枋漁港卸魚場改建工程	宜蘭縣政府	-	欣聯合建築師事務所	欣聯合建築師事務所	三時營造有限公司	-	-	V	
57	建築	地方	3	安農之心-張公園綠色旅遊驛站興建工程	宜蘭縣政府	-	台灣高野景觀規劃股份有限公司	陳尚旌建築師事務所	佳思營造實業有限公司	-	-	V	
58	建築	中央	4	縣定古蹟阿里山貴賓館整修工程	農業部林業及自然保育署嘉義分署	-	詹益寧建築師事務所	詹益寧建築師事務所	施工單位因有公共工程金質獎頒發作業要點第9點第2項第1款之事由，爰取消資格。	-	-		V
59	建築	地方	4	臺中市大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園舍新建工程	臺中市政府教育局	臺中市大雅區大雅國民小學	張其堯建築師事務所	張其堯建築師事務所	見安營造股份有限公司	-	-	V	
60	建築	地方	4	金門縣歷史建築-沙美張文帝洋樓修繕暨活化工程	金門縣文化局	文化局文化資產局	謝明修建築師事務所	程俊強建築師事務所	坤達營造工程有限公司	-	-	V	

雲林縣環境保護局

計畫保留金額計算(第6期,截至114年11月30日止)

項次	工作項目	成員編號1-(3%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼 構、木構、門窗、金屬、裝 修、防水、雜項、設備、景觀 工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工 程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	17,310,262.74		
甲.貳	機電工程			
	小計	17,310,262.74		
	第05期	100.00%		
甲.參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	304,077.05		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	132,500.00		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	1,384,821.02		
甲.陸	臨時設施,工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%	956,583.04		
甲.捌	營業稅 5%	20,089,493.85		
	小計	20,089,493.85	20,089,494	
	合計			
	保留金額小計	602,685		
	(B)保留金額合計		602,685	

物調保留金額計算

項次	工作項目	成員編號1-(3%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計			
	合計			
	物調保留金額小計			
	(D)保留金額合計			

核發金額核算

	本期估驗計價	20,089,494	
	-估驗計價保留款	602,685	
	本期物調指數		
	-物調指數保留款		
	總價(總計)	19,486,809	
	(E)核發金額合計	19,486,809	

註：1. 以上保留金額計算方式(第1成員：久木-3%)、(第2成員：祥旺-5%)、(第3成員：正益-5%)

2. 依契約第5條, (一):2. (8) ; (第1成員：久木)估驗保留款減低為3%。

承辦廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價總表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
甲	發包工程費													
壹	建築工程													
一	假設及拆除工程		1	20,206,750	√ 20,206,750	1	√ 5,729,390.00	1	743,920.00	1	6,473,310.00			
二	基礎工程		1	22,152,085	√ 22,152,085	1	√ 14,997,666.00	1	5,548,942.74	1	20,546,608.74			
三	建築結構體工程		1	122,725,370	√ 122,725,370	1	√ 57,563,780.00	1	11,017,400.00	1	68,581,180.00			
四	鋼構工程		1	28,800,734	√ 28,800,734									
五	木構工程		1	25,366,336	√ 25,366,336									
六	門窗工程		1	51,756,778	√ 51,756,778									
七	金屬工程		1	44,582,805	√ 44,582,805									
八	地坪裝修工程		1	18,757,610	√ 18,757,610	1	√ 174,800.00			1	174,800.00			
九	牆面裝修工程		1	23,725,575	√ 23,725,575									
十	坪頂裝修工程		1	20,177,200	√ 20,177,200									
十一	防水工程		1	9,913,150	√ 9,913,150	1	√ 2,268,500.00			1	2,268,500.00			
十二	雜項工程		1	12,147,925	√ 12,147,925									
十三	設備工程		1	3,817,880	√ 3,817,880									
十四	景觀工程		1	12,526,947	√ 12,526,947									
	建築工程合計(甲.壹)			416,657,145	√ 416,657,145		√ 80,734,136.00		√ 17,310,262.74		98,044,398.74			
貳	機電工程													
一	電氣工程		1	33,970,706	√ 33,970,706									
二	弱電工程		1	24,731,200	√ 24,731,200									
三	給排水設備工程		1	12,340,000	√ 12,340,000									
四	消防工程		1	7,196,210	√ 7,196,210									
五	空調工程		1	31,644,846	√ 31,644,846									
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集		1	874,000	√ 874,000									
	機電工程合計(甲.貳)			110,756,962	√ 110,756,962									
	直接工程費用			527,414,107	√ 527,414,107		√ 80,734,136.00		√ 17,310,262.74		98,044,398.74			

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價總表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 2 頁 共 2 頁

項次	項 目 及 說 明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單 價	總 價	數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)								990000/20月工期		240後估	驗數量	計算表	
一	職業安全衛生，可量化部分		1	234,187	✓ 234,187	1	✓ 58,546.75	1	✓ (11,709.35)	1	✓	1	70,256.10	
二	職業安全衛生，不可量化部分		1	990,000	✓ 990,000	1	✓ 247,500.00	1	✓ 49,500.00	1	✓	1	297,000.00	
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)		1	2,178,677	✓ 2,178,677	1	✓ 1,089,338.50	1	✓ (217,867.70)	1	✓	1	1,307,206.20	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)		1	500,000	✓ 500,000	1	✓ 125,000.00	1	✓ 25,000.00	1	✓	1	150,000.00	
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)								500000/20月工期					
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1	2,650,000	✓ 2,650,000	1	✓ 662,500.00	1	✓ 132,500.00	1	✓ 2265000/20月工期	1	795,000.00	
二	品質管理，材料設備檢試驗費		1	514,485	✓ 514,485	1	✓ 257,242.50	1	✓	1	✓	1	257,242.50	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)		1	42,193,129	✓ 42,193,129	1	✓ 6,458,730.88	1	✓ 1,384,821.02	1	✓	1	7,843,551.90	
	合計(甲.壹~甲.伍)			576,674,585	✓ 576,674,585		✓ 89,632,994.63		✓ 19,131,660.81		✓		108,764,655.44	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)		1	50,000	✓ 50,000	1	✓ 31,250.00	1	✓ 1,250.00	1	✓	1	32,500.00	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1	1,441,686	✓ 1,441,686	1	✓ 1,441,686.00		✓ 250000/20月工期		✓		1,441,686.00	
捌	營業稅，(甲.壹~甲.伍合計5%)		1	28,833,729	✓ 28,833,729	1	✓ 4,481,649.73	1	✓ 956,583.04	1	✓	1	5,438,232.77	
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)			607,000,000	✓ 607,000,000		✓ 95,587,580.36		✓ 20,089,493.85		✓		115,677,074.21	
	總價(總計)			607,000,000	✓ 607,000,000		✓ 95,587,581		✓ 20,089,494		✓		115,677,075	

承包廠商：

監造單位：





雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	發包工程費													
壹	建築工程													
一	假設及拆除工程													
1	工地拆除，拆除、清除與整平，含運棄(含既有行人道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	✓ 350,000	0.50	✓ 175,000.00				0.50	175,000.00		
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	✓ 465,000	150.00	✓ 232,500.00				150.00	232,500.00		
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬	M	525.00	6,000	✓ 3,150,000	472.00	✓ 2,832,000.00				472.00	2,832,000.00		
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	✓ 97,000	1.70	✓ 82,450.00				1.70	82,450.00		
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	✓ 28,500	0.80	✓ 22,800.00				0.80	22,800.00		
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆	座	1.00	77,500	✓ 77,500	0.90	✓ 69,750.00				0.90	69,750.00		
7	環境保護，工區臨時排水工程，含沉澱池	式	1.00	120,000	✓ 120,000	0.625	✓ 75,000.00	0.025		✓ 3,000.00	0.650	78,000.00		
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	✓ 36,000	0.50	✓ 18,000.00				0.50	18,000.00		
9	竣工文件，竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	✓ 50,000									
10	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等	棟	1.00	230,000	✓ 230,000	1.00	✓ 230,000.00				1.00	230,000.00		

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫃檯、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	✓ 66,890	1.00	✓ 66,890.00				1.00	66,890.00		
12	工地臨時建築設施，臨時廁所	組	1.00	37,800	✓ 37,800	1.00	✓ 37,800.00				1.00	37,800.00		
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設	式	1.00	150,000	✓ 150,000	1.00	✓ 150,000.00				1.00	150,000.00		
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	✓ 760,000	5.00	✓ 190,000.00	1.00	✓ 38,000.00		6.00	228,000.00		
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	✓ 5,982,990	1,880.00	✓ 1,297,200.00				668.00	✓ 460,920.00	2,548.00	1,758,120.00
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	✓ 1,681,680						550.00	✓ 242,000.00	550.00	242,000.00
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	✓ 1,296,680									
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	✓ 2,591,910									
19	工地清理，交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	✓ 1,000,000									
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.50	✓ 250,000.00				0.50	250,000.00		
21	工地清理，營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	✓ 1,052,800									
22	資料送審(含竣工圖、竣工資料製作、建管勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標章作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用)	式	1.00	350,000	✓ 350,000									
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	✓ 132,000									

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
二	基礎工程													
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	14/15 翠均	✓ 20,206,750.00		✓ 5,729,390.00			743,920.00		6,473,310.00		
2	槽造物開挖，機械挖，含近運暫存	M3	17,789.895	✓ 50	✓ 999,000.00	8,060.00	✓ 403,000.00	1,320.00		66,000.00	9,380.00	469,000.00		
3	槽造物回填，原材料回填，含運費，85% ≤ 壓實度	M3	4,874.895	300	✓ 5,336,969.00	17,789.895	✓ 5,336,968.50				17,789.895	5,336,968.50		
4	廢方處理，含揚塵抑制，含近運堆置	M3	12,915.00	247	✓ 3,190,005.00	12,915.00	✓ 3,190,005.00				12,915.00	3,190,005.00		
5	隧道噴凝土，175kgf/cm2，t=5cm	M2	1,435.00	1,390	✓ 1,994,650.00	1,435.00	✓ 1,994,650.00				1,435.00	1,994,650.00		
6	安全欄測系統	式	1.00	140,200	✓ 140,200.00	1.00	✓ 140,200.00				1.00	140,200.00		
7	抽水，點井，深度 < 6m	支	48.00	40,000	✓ 1,920,000.00	48.00	✓ 1,920,000.00				48.00	1,920,000.00		
8	擋土設施，鋼板樁 L=9M	M	235.60	11,874.15	✓ 2,797,550.00	20.00	✓ 237,483.00	215.60		2,560,066.74	235.60	2,797,549.74		
9	輔助加強樁，H型鋼租金	支	295.00	14,614.38	✓ 4,311,242.00	25.00	✓ 365,359.50	200.00		2,922,876.00	225.00	3,288,235.50		
	300*300*15，L=13M													
	小計				✓ 22,152,085.00		✓ 14,997,666.00			5,548,942.74		20,546,608.74		
三	建築結構工程													
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	1,110	✓ 34,695,270.00	12,113.00	✓ 13,445,430.00	3,000.00		3,330,000.00	15,113.00	16,775,430.00		
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	1,200	✓ 8,060,400.00	2,018.00	✓ 2,421,600.00	522.00		626,400.00	2,540.00	3,048,000.00		
3	鉚接鋼線網，貼焊鋼絲網 7x7x150x150mm	M2	57.00	500	✓ 28,500.00									
4	鋼筋，SD420W，建工帶料	T	1,411.00	33,000	✓ 46,563,000.00	738.00	✓ 24,354,000.00	107.00		3,531,000.00	845.00	27,885,000.00		
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	250	✓ 1,182,250.00	2,549.00	✓ 637,250.00	848.00		212,000.00	3,397.00	849,250.00		
6	結構用混凝土，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	✓ 885,000.00	295.00	✓ 885,000.00				295.00	885,000.00		
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	✓ 29,578,500.00	4,323.00	✓ 15,130,500.00	903.00		3,160,500.00	5,226.00	18,291,000.00		
8	水泥混凝土鋪面，t=40cm，輕質混凝土	M3	55.00	2,500	✓ 137,500.00									

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 4 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1：3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	✓ 15,750									
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	✓ 1,579,200	4,600.00	✓ 690,000.00	1,050.00	1,050.00	157,500.00	5,650.00	847,500.00		
	小計				✓ 122,725,370		✓ 57,563,780.00			11,017,400.00		68,581,180.00		
四	鋼構工程													
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	✓ 4,182,000									
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	✓ 164,000									
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	✓ 738,000									
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	✓ 16,287,000									
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	✓ 712,000									
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	✓ 57,200									
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	✓ 145,600									
8	高拉力螺栓 M22 S10T	支	1,294.00	85	✓ 109,990									
9	剪力釘 ϕ 22mm L=125mm	支	504.00	36	✓ 18,144									
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	✓ 43,200									
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	✓ 61,500									
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	✓ 234,000									
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	✓ 5,606,280									
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	✓ 41,820									
15	建築鋼結構，鋼構梯(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	✓ 400,000									

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
21	建築鋼結構，鋼樑戶外梯面板及收邊	式	1.00	50,000	✓ 50,000									
22	建築鋼結構，豎木收邊(國際會議廳屋頂)	M	66.00	6,900	✓ 455,400									
	小計				✓ 44,582,805									
八	地坪裝修工程													
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	✓ 918,000									
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	✓ 6,000,200									
3	鋪地磚，鑲面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	✓ 2,544,360									
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	✓ 302,680	380.00	✓ 174,800.00				380.00	174,800.00		
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	✓ 346,725									
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	✓ 203,550									
7	地毯，連工帶料，含底塗料、防水粘膠及工資，1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	✓ 676,480									
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	✓ 169,850									
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	✓ 2,005,740									
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	✓ 3,228,500									
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	✓ 2,361,525									
	小計				✓ 18,757,610		✓ 174,800.00					174,800.00		
九	牆面裝修工程													
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	✓ 14,230,100									
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	✓ 2,594,025									
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	✓ 1,762,950									

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
4	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2.150	✓1,784,500									
5	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度，(W8)	M2	1,560.00	2.150	✓3,354,000									
	小計				✓23,725,575									
十	坪頂裝修工程													
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	✓6,380,850									
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	✓6,721,000									
3	暗架砂酸鈣板天花，含面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	✓2,409,750									
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	✓4,665,600									
	小計				✓20,177,200									
十一	防水工程													
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含回填保護(筏基外牆)，(WP1)	M2	1,390.00	920	✓1,278,800	1,200.00	✓1,104,000.00				1,200.00	1,104,000.00		
2	塗液類防潮，筏基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	600	✓1,725,000									
3	塗液類防潮，電梯機坑防水(五面施工)，(WP3)	M2	57.00	600	✓34,200									
4	塗液類防潮，地下室外露地坪及牆面防水，H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	✓1,609,500									
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)	M2	2,740.00	425	✓1,164,500	2,740.00	✓1,164,500.00				2,740.00	1,164,500.00		
6	塗液類防潮，外牆縫隙接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	280	✓260,400									

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局

估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	✓583,550								
8	塗液類防潮，屋頂平台及牆面防水，H=30cm，(WP8)	M2	1,989.00	1,500	✓2,983,500								
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9)	M2	782.00	350	✓273,700								
	小計				✓9,913,150		✓2,268,500.00						2,268,500.00
十二	雜項工程												
1	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(B1F-6F,7停)，12人座	台	1.00	2,280,500	✓2,280,500								
2	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(B1F-6F,7停)，15人座	台	2.00	2,428,000	✓4,856,000								
3	捲簾，電動式，電梯遮煙用	組	21.00	52,000	✓1,092,000								
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	✓44,280								
5	金屬製品(筏基水池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	✓124,740								
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	✓90,000								
7	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	19.00	1,860	✓35,340								
8	浴廁強化美耐板隔間，隔間及門板	M2	193.00	4,215	✓813,495								
9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	✓272,500								
10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	✓42,380								
11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	✓115,240								

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價明細表


估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
p	戶外單向洗牆壁燈，連工帶料	盞	9.00	4,000	✓ 36,000									
q	戶外雙向洗牆壁燈，連工帶料	盞	21.00	5,000	✓ 105,000									
r	閱讀壁燈，連工帶料	盞	6.00	820	✓ 4,920									
s	戶外插地式投射燈，連工帶料	盞	30.00	4,300	✓ 129,000									
t	上項燈具用防水型變壓器，20W，連工帶料	個	30.00	500	✓ 15,000									
u	戶外嵌入式壁燈，連工帶料	盞	13.00	4,300	✓ 55,900									
v	線性泛光嵌燈，連工帶料	盞	203.00	3,800	✓ 771,400									
w	泛光圓嵌燈，連工帶料	盞	122.00	600	✓ 73,200									
	小計				✓ 3,817,880									
十四	景觀工程													
1	鋪地磚，30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	✓ 3,850,425									
2	鋪地磚，30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	✓ 1,554,300									
3	瀝青混凝土鋪面，(第1類型，密級配)，粗粒料37.5mm，黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	✓ 2,616,000									
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	✓ 143,982									
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	✓ 15,000									
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	✓ 132,000									
7	排水管溝，UA型，場鑄，含不銹鋼化妝蓋版	M	282.00	12,780	✓ 3,603,960									
8	排水管溝，UB型，暗溝，場鑄	M	32.00	6,290	✓ 201,280									
9	陰井，含蓋，GA型	組	20.00	8,000	✓ 160,000									
10	陰井，含蓋，GB型	組	15.00	10,000	✓ 150,000									
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	✓ 100,000									
	小計				✓ 12,526,947									
	建築工程合計(甲.營)				✓ 416,657,145					✓ 80,734,136.00		17,310,262.74		98,044,398.74
貳	機電工程													

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 135 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	壓及平衡調整													
d	空調系統測試、調整及平衡，電力及中央監控系統測試及平衡調整	式	1.00	100,886	✓ 100,886									
	小計				✓ 398,202									
	空調工程合計(甲、貳、五)				✓ 31,644,846									
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	✓ 874,000									
	機電工程合計(甲、貳)				✓ 110,756,962									
	直接工程費用				✓ 527,414,107			✓ 80,734,136.00				17,310,262.74		98,044,398.74
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)													
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	234,187	✓ 234,187			0.25	✓ 58,546.75	0.05	✓ 11,709.35	0.30	70,256.10	
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	990,000	✓ 990,000			0.25	✓ 247,500.00	0.05	49,500.00	0.30	297,000.00	
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	✓ 2,178,677			0.50	✓ 1,089,338.50	0.10	✓ 217,867.70	0.60	1,307,206.20	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	✓ 500,000			0.25	✓ 125,000.00	0.05	25,000.00	0.30	150,000.00	
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)													
一	品質管理，品質管理費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	✓ 2,650,000			0.25	✓ 662,500.00	0.05	✓ 132,500.00	0.30	795,000.00	
二	品質管理，材料設備檢驗試驗費	式	1.00	514,485	✓ 514,485			0.50	✓ 257,242.50			0.50	257,242.50	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機		1.00	42,193,129	✓ 42,193,129			✓ 6,458,730.88			1,384,821.02		7,843,551.90	

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 136 頁 共 136 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單 價	總 價	數量	總 價	數量	總 價	數量
	關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~壹.二合計之8%)				✓576,674.585					
	合計(甲.壹~甲.伍)				✓		89,632,994.63		19,131,660.81	
陸	臨時設施,工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	✓ 50,000	0.625	✓ 31,250.00	0.025	✓ 1,250.00	0.650
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	✓ 1,441,686	1.000	✓ 1,441,686.00			1.00
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	✓ 28,833,729		✓ 4,481,649.73		✓ 956,583.04	
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				607,000,000		✓ 95,587,580.36		20,089,493.85	
	總價(總計)				607,000,000		✓ 95,587,581		20,089,494	
										115,677,075

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗數量計算表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 1 頁 共 3 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
一	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	●請款比例：設備0.5-抽排水0.5 式，截至10月底已請0.625 式 ●本期請款數量0.5/20月≈0.025 式	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	本期請款數量1月(11月)	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	●B1~1F:1510.15+14.44+498.06+520.93+5.21=2548.79 M2 ●截至10月底已請1880 M2 ●本期請款數量2548-1880=668 M2	668.00	附件1
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	●1F(電梯井):40.15+468.27+77.78*2+196.35=860.33 M2 ●本期請款數量550 M2	550.00	
二	基礎工程					
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	●依據地板面積2F:1114.34+218.23=1332.57 M2 ●截至10月底已請8060 M2 ●本期請款數量9380-8060=1320 M2	1,320.00	附件2
8	擋土設施，鋼板樁L=9M	M	235.60	●依據雲環行字第11-000939號，第一次契約變更議價完成 ●截至9月底已請20 M ●本期請款數量235.6-20=215.6 M	215.60	附件3
9	輔助加強樁，H型鋼租金300*300*15，L=13M	支	295.00	●依據雲環行字第11-000939號，第一次契約變更議價完成 ●截至9月底已請25 支 ●本期請款數量295-25=270 支	200.00	附件3
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	●1F:5324.73-711.57=4613.16 M2 ●截至10月底已請12113 M2 ●本期請款數量15663-12113=3552 M2	3,000.00	附件4

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第 2 頁 共 3 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	●B1F頂版711.57 M2 ●截至10月底已請2018 M2 ●本期請款數量2540-2018=522 M2	522.00	附件4
4	鋼筋，SD420W，建工帶料	T	1,411.00	●鋼筋料單：1F頂版樑79.114+16.667+車道樑版11.315=107.096 T ●本期請款數量107 T	107.00	附件5
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	●鋼筋料單：2F柱644+228=872 個 ●截至9月底已請2549 個 ●本期請款數量3397-2549=848 個	848.00	附件6
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	●11/6車道地坪45 M3、11/8南側地樑17 M3、11/19會議室地坪198 M3 11/27—F頂版247+396=643 M3，合計：45+17+198+643=903 M3 ●本期請款數量903 M3	903.00	附件7
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	●2F：5.85*9.36+56.06*1.95+6.4*8.33+10.61*10.19+15.61*11.2=1060 M2 ●截至10月底已請460 M2 ●本期請款數量5650-4600=1050 M2	1,050.00	
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	●前期已施作完成金額99,978.6元 第12~21項59,940 元 第1.3~9.11項40,038.6 元 ●前期未請款金額41,431.85 元 ●本期施作完成金額21,705.6 元 第1.3~9.11項21,705.6 元 ●本期請款金額11,709.35元 ●本期尚未請款金額9,996.25 元	0.05	
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	●本期施作完成金額49,500元 ●本期請款金額49,500元 ●本期尚未請款金額0 元	0.05	

以契約這項金額/ 20月工期

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 5 次，第 6 期估驗工程款(截至114年11月30日止) 第3頁共3頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	●前期已施作完成金額1,106,667 元 第4.13~17項343,959 元 第1~3.5~6.11項44,442元 第8項571,596元 第10.12項146,670元 ●前期未請款金額17,328.5 元 ✓ ●本期施作完成金額200,539.2 元 第4.13~17項28,663.25 元 第1~3.5~6.11項22,221元 第8項149,654.95元 ●本期請款金額217,367.7 元 ●本期尚未請款金額0 元 17328.5+200539.2	0.10	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	●本期施作完成金額25,000 元 ●本期請款金額25,000 元 ●本期尚未請款金額0 元	0.05	
一	品質管理，品質管理費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	●本期施作完成金額132,500 元 ●本期請款金額132,500 元 ●本期尚未請款金額0 元	0.05	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	●請款比例:設備0.5+剪輯0.5 式 ●本期請款數量0.5/20=0.025 式	0.025	

承包廠商：







監造單位：



金益開發9月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程編號：JY1140021

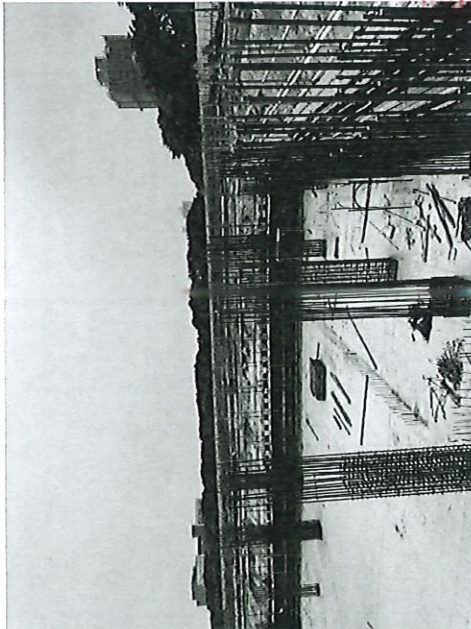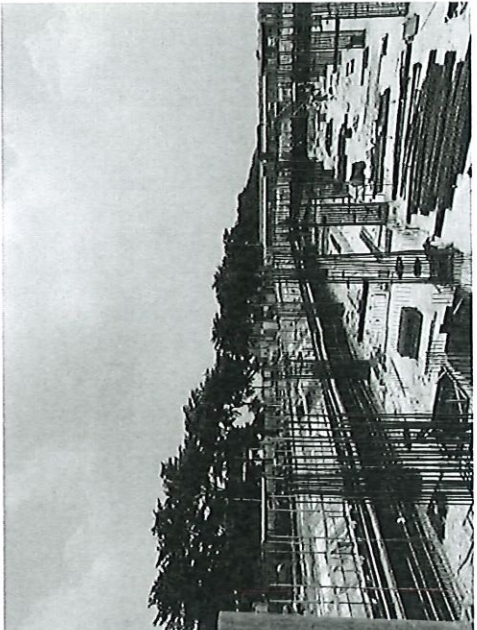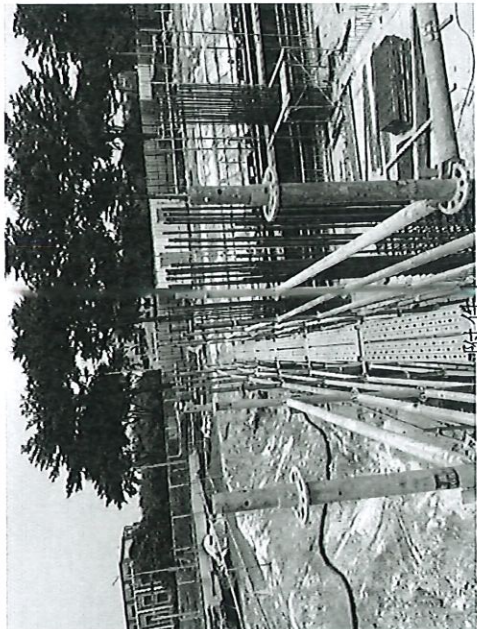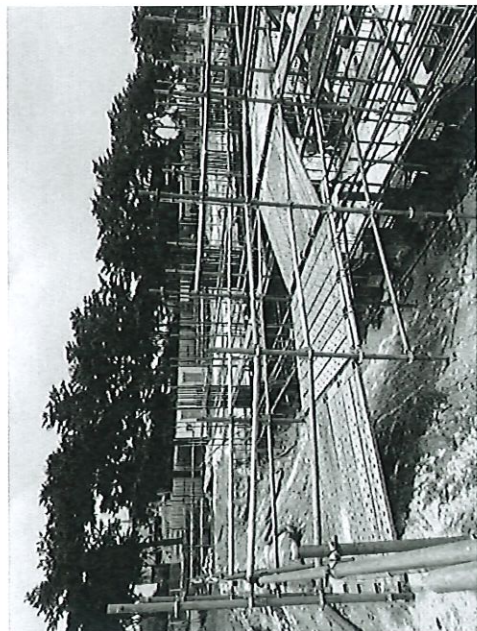

外架			
型式	長	高	小計
1829	4.877	1	4.88
1829	1.829	1.9	3.48
1829	1.829	3.325	6.08
722	7.316	5.225	38.23
722	221.341	6.65	1471.92
總計/M2		1829	14.44
		722	1510.15









棟 4
壁拉桿 35

金益開發 11411 月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程編號：JY1140021

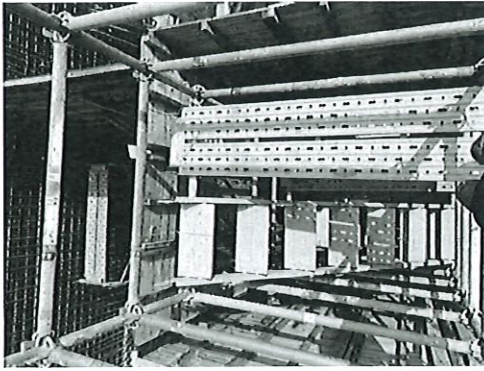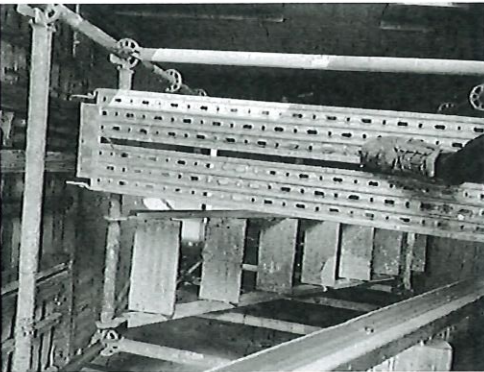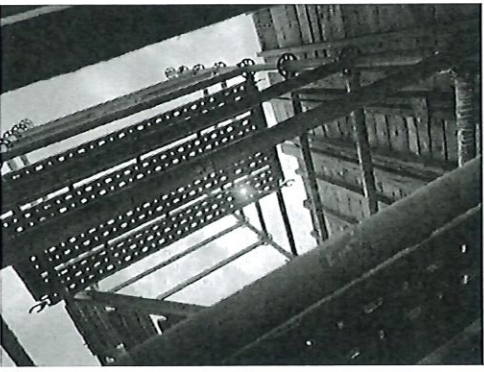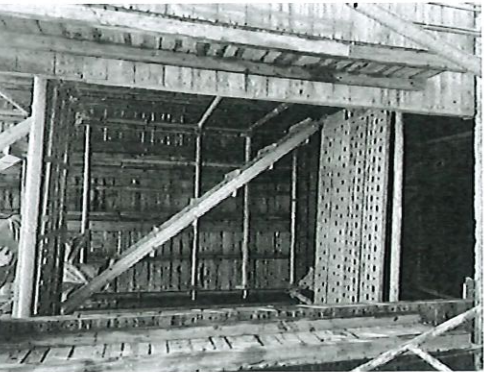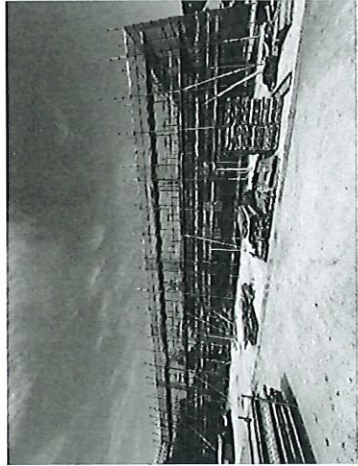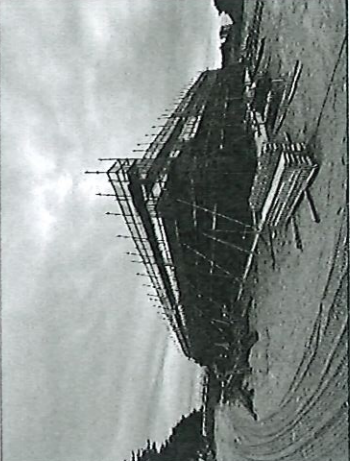
			
電梯井	電梯井	電梯井	電梯井
 外架-1+防塵網-1+腳趾板-1	 外架-1+防塵網-1+腳趾板-1	 外架-1+防塵網-1+腳趾板-1	 外架-2+防塵網 2+腳趾板-2




金益開發 11411 月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


工程編號：JY1140021

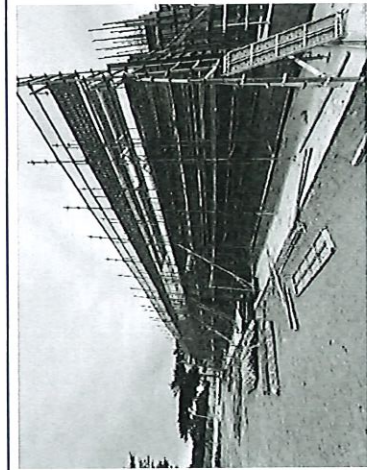


外架-2+防塵網 2+腳趾板-2

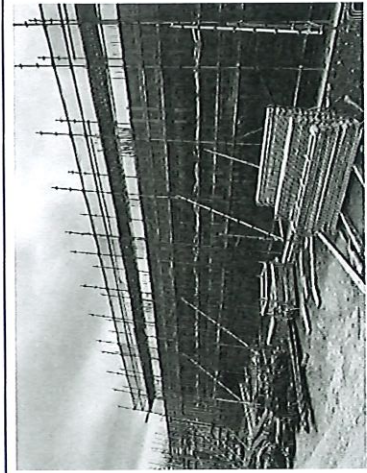


外架-2+防塵網 2+腳趾板-2

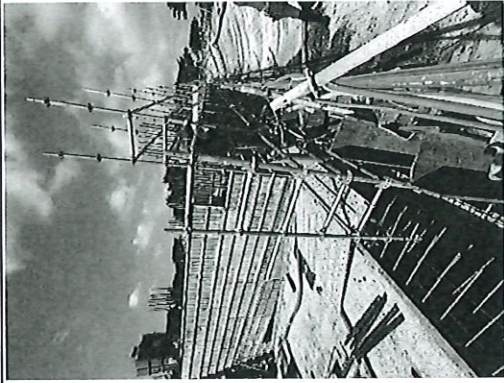


外架-3

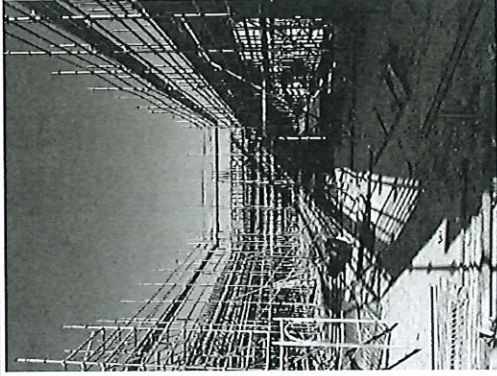


內架-1

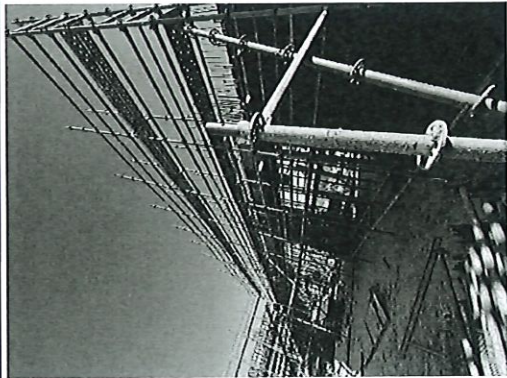

內架-1

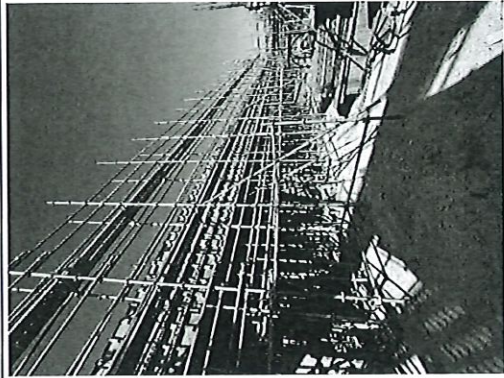

內架-1

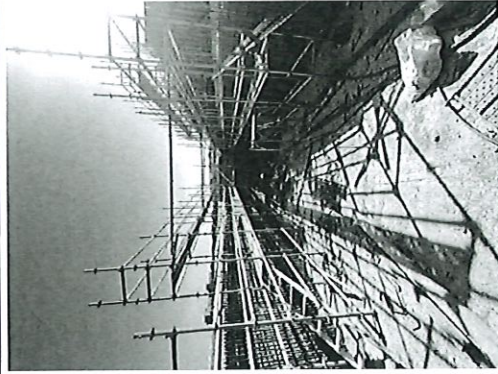

內架-3

電梯井			
寬	長	高	小計
1.219	1.524	6.65	12.35
1.219	1.524	6.65	12.35
1.524	1.524	6.65	15.45
總計/M2			40.15

標 9



金益開發 11411 月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程編號：JY1140021

外架-1			
型式	長	高	小計
1219	5.487	6.175	33.88
	69.802	6.55	464.18
總計/M2		1219	498.06
防壁輔助踏板			
		3	
		18	
		6	

防塵網-1		
長	高	小計
5.487	6.175	33.88
70.524	6.65	468.98
總計/M2		502.86

腳趾板-1			
長	層	小計	
1.219	6	7.31	
16.461	6	98.77	
12.305	2	24.61	
36.385	4	145.54	
22.251	2	44.5	
21.946	3	65.84	
12.192	2	24.38	
14.935	1	14.94	
6.401	1	6.4	
8.23	2	16.46	
總計/M		448.75	

外架-2			
型式	長	高	小計
1219	78.336	6.65	520.93
總計/M2		1219	520.93
		16	
		6	

防塵網-2		
長	高	小計
78.336	6.65	520.93
總計/M2		520.93

腳趾板-2			
長	層	小計	
1.219	9	10.97	
25.299	3	75.9	
15.24	3	45.72	
39.93	3	119.79	
35.968	3	107.9	
14.631	2	29.26	
19.508	2	39.02	
10.973	1	10.97	
23.166	1	23.17	
總計/M		462.7	

內架-1			
型式	長	高	小計
722	70.416	6.65	468.27
總計/M2		722	468.27
		10	
		3	

腳趾板-3			
長	層	小計	
23.777	3	71.33	
23.055	3	69.17	
9.257	3	27.77	
7.813	3	23.44	
13.91	3	41.73	
22.365	3	67.1	
38.826	3	116.48	
總計/M		417.02	

內架-2			
型式	長	高	小計
722	11.696	6.65	77.78
1829	11.696	6.65	77.78
總計/M2		722	77.78
		1829	77.78
		3	
		3	

腳趾板-4		
長	層	小計
11.696	5	58.48
2.551	5	12.76
9.867	1	9.87
總計/M		81.11

內架-3			
型式	長	高	小計
	1.829	2.375	4.34
	3.658	2.85	10.43
	1.829	3.325	6.08
	3.658	4.275	15.64
	7.316	4.75	34.75
	7.316	5.225	38.23
	7.316	5.7	41.7
	7.316	6.175	45.18
總計/M2		722	196.35
		斜撐	1
		梯	2
		壁拉桿	3
		3:6挑梁	2

外架-3			
型式	長	高	小計
722	1.829	2.85	5.21
總計/M2		722	5.21
		梯	3

腳趾板-5		
長	層	小計
16.461	4	65.84
14.632	2	29.26
15.739	2	31.48
5.102	2	10.2
6.594	1	6.59
7.316	1	7.32
5.487	1	5.49
9.145	1	9.15
總計/M		165.33



層數		原有建物	新建建物A棟 辦公棟	新建建物B棟 國際會議廳
建築面積			2685.29	
地面層	B1F		2,699.44	
	1F		2,171.49	513.80
	2F		1,114.34	218.23
	3F		1,242.91	
	4F		1,211.90	
	5F		1,208.43	
	6F		528.12	
	合計	0.00	10,908.66	



副本

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

630

雲林縣斗南鎮長安路一段115號

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號

承辦人：馬弘任

電話：05-5526323

傳真：05-5370420

電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：久木營造有限公司

發文日期：中華民國114年6月13日

發文字號：雲環行字第1140009339號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」因開挖方式變更，已於114年4月24日與久木營造有限公司完成第1次契約變更之議價，請貴事務所協助提供此一部份之預算書圖，以利本局與久木營造有限公司完成契約變更協議書之簽訂，請查照。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

副本：久木營造有限公司、本局行政科



局長張喬維

本案依分層負責規定授權主管科長決行

項次	項目及說明	單位	明挖進坡填裝				鋼板樁開挖			
			數量	單價	複價	編號(樁註)	數量	單價	複價	
二	基礎工程									
1	施工測量, 工地放樣	M2								
2	構造物開挖, 機械挖, 含近邊暫存	M3	24,525.00	300	7,357,500	0331087796.#	17789.895		300	5,335,969
3	構造物回填, 原材料回填, 含運裝	M3	11,610.00	300	3,483,000	0151055016.#	4874.895		300	1,462,469
	85%≤壓實度									-
4	廢方處理, 含場區卸卸, 含近邊堆置	M3	12,915.00	247	3,190,005	0331087797.#	12915		247	3,190,005
5	隧道噴漿土, 175kgf/cm ² , t=5cm	M2	3,642.00	1,390	5,062,380		1435		1,390	1,994,650
6	安全監測系統	式								
7	抽水、點井、深度<6m	支								
	小計									
										-
	樁土設施, 鋼板樁 L=9M	M					235.6	13,000		3,062,800
	輔助加強樁, H型鋼租金	支					295	16,000		4,720,000
	300*300*10*15, L=13M									
				總計	19,092,885				總計	19,766,893
									差異	674,008

合約明挖噴漿土方量	面積M2	厚(高)M	體積M3
合約填方量			24525
			11610
更改工法後土方量			
主建物	2813	5.45	15330.85
電梯坑	69.6	0.2	13.92
主建物與鋼板樁之間	349	5.5	1919.5
斜坡降挖	725	1.45	525.625
	挖		17789.895



各施工樓層統計表(物件)

列表日期:2024/12/25
共 1 頁 第 1 頁

工程編號 : H241103
工程名稱 : 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別:A

各施工樓層*模版*總結果(單位:M2)

樓層	柱	樑	版	牆	樓 梯	基 礎	額 外	扣 接 頭	小 計	累 計
R				119.13					119.13	33,177.44
6	218.00	676.68	386.67	2,184.30				-683.96	2,781.68	33,058.31
5	400.40	1,193.50	731.17	2,734.99				-844.71	4,258.48	30,276.63
4	400.40	1,061.00	743.16	2,483.81	43.13			-819.02	3,912.48	26,018.14
3	408.40	1,113.73	925.67	2,309.09	43.13			-758.99	4,041.03	22,105.67
2	524.80	1,622.00	1,121.94	2,806.14	43.13			-833.23	5,284.78	18,064.64
1	629.28	1,147.21	711.57	3,537.63	47.13			-748.10	5,324.73	12,779.86
B1	825.12	2,603.69	1,996.25	3,034.64	40.80	36.00	-95.45	-985.92	7,455.13	7,455.13
F	409.60	4,361.98	839.02				-83.00	-1,837.76	3,689.84	
小計	3,816.00	13,779.79	7,455.45	19,209.72	260.45	36.00	-178.45	-7,511.68	36,867.28	36,867.28
損耗										
合計	3,816.00	13,779.79	7,455.45	19,209.72	260.45	36.00	-178.45	-7,511.68	36,867.28	36,867.28




雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

辦公大樓2F樑版料單

統計日期:2025.10.17 單位:公尺 材質:#3以上SD420W


備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
樓梯用料	#4		4.80		4.80	13	0.994	62
樓梯用料	#4		4.00		4.00	6	0.994	24
樓梯用料	#4		1.60		1.60	39	0.994	62
樓梯用料	#3		1.30	0.20	1.50	80	0.56	67
牆預留筋	#3		0.70	0.20	0.90	600	0.56	302
牆預留筋	#3		5.00		5.00	100	0.56	280
牆預留筋	#3		1.20		1.20	400	0.56	269
							#10	635
							#8	29958
							#7	6319
							#6	169
							#5	1337
							#4	38378
							#3	2318
							合計	79114



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

國際會議廳-2F樑版料單

統計日期:2025.10.17 單位:公尺 材質:#3以上SD420W


備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
			0.40 135度					
樑箍蓋	#4	0.13		0.12	0.65	246	0.994	159
版下層筋	#4		5.00		5.00	332	0.994	1650
版下層筋	#4		4.20		4.20	136	0.994	568
上層工作筋	#4		5.00		5.00	60	0.994	298
下層工作筋	#3		5.00		5.00	160	0.56	448
版上層筋	#4		6.80 0.20		7.00	136	0.994	946
版上層筋	#4		6.20 0.20		6.40	60	0.994	382
版上層筋	#4		7.00		7.00	76	0.994	529
版上層筋	#4		5.00		5.00	60	0.994	298
			0.24					
版馬椅	#4	0.08		0.08	1.00	108	0.994	107
		0.30		0.30				
階梯用料	#4		6.80 0.20		7.00	110	0.994	765
階梯用料	#4		5.00		5.00	55	0.994	273
			1.15					
階梯用料	#3		74度 0.45		1.60	935	0.56	838
牆預留筋	#3		0.70 0.20		0.90	160	0.56	81
牆預留筋	#3		5.00		5.00	20	0.56	56
							#10	0
							#8	6639
							#7	0
							#6	0
							#5	0
							#4	8605
							#3	1422
							合計	16667

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

車道樑版料單

統計日期:2025.10.28 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	剪長度	支數	單位重	小計
			0.30 135度					
樑箍蓋	#4	0.13		0.12	0.55	62	0.994	34
版筋	#5		8.55	0.25	8.80	31	1.56	426
版筋	#5		6.15	0.25	6.40	126	1.56	1258
版筋	#5		5.35	0.25	5.60	31	1.56	271
版筋	#5		3.95	0.25	4.20	252	1.56	1651
版筋	#5		1.95	0.25	2.20	126	1.56	432
版筋	#5		8.40		8.40	31	1.56	406
版筋	#5		5.00		5.00	31	1.56	242
版筋	#4		4.80		4.80	39	0.994	186
版筋	#4		3.80		3.80	24	0.994	91
版筋	#4		0.80 0.20		1.20	168	0.994	200
		0.20	45度-45度					
			0.20					
版馬椅	#4		0.20 0.20		1.20	72	0.994	86
			0.30 0.30					
牆筋	#4		5.00		5.00	240	0.994	1193
牆筋	#4		1.40		1.40	504	0.994	701
樣品					#10	1	#10	2282
					#8	1	#8	798
					#7	1	#7	304
					#6		#6	0
					#5	1	#5	4686
					#4	1	#4	3244
					#3		#3	0
					合計		11315	



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

辦公大樓2F柱牆料單

統計日期:2025.11.10 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
柱筋續接	#10	#10公	← 4.00 ■	#10母	4.00	44	6.41	1128
柱筋續接	#8	#8公	← 4.00 ■	#8母	4.00	478	3.98	7610
柱筋續接	#8		— 4.00 ■	#8母	4.00	61	3.98	971
柱筋續接	#8		— 3.20 ■	#8母	3.20	61	3.98	777
				合計		644		



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

國際會議廳-2F柱牆料單

統計日期:2025.11.10 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
柱筋續接	#8		—2.80■	#8母	2.80	80	3.98	892
柱筋續接	#8		—2.00■	#8母	2.00	80	3.98	637
柱筋續接	#8		—1.50■	#8母	1.50	34	3.98	203
柱筋續接	#8		—0.70■	#8母	0.70	34	3.98	95
					合計	228		




瑁育預拌混凝土股份有限公司

附件7

工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司
 施工地點：日期：114/11/06

斗六廠

編號：SH14110098
 下料序號：

車 號	KEN-6053	強 度	280	Kg/cm ²
車 次	第 5 車	設計坍度	18	CM
數 量	9.0 M ³	最大骨材	19	MM
累計數量	45.0 M ³			
總 重	34,140 Kg			
空 重	12,700 Kg			
淨 重	21,440 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-車道地坪 0923-383-819陳主任			
出車時間	12:50	到達時間		卸料時間
調 度 員	DL林妙靜	工地簽收		
備 註	*在施工現 加 影響其 度者，預拌廠概不負責		地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號
		電 話	05-5576664	


第二聯：請款聯

瑁育預拌混凝土股份有限公司

工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司
 施工地點：日期：114/11/08

斗六廠

編號：SH14110140
 下料序號：

車 號	KLP-8386	強 度	280	Kg/cm ²
車 次	第 2 車	設計坍度	18	CM
數 量	8.0 M ³	最大骨材	19	MM
累計數量	17.0 M ³			
總 重	31,500 Kg			
空 重	12,500 Kg			
淨 重	19,000 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-地樑 0923-383-819陳主任			
出車時間	15:40	到達時間		卸料時間
調 度 員	DL林佳怡	工地簽收		
備 註	*在施工現 加 影響其 度者，預拌廠概不負責		地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號
		電 話	05-5576664	

第二聯：請款聯

瑒育預拌混凝土股份有限公司

工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新舊拌攪凝土送貨單

客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司


施工地點：


日期：114/11/19

斗六廠

編號：SH14110278
下料序號：

第二聯：請款聯

車 號	KLF-9787	強 度	280	Kg/cm ²
車 次	第 22 車	設計坍度	18	CM
數 量	9.0 M ³	最大骨材	19	MM
累計數量	198.0 M ³			
總 重	34,210 Kg			
空 重	12,850 Kg			
淨 重	21,360 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-會議室地坪 0923-383-819陳主任			
出車時間	13:50	到達時間		卸料時間
調 度 員	DL張淑麗	工地簽收		
備 註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號
		地 電	話	05-5576664



盛記預拌混凝土有限公司

預拌混凝土送貨單

B151-3

客戶名稱：久木營造-環保局

契約編號：

出貨單號：SH14110467

工程名稱：

地址：雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話：05-5571542

傳真：05-5574439

澆置地點：虎尾環保局(高鐵前)

日期：114/11/27

出廠時間：17:30 到達時間：

卸完時間：

車次：28

車 號	KEF3332	李景印	總 重	28,370 kg	水泥型式	
規 格	28日強度	280kg/cm ² kgf/cm ²	空 重	13,390 kg	爐石型式	
	設計坍度	18 cm	淨 重	14,980 kg	飛灰型式	
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.00 %	附加劑型式	
	設計坍流度	cm	交貨數量	6.5 m ³	累計數量	246.0 m ³
含拌水水泥總重計 247 米						
備 註	1.在施工现场加水而影響品質，賣方概不負責。 2.材料計量許可差依CNS3090規定。 3.本配比得視早期強度及原料變異機動調整。			調 度 員	林春足	工地簽收

瑞育預拌混凝土股份有限公司						斗六廠	
工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新預拌混凝土送貨單						編號：SH14110417	
客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司						下料序號：	
施工地點：						日期：114/11/27	
車 號	KEF-3683		強 度	280		Kg/cm ²	
車 次	第 44 車	設計坍度	18		CM		
數 量	9.0 M ³	最大骨材	19		MM		
累計數量	396.0 M ³						
總 重	33,900 Kg						
空 重	12,540 Kg						
淨 重	21,360 Kg						
施工地點	虎尾高鐵學府一路-111頂板0923-383-819陳主任						
出車時間	15:40	到達時間			卸料時間		
調 度 員	DL林妙靜		工地簽收				
備 註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號			
			地 電	話 05-5576664			

第三聯：客戶存執

公共工程監造報表

表報編號：雲A01_1141130

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：114年11月30日(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程						
契約工期	600天	開工日期	114年06月17日	預定完工日期	116年02月16日	實際完工日期	-
契約變更次數	1次	工期展延天數	10.0天		契約金額	原契約：607,000,000元	
預定進度(%)	13.0740%	實際進度(%)	19.0720%			變更後契約：607,000,000元	
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):							
1、施工架組立_2F 2、鋼筋續接_2F 3、鋼筋綁紮_2F柱 4、水池清理_地下室筏基 5、模板拆除_1F(內側)							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):							
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):							
四、督導工地職業安全衛生事項:							
(一)施工前檢查事項辦理情形: ☒ 完成 ☐ 未完成							
(二)其他工地安全衛生督導事項:							
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):							
監造單位簽章:							
							

註：

- 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
- 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
- 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新頒發之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

建築物施工日誌

表報編號： 167

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/11/30

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號					不計工期	0	天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16	累計工期	167	日曆天	剩餘工期	443	天
預定進度(%)	13.074%	實際進度(%)	19.072%	本日實際進度(%)	0.161%	展延工期	10	天	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註			
甲	發包工程費								
壹	建築工程								
一	假設及拆除工程								
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)	式	1.00		0.50				
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬	M	300.00		150.00				
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬	M	525.00		525.00				
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)	樁	2.00		2.00				
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)	樁	1.00		1.00				
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆	座	1.00		1.00				
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池	式	1.00		1.00				
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)	式	1.00		1.00				
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 一層建築), 長10.3m, 寬5.64m, 含水電空調等	棟	1.00		1.00				
11	工地臨時建築設施, 辦公設備, 租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00		1.00				
12	工地臨時建築設施, 臨時廁所	組	1.00		1.00				
13	臨時設施, 工程用電設備、用水、資通訊設備, 含申請及設備架設	式	1.00		1.00				
14	臨時設施, 臨時水、電、電信通訊費	月	20.00		6.00				
15	施工輔助設施, 施工架及防護網, 鋼管, 裝拆(含租金), 扶手先行, 含上下設備及其他所需配件, pc鋪底, 圓盤系統施工架	M2	8,671.00	200.00	2,580.00				
16	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	50.00	550.00				
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00		0.50				
二	基礎工程								
1	施工測量, 工地放樣	M2	19,980.00		9,380.00				
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存	M3	17,789.90		17,789.90				
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度	M3	4,874.90		4,800.00				
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置	M3	12,915.00		12,915.00				
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm ² , t=5cm	M2	1,435.00		1,435.00				
6	安全觀測系統	式	1.00		1.00				
7	祛水, 點井, 深度<6m	支	48.00		48.00				
8	擋土設施, 鋼板樁 L=9M	M	235.60		235.00				
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15*20 L=13M	支	295.00		295.00				
三	建築結構體工程								
1	普通模板, (建築, 建築物)	M2	31,257.00		15,663.00				
2	清水模板, (建築, 建築物)	M2	6,717.00		2,540.00				
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.00	15.00	869.00				
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級	個	4,729.00	828.00	3,397.00				
6	結構用混凝土, 140kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	295.00		295.0				
7	結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實	M3	8,451.00		5,220.0				
10	混凝土表面處理, 地坪整體粉光處理	M2	10,528.00		5,650.0				
八	地坪裝修工程								
4	混凝土表面處理, 水泥粉光處理, 混合金鋼砂(F4)	M2	658.00		380				
十一	防水工程								
1	塗液類防潮, 地下室外牆防水, 含回填保護(含筏基外牆), (WP1)	M2	1,390.00		1,200				
5	塗液類防潮, 基礎底板防水, (WP5)	M2	2,740.00		2,740				
貳	機電工程								
一	電氣工程	式							

建築物施工日誌

表報編號： 167

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/11/30

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期		0	天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16	累計工期	167	日曆天	剩餘工期	443	天
預定進度(%)	13.074%	實際進度(%)	19.072%	本日實際進度(%)	0.161%	展延工期	10	天	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
3	照明插座動力工程	式				
k	接地銅棒3m x φ19(3/4")mm	只	5.00		5	
1	裸銅線 100 mm ²	米	78.00		78	
二	弱電工程	式				
1	電信工程	式				
z	按地工程按地電阻值不小於10歐姆(內端拉地端子)及接地銅棒3m x Φ19(3/4")mm及裸銅線 60 mm ² 等工程完成所需材料	式	1.00		1	
11	避雷接地工程	式				
d	接地銅棒3m x φ19(3/4")mm	只	7.00		7	
e	裸銅線 100 mm ²	米	23.00		23	
三	給排水設備工程	式				
2	排水工程	式				
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ(4")x6.6mm	米	141.00		141	
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通管 配管另件另料	式	1.00		1	
一	職業安全衛生, 可量化部分	式	1.00		0.30	
二	職業安全衛生, 不可量化部分	式	1.00		0.30	
三	環境保護, 環境保護措施(可量化部分)	式	1.00		0.60	
四	環境保護, 環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00		0.30	
一	品質管理, 品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00		0.30	
二	品質管理, 材料設備檢試驗費	式	1.00		0.50	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~壹.二合計之8%)		1.00	0.161%	19.07%	
陸	臨時設施, 工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00		100.00%	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00		100.00%	
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	0.161%	19.07%	
營造業專業工程特定施工項目						

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.0	15.00	869.0	
鋼筋, 鋼筋續接器, D25mm(#8), 連工帶料, 柱	組	4,729.0	828.00	3,386.0	
建築用混凝土, 140kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	8,451.0		5,220.0	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組 工	2	328	施工架工	7	111	挖(銼)土機		68
鐵 工		11	泥作工		20	混凝土運輸車		539
水電工		196	油漆工		14	混凝土泵輸車		16
續接工	3	10	技術工		189	移動式全吊車		25
鋼筋工	9	945				吊卡車	1	6
模板工	16	1310				拖車		1
混凝土工		142				搬運車		34

建築物施工日誌

表報編號： 167

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/11/30

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0	天		
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	167	日曆天	剩餘工期	443	天
預定進度(%)	13.074%	實際進度(%)	19.072%	本日實際進度(%)	0.161%	展延工期	10	天	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：									
☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄(註4)：二樓升架、二樓柱鋼筋續接、二樓柱鋼筋綁紮、地下室筏基水池清理、模板拆1樓內側模									
簽章：【工地主任】(註5)：  									

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。

3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。



營造工程物價指數（總指數）銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97	111.83	112.15	112.09	112.43	112.69		

註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1

114.11.01-1F牆封模前清潔



相片說明

2

114.11.03-1F國際會議廳樑、版鋼筋抗拉試驗



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

3


114.11.04-施工架PC澆置



相片說明

4

114.11.06-B1F頂版混凝土抗壓試驗(280kg/cm²)



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

5


114.11.06-車道版鋼筋綁紮完成

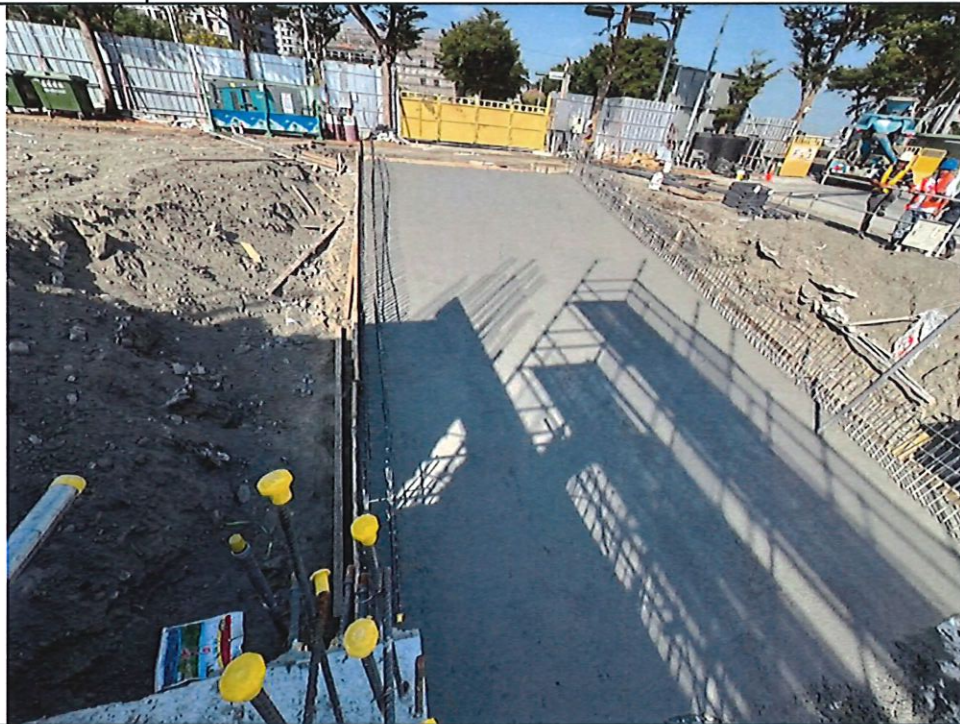

相片說明

6

114.11.06-車道版混凝土澆置完成



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

7


114.11.07-車道版混凝土澆置後灑水養護



相片說明

8

114.11.10-車道樑、版、牆鋼筋抗拉試驗



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

9


114.11.14-1F國際會議廳版鋼筋綁紮



相片說明

10

114.11.14-1F頂版清水模組立



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

11


114.11.19-1F國際會議廳樓梯版混凝土試體取樣(280kg/cm²)



相片說明

12


114.11.19-1F國際會議廳樓梯版混凝土澆置完成



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調

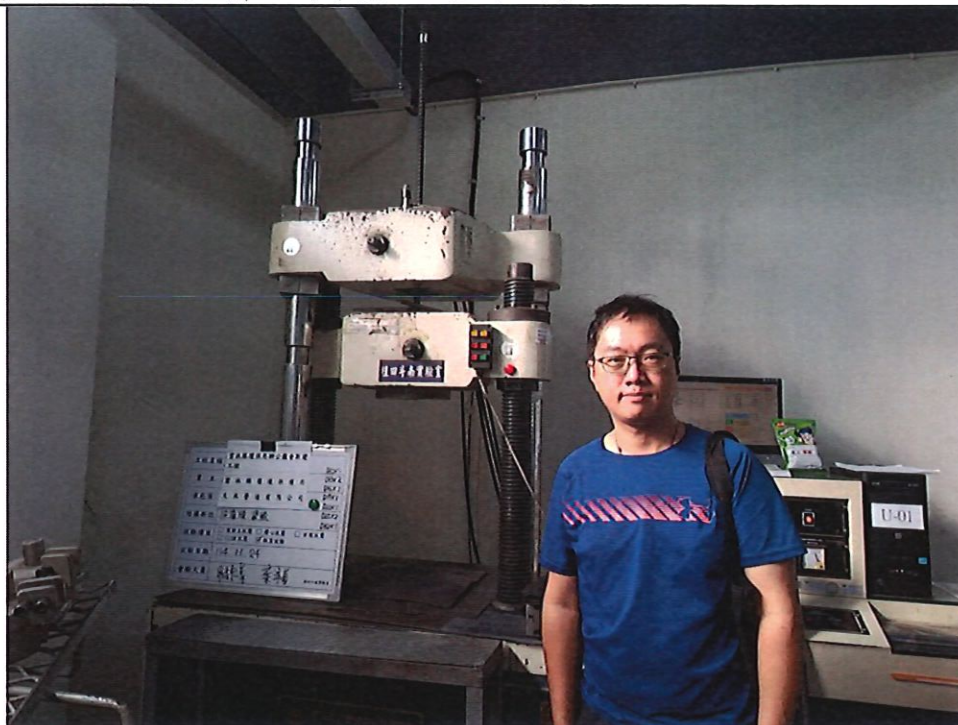

相片說明

13


114.11.24-1F頂版樑、版鋼筋抗拉試驗



相片說明

14

114.11.25-技師督導



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

15


114.11.26-1F頂版灌漿前清洗



相片說明

16

114.11.27-1F頂版混凝土試體取樣(280kg/cm²)



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

17

114.11.28-1F頂版混凝土澆置完成



相片說明

18

114.12.01-2F柱續接器扭力值自主檢查

