

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國115年4月14日
發文字號：雲環行字第1150004423號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第八次估驗，既經監造單位同意，同意核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所115年3月20日碩環字第1150320001號函。
- 二、第八次估驗資料1式3份，由久木營造有限公司、貴事務所及本局各執1份據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環境保護局
雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第八次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：115.02.01~115.02.28

共同投標估驗計價款各成員分配表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

估驗日期：115年02月28日

估驗次別：第八次

成員名稱	本期分配金額	累計分配金額	廠商確認核章
久木營造有限公司	9,051,056 ✓	截至上期: 147050319 (80 後附第7期估驗) 147050319 + 9051056 = 156,101,375	 
祥旺機電工程有限公司	0	0	 
正益空調工程有限公司	0	0	 
合計	9,051,056	156,101,375	

雲林縣環境保護局





工程採購估驗申請書(第八次估驗)

填表日期：115年02月28日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	✓ 17,514,884	累積已估驗金額	151,975,895 ✓
本次估驗金額	✓ 9,527,427	累計估驗金額	161,503,322 ⁵¹⁹⁷⁵⁸⁹⁵⁺⁹⁵²⁷⁴²⁷
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月16日
本次估驗基準日	115年02月28日	前次估驗基準日	115年01月31日
本次估驗基準日之預定進度	22.005% ^{如後施}	前次估驗基準日之預定進度	19.774%
本次估驗基準日之實際進度	26.628% ^{工日估}	前次估驗基準日之實際進度	25.069%

檢附：估驗計價文件(1式3份)：

- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。(無者免)
- 9. 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
 	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">柯乃文</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> 符合契約約定。 <input type="checkbox"/> 未符合契約約定。	 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">115. 3. 20</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">監造專用章</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">115. 3. 20</p>

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

952742/60900000
第1頁共1頁
單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程			估驗次別	8	完成百分比	本次 1.57
工程編號	開工日期	114年06月17日	原契約金額	607,000,000	累計	26.61	161,593,322
契約編號	履約期限	610日曆天	最近一次契約變更後之契約金額		已工作日數	257	609000000
廠商名稱	估驗期間	115年02月23日	累計撥付預付款		累計撥付未扣回預付款		
估驗詳細表							
	估價	驗	詳	表			
	估驗計價款(C)	物價指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)	備註
本次	9,527,427			476,371	9527427 x 0.05	9,051,056	
截至前次累計	151,975,895		16000	4,909,576		147,050,319	
截至本次累計	161,503,322		16,000	5,385,947		156,101,375	

本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「建約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：











監造單位	承包廠商	承辦人	科長	秘書	副局長	局長
		柯乃文	柯乃文	柯乃文	柯乃文	柯乃文
	工程師	工程師	工程師	工程師	工程師	工程師

雲林縣環境保護局 估驗請款計價單


工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		預算施工金額		第8次付款		第1頁共1頁	
工程編號	114-041	實際開工日期	114年06月17日	承包金額	607,000,000	本期核發金額	9,051,056		
契約編號	雲林縣虎尾鎮	規定完工期限	610日曆天	變更設計 增減金額	0	本期應扣金額	0		
工程地點	久木營造有限公司	估驗日期	115年02月28日	應增	0	本期實發金額	9,051,056		
施工單位				應減	0	以前核發金額	147,050,319		
				結果淨增、減	0	總計核發金額	156,101,375		

估驗項目	原契約或追 加減後總價	完成百分率		估驗計價		保留金額		核發金額		備註
		本次	累計	本次	累計	本次	累計	本次	累計	
施工費(115年02月28日)	607,000,000	1.57	26.61	9,527,427	161,503,322	476,371	5,385,947	9,051,056	(156,117,375)	一次之開通約 金16,000
物價指數調整款(115年02月)										
合計				9,527,427	161,503,322	476,371	5,385,947	9,051,056	156,117,375	

項 目	金額	本單所計價款及 完成百分率 施工廠商：久木 營造有限公司 負責人：賴雪燕
合計	9,051,056	中華民國 年 月 日(發票送達日期)

監造單位	承辦人	科長	秘書	副局長	局長
   	 				

專任工程人員：**柯乃文**

工程人員責任章：

雲林縣環境保護局

計價保留金額計算 (第9期, 截至115年02月28日止)

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼構、木構、門窗、金屬、裝修、防水、雜項、設備、景觀工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	8,198,000.00		
甲.貳	機電工程	8,198,000.00		
	小計	100.00%		
	第09期			
甲.參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	86,209.35		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	132,500.00		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	655,840.00		
甲.陸	臨時設施, 工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%	453,627.47		
甲.捌	營業稅 5%	9,527,426.82		
	小計	476,371	9,527,427	
	合計	476,371	476,371	
	保留金額小計			
	(B) 保留金額合計			

物調保留金額計算

項次	工作項目	成員編號1-(5%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計			
	合計			
	物調保留金額小計			
	(D) 保留金額合計			

核發金額核算

	本期估驗計價	9,527,427		
	-估驗計價保留款	476,371		
	本期物調指數			
	-物調指數保留款			
	總價(總計)	9,051,056		
	(E) 核發金額合計		9,051,056	

註：以上保留金額計算方式(第1成員：久木-5%)、(第2成員：祥旺-5%)、(第3成員：正益-5%)

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價總表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 1 頁 共 2 頁

機房及機房設備工程估驗計價總表
機房前期資料. 點字表

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
甲	發包工程費												
壹	建築工程												
一	假設及拆除工程		1	20,206,750	√20,206,750	1	8,888,890.00		1	710,300.00	1	9,599,190.00	
二	基礎工程		1	22,152,085	√22,152,085	1	√21,623,615.34		1	60,500.00	1	21,684,115.34	
三	建築結構體工程		1	122,725,370	√122,725,370	1	√92,081,070.00		1	7,427,200.00	1	99,508,270.00	
四	鋼構工程		1	28,800,734	√28,800,734								
五	木構工程		1	25,366,336	√25,366,336								
六	門窗工程		1	51,756,778	√51,756,778	1	√476,256.00				1	476,256.00	
七	金屬工程		1	44,582,805	√44,582,805								
八	地坪裝修工程		1	18,757,610	√18,757,610	1	√174,800.00				1	174,800.00	
九	牆面裝修工程		1	23,725,575	√23,725,575	1	√2,186,150.00				1	2,186,150.00	
十	坪頂裝修工程		1	20,177,200	√20,177,200								
十一	防水工程		1	9,913,150	√9,913,150	1	√4,168,300.00				1	4,168,300.00	
十二	雜項工程		1	12,147,925	√12,147,925								
十三	設備工程		1	3,817,880	√3,817,880								
十四	景觀工程		1	12,526,947	√12,526,947								
	建築工程合計(甲.壹)			416,657,145	√416,657,145		√129,599,081.34			8,198,000.00		137,797,081.34	
貳	機電工程												
一	電氣工程		1	33,970,706	√33,970,706								
二	弱電工程		1	24,731,200	√24,731,200								
三	給排水設備工程		1	12,340,000	√12,340,000								
四	消防工程		1	7,196,210	√7,196,210								
五	空調工程		1	31,644,846	√31,644,846								
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集		1	874,000	√874,000								
	機電工程合計(甲.貳)			110,756,962	√110,756,962								
	直接工程費用			527,414,107	√527,414,107		√129,599,081.34			8,198,000.00		137,797,081.34	

承包商:

監造單位:



雲林縣環境保護局 估驗計價總表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 2 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)									
一	職業安全衛生，可量化部分		1	234,187	1	234,187	1	234,187	1	234,187
二	職業安全衛生，不可量化部分		1	990,000	1	990,000	1	990,000	1	990,000
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)		1	2,178,677	1	2,178,677	1	2,178,677	1	2,178,677
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)		1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)									
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1	2,650,000	1	2,650,000	1	2,650,000	1	2,650,000
二	品質管理，材料設備檢試驗費		1	514,485	1	514,485	1	514,485	1	514,485
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標準申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)		1	42,193,129	1	42,193,129	1	42,193,129	1	42,193,129
	合計(甲.壹~甲.伍)			576,674,585		576,674,585		576,674,585		576,674,585
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)		1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1	1,441,686	1	1,441,686	1	1,441,686	1	1,441,686
捌	營業稅(甲.壹~甲.伍合計5%)		1	28,833,729	1	28,833,729	1	28,833,729	1	28,833,729
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)			607,000,000		607,000,000		607,000,000		607,000,000
	總價(總計)			607,000,000		607,000,000		607,000,000		607,000,000

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
壹	發包工程費									
壹	建築工程									
一	假設及拆除工程									
1	工地拆除、拆除、清除與整平，含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	✓	350,000	0.50	✓175,000.00	0.50	175,000.00
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	✓	465,000	150.00	✓232,500.00	150.00	232,500.00
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬	M	525.00	6,000	✓	3,150,000	472.00	✓2,832,000.00	472.00	2,832,000.00
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	✓	97,000	1.70	✓82,450.00	1.70	82,450.00
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	✓	28,500	0.80	✓22,800.00	0.80	22,800.00
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆	座	1.00	77,500	✓	77,500	0.90	✓69,750.00	0.90	69,750.00
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	120,000	✓	120,000	0.70	✓84,000.00	0.025	3,000.00
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	✓	36,000	0.50	✓18,000.00	0.50	18,000.00
9	竣工文件，竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	✓	50,000				
10	工地臨時建築設施，(組V式臨時房舍，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等	棟	1.00	230,000	✓	230,000	1.00	✓230,000.00	1.00	230,000.00

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	✓ 66,890	1.00	✓ 66,890.00			1.00	66,890.00		
12	工地臨時建築設施，臨時廁所	組	1.00	37,800	✓ 37,800	1.00	✓ 37,800.00			1.00	37,800.00		
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設	式	1.00	150,000	✓ 150,000	1.00	✓ 150,000.00			1.00	150,000.00		
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	✓ 760,000	8.00	✓ 304,000.00	1.00	38,000.00	9.00	342,000.00		
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pC鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	✓ 5,982,990	4,230.00	✓ 2,918,700.00	970.00	669,300.00	5,200.00	3,588,000.00		
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	✓ 1,681,680	750.00	✓ 330,000.00			750.00	330,000.00		
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	✓ 1,296,680								
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	✓ 2,591,910	3,500.00	✓ 1,085,000.00			3,500.00	1,085,000.00		
19	工地清理，交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	✓ 1,000,000								
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.50	✓ 250,000.00			0.50	250,000.00		
21	工地清理，營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	✓ 1,052,800								
22	資料送審(含竣工圖、竣工資料製作、建築勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標準作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用)	式	1.00	350,000	✓ 350,000								
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	✓ 132,000								

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
二	基礎工程				√20,206,750		√8,888,890.00		710,300.00				9,599,190.00
1	小計												
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	50	√999,000	10,460.00	√523,000.00	1,210.00	60,500.00	11,670.00	583,500.00		
2	構造物開挖，機械挖，含近運暫存	M3	17,789.895	300	√5,336,969	17,789.90	√5,336,968.50			17,789.895	5,336,968.50		
3	構造物回填，原材料回填，含運費，85%≤壓實度	M3	4,874.895	300	√1,467,469	4,700.00	√1,410,000.00			4,700.00	1,410,000.00		
4	廢方處理，含揚塵抑制，含近運堆置	M3	12,915.00	247	√3,190,005	12,915.00	√3,190,005.00			12,915.00	3,190,005.00		
5	隧道填混凝土，175kgf/cm2，t=5cm	M2	1,435.00	1,390	√1,994,650	1,435.00	√1,994,650.00			1,435.00	1,994,650.00		
6	安全觀測系統	式	1.00	140,200	√140,200	1.00	√140,200.00			1.00	140,200.00		
7	抽水，點井，深度<6m	支	48.00	40,000	√1,920,000	48.00	√1,920,000.00			48.00	1,920,000.00		
8	擋土設施，鋼板樁L=9M	M	235.60	11,874.15	√2,797,550	235.60	√2,797,549.74			235.60	2,797,549.74		
9	輔助加強樁，H型鋼租金 300*300*15，L=13M	支	295.00	14,614.38	√4,311,242	295.00	√4,311,242.10			295.00	4,311,242.10		
	小計				√22,152,085		√21,623,615.34		60,500.00		21,684,115.34		
三	建築結構體工程												
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	1,110	√34,695,270	21,762.00	√24,155,820.00	3,015.00	3,346,650.00	24,777.00	27,502,470.00		
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	1,200	√8,060,400	4,350.00	√5,220,000.00			4,350.00	5,220,000.00		
3	銲接鋼線網，點焊鋼線網 \$ 7x \$ 7x150x 150mm	M2	57.00	500	√28,500								
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	33,000	√46,563,000	1,167.00	√38,511,000.00	49.00	1,617,000.00	1,216.00	40,128,000.00		
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	250	√1,182,250	3,923.00	√980,750.00	490.00	122,500.00	4,413.00	1,103,250.00		
6	結構用混凝土，140kgf/cm2，第1型水泥， 含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	√885,000	295.00	√885,000.00			295.00	885,000.00		
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥， 含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	√29,578,500	6,071.00	√21,248,500.00	628.50	2,199,750.00	6,699.50	23,448,250.00		
8	水坭混凝土鋪面，t=40cm，輕質混凝土	M3	55.00	2,500	√137,500								

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 4 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1:3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	√ 15,750						
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	√ 1,579,200	7,200.00	√ 1,080,000.00	942.00	141,300.00	8,142.00	1,221,300.00
	小計				√ 122,725,370		√ 92,081,070.00		7,427,200.00		99,508,270.00
四	鋼構工程										
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	√ 4,182,000						
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	√ 164,000						
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	√ 738,000						
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	√ 16,287,000						
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	√ 712,000						
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	√ 57,200						
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	√ 145,600						
8	高拉力螺栓 M22 S10T	支	1,294.00	85	√ 109,990						
9	剪力釘 φ 22mm L=125mm	支	504.00	36	√ 18,144						
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	√ 43,200						
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	√ 61,500						
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	√ 234,000						
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	√ 5,606,280						
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	√ 41,820						
15	建築鋼結構，鋼構梯(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	√ 400,000						

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 6 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
	W140*H240												
8	鋁窗，推射+橫拉式，電動掛煙；WD04-F，W140*H240	樞	15.00	28,560	✓ 428,400								
9	鋁窗，鋁百葉，WD11，W140*H240	樞	3.00	25,200	✓ 75,600								
10	鋁窗，防火檢修門，60A，WD12，W50*H80	樞	5.00	7,200	✓ 36,000								
11	鋁窗，推射式，鋁百葉，WD13，W130*H240	樞	6.00	24,960	✓ 149,760								
12	防水閘門，不銹鋼，D03	樞	1.00	504,000	✓ 504,000								
13	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D01，W90*H220	樞	9.00	15,260	✓ 137,340								
14	鋁門扇及門樞，推射式，紙蕊蜂巢美耐板門，D04，W120*H220	樞	2.00	19,160	✓ 38,320								
15	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門，D05，W80*H220	樞	6.00	12,320	✓ 73,920								
16	鋁門扇及門樞，推射式，鋁框玻璃門，D06，W100*H220	樞	15.00	15,400	✓ 231,000								
17	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220	樞	6.00	39,600	✓ 237,600	0.90	✓ 35,640.00				0.90	35,640.00	
18	鋁門扇及門樞，橫拉門，熱固性樹脂板門，D07，W100*H220	樞	7.00	14,960	✓ 104,720								
19	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220	樞	16.00	47,520	✓ 760,320	1.80	✓ 85,536.00				1.80	85,536.00	
20	鋁門扇及門樞，橫拉門，紙蕊蜂巢美耐板門，D09，W100*H220	樞	1.00	20,000	✓ 20,000								
21	鋁門扇及門樞，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220	樞	14.00	39,600	✓ 554,400	1.50	✓ 59,400.00				1.50	59,400.00	

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 7 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
22	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D11，W100*H320	樘	6.00	19,200	✓	115,200				
23	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220	樘	8.00	79,200	✓	633,600	2.40	✓190,080.00		
24	鋼門扇及門樘，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220	樘	12.00	88,000	✓	1,056,000	1.20	✓105,600.00		
25	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，D15，W140*H320	樘	2.00	29,120	✓	58,240			1.20	105,600.00
26	鐵捲門，(A種防火門，1小時防火時效)，SD01，W600*H370	樘	1.00	375,000	✓	375,000				
27	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD1，W120*H220	樘	19.00	17,160	✓	326,040				
28	鋼門扇及門樘，推射式，防火玻璃門，60A，GD01F，W120*H220	樘	3.00	52,800	✓	158,400				
29	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD02，W180*H220	樘	1.00	29,700	✓	29,700				
30	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD03，W150*H220	樘	2.00	24,750	✓	49,500				
31	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD04，W150*H240	樘	1.00	27,000	✓	27,000				
32	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD05，W200*H240	樘	1.00	36,000	✓	36,000				
33	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD07，W130*H220	樘	11.00	21,450	✓	235,950				
34	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD08，W100*H220	樘	21.00	14,300	✓	300,300				

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 8 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
35	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD09，W120*H240	樘	3.00	18,720	✓	56,160				
36	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD10，W240*H240	樘	1.00	43,200	✓	43,200				
37	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD11，W220*H240	樘	1.00	39,600	✓	39,600				
38	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD12，W155*H210	樘	1.00	16,300	✓	16,300				
39	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD13，W125*H210	樘	1.00	13,150	✓	13,150				
40	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD14，W160*H210	樘	1.00	16,800	✓	16,800				
41	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD15，W180*H210	樘	1.00	18,900	✓	18,900				
42	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD16，W245*H210	樘	1.00	25,750	✓	25,750				
43	鋁窗，鋁框，強化玻璃隔間	M2	728.50	4,000	✓	2,914,000				
44	鋁窗，鋁框，防火玻璃隔間	M2	35.00	9,240	✓	323,400				
45	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆鋁框架強化玻璃帷幕	M2	1,200.00	18,900	✓	22,680,000				
46	鋁帷幕牆，抗風壓強度360kgf/m2，外牆造型鋁框架強化玻璃帷幕	M2	530.00	23,800	✓	12,614,000				
	小計				✓	51,756,778	✓	476,256.00		476,256.00
七	金屬工程									
1	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	M2	4,550.00	2,000	✓	9,100,000				
2	金屬製品，水平花架金屬包板與被襯骨架	M2	495.00	8,600	✓	4,257,000				

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表


估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
21	建築鋼結構，鋼構戶外梯面板及收邊	式	1.00	50,000	✓ 50,000						
22	建築鋼結構，空木收邊(國際會議廳屋頂)	M	66.00	6,900	✓ 455,400						
	小計				✓ 44,582,805						
八	地坪裝修工程										
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	✓ 918,000						
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	✓ 6,000,200						
3	鋪地磚，鑿面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	✓ 2,544,360						
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	✓ 302,680	380.00	✓ 174,800.00			380.00	174,800.00
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	✓ 346,725						
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	✓ 203,550						
7	地毯，連工帶料，含底塗料、防水黏膠及工資，1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	✓ 676,480						
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	✓ 169,850						
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	✓ 2,005,740						
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	✓ 3,228,500						
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	✓ 2,361,525						
	小計				✓ 18,757,610		✓ 174,800.00				174,800.00
九	牆面裝修工程										
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	✓ 14,230,100	1,496.00	✓ 1,720,400.00			1,496.00	1,720,400.00
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	✓ 2,594,025						
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	✓ 1,762,950	405.00	✓ 465,750.00			405.00	465,750.00

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
4	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2,150	✓1,784,500						
5	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度，(W8)	M2	1,560.00	2,150	✓3,354,000						
	小計				✓23,725,575		✓2,186,150.00				2,186,150.00
十	坪頂裝修工程										
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	✓6,380,850						
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	✓6,721,000						
3	暗架砂酸鈣板天花，含面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	✓2,409,750						
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	✓4,665,600						
	小計				✓20,177,200						
十一	防水工程										
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含回填保護(筏基外牆)，(WP1)	M2	1,390.00	920	✓1,278,800					1,390.00	1,278,800.00
2	塗液類防潮，筏基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水，(WP2)	M2	2,875.00	600	✓1,725,000		✓1,725,000.00			2,875.00	1,725,000.00
3	塗液類防潮，電梯機坑防水(五面施工)，(WP3)	M2	57.00	600	✓34,200						
4	塗液類防潮，地下室外露地坪及牆面防水，H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	✓1,609,500						
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)	M2	2,740.00	425	✓1,164,500		✓1,164,500.00			2,740.00	1,164,500.00
6	塗液類防潮，外牆樓層接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	280	✓260,400						

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	✓ 583,550						
8	塗液類防潮，屋頂平台及牆面防水，H=30cm，(WP8)	M2	1,989.00	1,500	✓ 2,983,500						
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9)	M2	782.00	350	✓ 273,700						
	小計				✓ 9,913,150		✓ 4,168,300.00				4,168,300.00
十二	雜項工程										
1	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F, 7停)，12人座	台	1.00	2,280,500	✓ 2,280,500						
2	無障礙電動升降梯，載人用(含人貨兩用，附殘障設備)，60m/min，無障礙電梯(BIF-6F, 7停)，15人座	台	2.00	2,428,000	✓ 4,856,000						
3	捲簾，電動式，電梯遮煙用	組	21.00	52,000	✓ 1,092,000						
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	✓ 44,280						
5	金屬製品(筏基本池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	✓ 124,740						
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	✓ 90,000						
7	浴廁強化美耐板隔間，小便斗隔板	組	19.00	1,860	✓ 35,340						
8	浴廁強化美耐板隔間，隔間及門板	M2	193.00	4,215	✓ 813,495						
9	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	✓ 272,500						
10	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	✓ 42,880						
11	伸縮縫蓋板組裝，SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	✓ 115,240						

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
p	戶外單向洗牆壁燈，連工帶料	盞	9.00	4,000	✓ 36,000						
q	戶外雙向洗牆壁燈，連工帶料	盞	21.00	5,000	✓ 105,000						
r	閱讀壁燈，連工帶料	盞	6.00	820	✓ 4,920						
s	戶外插地式投射燈，連工帶料	盞	30.00	4,300	✓ 129,000						
t	上項燈具用防水型變壓器.20W，連工帶料	個	30.00	500	✓ 15,000						
u	戶外嵌入式壁燈，連工帶料	盞	13.00	4,300	✓ 55,900						
v	線性泛光嵌燈，連工帶料	盞	203.00	3,800	✓ 771,400						
w	泛光圓嵌燈，連工帶料	盞	122.00	600	✓ 73,200						
	小計				✓ 8,817,880						
十四	景觀工程										
1	鋪地磚，30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	✓ 3,850,425						
2	鋪地磚，30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	✓ 1,554,300						
3	瀝青混凝土鋪面，(第1類型，密紋配)，粗粒料37.5mm，黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	✓ 2,616,000						
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	✓ 143,982						
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	✓ 15,000						
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	✓ 132,000						
7	排水管溝，UA型，場鑄，含不銹鋼化收蓋版	M	282.00	12,780	✓ 3,603,960						
8	排水管溝，UB型，暗溝，場鑄	M	32.00	6,290	✓ 201,280						
9	陰井，含蓋，GA型	組	20.00	8,000	✓ 160,000						
10	陰井，含蓋，GB型	組	15.00	10,000	✓ 150,000						
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	✓ 100,000						
	小計				✓ 12,526,947						
	建築工程合計(甲、壹)				✓ 416,657,145			✓ 129,599,081.34			
貳	機電工程									8,198,000.00	137,797,081.34

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 135 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	壓及平衡調整										
d	空調系統測試、調整及平衡，電力及中央監控系統測試及平衡調整	式	1.00	100,886	√ 100,886						
	小計				√ 398,202						
	空調工程合計(甲.貳.五)				√ 31,644,846						
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	√ 874,000						
	機電工程合計(甲.貳)				√ 110,756,962						
	直接工程費用				√ 527,414,107			8,198,000.00		137,797,081.34	
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)										
一	職業安全衛生,可量化部分	式	1.00	234,187	√ 234,187	0.40	√ 93,674.80	0.05	11,709.35	0.45	105,384.15
二	職業安全衛生,不可量化部分	式	1.00	990,000	√ 990,000	0.40	√ 396,000.00	0.05	49,500.00	0.45	445,500.00
三	環境保護,環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	√ 2,178,677	0.60	√ 1,307,206.20			0.60	1,307,206.20
四	環境保護,環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	√ 500,000	0.40	√ 200,000.00	0.05	25,000.00	0.45	225,000.00
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用,(合計約直接工程費用0.6%)										
一	品質管理,品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	√ 2,650,000	0.40	√ 1,060,000.00	0.05	132,500.00	0.45	1,192,500.00
二	品質管理,材料設備檢試驗費	式	1.00	514,485	√ 514,485	0.60	√ 308,691.00			0.60	308,691.00
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機		1.00	42,193,129	√ 42,193,129		√ 10,367,926.51		655,840.00		11,023,766.51

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止) 第 136 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~壹.二合計之8%)									
	合計(甲.壹~甲.伍)				√576,674,585	√43,332,579.85		9,072,549.35		152,405,129.20
陸	臨時設施, 工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	√50,000	√35,000.00	0.025	1,250.00	0.725	36,250.00
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	√1,441,686	√1,441,686.00			1.00	1,441,686.00
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	√28,833,729	√7,166,628.99		453,627.47		7,620,256.46
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				√607,000,000	√151,975,894.84		9,527,426.82		161,503,321.66
	總價(總計)				√607,000,000	√151,975,895		9,527,427		161,503,322

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止)

第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
一	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ●請款比例：設備0.5+抽排水0.5式，截至1月底已請0.7式 ●本期請款數量0.5/20月=0.025式 	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	<ul style="list-style-type: none"> ●本期請款數量2月 	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	<ul style="list-style-type: none"> ●3F: 733.2+113.39+155.2-447(1月已請)=554.79 M2 4F: 674+233.6-907.6 M2 合計: 554.79+907.6=1462.39 M2 ●截至1月底已請4230 M2 ●本期請款數量5200-4230=970 M2 	970.00	附件1
二	基礎工程					
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	<ul style="list-style-type: none"> ●依樓地板面積4F: 1211.9 M2 ●截至1月底已請10460 M2 ●本期請款數量11670-10460=1210 M2 	1,210.00	附件2
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	<ul style="list-style-type: none"> ●4F:柱412.41+牆2538.32+樓梯44.42=3015.15 M2 ●截至1月底已請21762 M2 ●施工日誌完成數量25123-21762=3361 M2 ●本期請款數量3015 M2 	3,015.00	附件3
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	<ul style="list-style-type: none"> ●材料進出管制表: 1150204累計進料(4F柱牆)1216.39 T ●截至1月底已請1167 T ●本期請款數量1216.39-1167=49.39 T 	49.00	附件4
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	<ul style="list-style-type: none"> ●鋼筋料單:4F柱490個 ●截至1月底已請3923個 ●本期請款數量4413-3923=490個 	490.00	附件5

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 8 次，第 9 期估驗工程款(截至115年02月28日止)

第 2 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
7	結構用混凝土，280kgf/cm ² ，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 2/3三項版373.5+256=629.5 M3 ● 截至1月底已請6071 M3 ● 本期請款數量6699.5-6071=628.5 M7 	628.50	附件6
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 4F:55.64*22.69-12.98-13.2-10.56-6.72=1219.01 M2 ● 截至1月底已請7200 M2 ● 本期請款數量8142-7200=972 M2 	942.00	
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 前期已施作完成金額136,154.6元 第12~21項59,940元 第1.3~9.11項76,214.元 ● 前期未請款金額42,479.8元 OK ● 本期施作完成金額7,235.2元 第1.3~9.11項7,235.2元 <p style="margin-left: 20px;">42479.8 + 7235.2 = 49715.0</p>	0.05	
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期請款金額11,709.35元 ● 本期尚未請款金額38,005.65元 ↓ 	0.05	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額25,000元 ● 本期請款金額25,000元 ● 本期尚未請款金額0元 	0.05	
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 本期施作完成金額132,500元 ● 本期請款金額132,500元 ● 本期尚未請款金額0元 	0.05	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	<ul style="list-style-type: none"> ● 請款比例：設備0.5+剪輯0.5式 ● 本期請款數量0.5/20=0.025式 	0.025	

承包廠商：

監造單位：



工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架	計算式	A	B	= $(A) \times (B)$
	單位	M	M	M ²
1	B1F	177.7	6.8	1208.36
2	1F	226.5	4.6	1041.90
3	2F	233	4	932.00
4	3F	183.3	4	733.20
5	3F女兒牆	66.7	1.7	113.39
6	4F	168.5	4	674.00
7	4F挑空區	58.4	4	233.60
8	5F	168.5	4	674.00
9	5F挑空區	58.4	4	233.60
10	6F	137.6	5.1	701.76
11	6F女兒牆	119.2	1.7	202.64
12	6F挑空區	34.6	5.1	176.46

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架(第二排)	計算式	A	B	= $(A) \times (B)$
	單位	M	M	M ²
1	1F	134.3	4.6	617.78
2	2F	140	4	560.00
3	3F	38.8	4	155.20



層數	原有建物	新建建物A棟 辦公棟	新建建物B棟 國際會議廳	
建築面積		2685.29		
地面層	B1F	2,699.44		
	1F	2,171.49	513.80	
	2F	1,114.34	218.23	
	3F	1,242.91		
	4F	1,211.90		
	5F	1,208.43		
	6F	528.12		
	合計	0.00	10,908.66	




各施工樓層統計表(物件)
各施工樓層*模版*總結果(單位:M2)

工程編號：H241103
工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別:A


樓層	柱	樑	版	牆	樓梯	基礎	額外	扣接頭	小計
R				122.70					122.70
6	224.54	696.98	398.27	2,249.83				-704.48	2,865.14
5	412.41	1,229.31	753.11	2,817.04	44.42			-870.05	4,386.23
4	412.41	1,092.83	765.45	2,558.32	44.42			-843.59	4,029.85
3	420.65	1,147.14	953.44	2,378.36	44.42			-781.76	4,162.26
2	540.54	1,670.66	1,155.60	2,890.32	44.42			-858.23	5,443.32
1	648.16	1,181.63	732.92	3,643.76	48.54			-770.54	5,484.46
B1	849.87	2,681.80	2,056.14	3,125.68	42.02	37.08	-98.31	-1,015.50	7,678.78
F	421.89	4,492.84	864.19				-85.49	-1,892.89	3,800.54
小計	3,930.48	14,193.18	7,679.11	19,786.02	268.26	37.08	-183.80	-7,511.68	37,973.30



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
7月11日	#4	102.84	102.84	
7月11日	#6	11	113.84	
7月11日	#8	12.82	126.66	
7月11日	#10	117.4	244.06	
7月15日	#4	10.14	254.2	
7月15日	#5	1.65	255.85	
7月15日	#8	20.99	276.84	
7月15日	#10	1.42	278.26	
7月18	#4	42.36	320.62	
7月18	#5	8.86	329.48	
7月18	#6	10.74	340.22	
7月18	#10	1.19	341.41	
8月18	#3	3.2	344.61	筏基版
8月18		61.89	406.5	筏基版
8月18	#5	0.6	407.1	筏基版
8月29	#3	10.26	417.36	地下室柱牆
8月29	#4	36.53	453.89	地下室柱牆
8月29	#5	20.66	474.55	地下室柱牆
8月29	#8	20.19	494.74	地下室柱牆
8月29	#10	1.6	496.34	地下室柱牆
9月29	#3	0.73	497.07	地下室頂版梁
9月29	#4	36.52	533.59	地下室頂版梁
9月29	#5	1.28	534.87	地下室頂版梁
9月29	#6	1.12	535.99	地下室頂版梁
9月29	#7	14.88	550.87	地下室頂版梁
9月29	#8	63.4	614.27	地下室頂版梁
10月1	#3	4.6	618.87	地下室頂版版
10月1	#4	59.75	678.62	地下室頂版版
10月13	#3	22.66	701.28	1樓柱牆
10月13	#4	21.81	723.09	1樓柱牆
10月13	#5	5.6	728.69	1樓柱牆
10月13	#8	17.24	745.93	1樓柱牆
10月13	#10	1.31	747.24	1樓柱牆
10月28	#3	1.43	748.67	國際會議廳
10月28	#4	8.59	757.26	國際會議廳
10月28	#8	6.65	763.91	國際會議廳
11月3日	#4	3.27	767.18	車道
11月3日	#5	4.71	771.89	車道
11月3日	#7	0.31	772.2	車道
11月3日	#8	0.8	773	車道
11月3日	#10	2.3	775.3	車道



環保局材料進出管制表				
sd420w				位置
日期	號數	本次進料	累計進料	
011月13	#4	2.98	778.28	補料
11月15	#4	2.89	781.17	補料
11月17日	#3	2.66	783.83	1樓頂版
11月17日	#4	35.41	819.24	1樓頂版
11月17日	#5	1.37	820.61	1樓頂版
11月17日	#6	0.18	820.79	1樓頂版
11月17日	#7	6.37	827.16	1樓頂版
11月17日	#8	30.3	857.46	1樓頂版
11月17日	#10	0.65	858.11	1樓頂版
11月28日	#3	16.41	874.52	2樓柱牆
11月28日	#4	14.12	888.64	2樓柱牆
11月28日	#5	4.33	892.97	2樓柱牆
11月28日	#8	11.48	904.45	2樓柱牆
11月28日	#10	1.16	905.61	2樓柱牆
12月17日	#3	2.46	908.07	2樓頂版
12月17日	#4	48.3	956.37	2樓頂版
12月17日	#5	1.16	957.53	2樓頂版
12月17日	#6	0.13	957.66	2樓頂版
12月17日	#7	7.53	965.19	2樓頂版
12月17日	#8	33.17	998.36	2樓頂版
12月17日	#10	0.1	998.46	2樓頂版
12月29日	#3	15.31	1013.77	3樓柱牆
12月29日	#4	13.61	1027.38	3樓柱牆
12月29日	#5	5.16	1032.54	3樓柱牆
12月29日	#8	8.38	1040.92	3樓柱牆
1月2日	#3	2.05	1042.97	國際會議廳2f頂版
1月2日	#4	20.4	1063.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#7	4	1067.37	國際會議廳2f頂版
1月2日	#8	14.2	1081.57	國際會議廳2f頂版
1月16日	#3	1.97	1083.54	3樓頂版
1月16日	#4	47.37	1130.91	3樓頂版
1月16日	#5	1.1	1132.01	3樓頂版
1月16日	#6	0.12	1132.13	3樓頂版
1月16日	#7	4.83	1136.96	3樓頂版
1月16日	#8	30.66	1167.62	3樓頂版
1月16日	#10	4.57	1172.19	3樓頂版
2月4日	#3	14.51	1186.7	4樓柱牆
2月4日	#4	15.47	1202.17	4樓柱牆
2月4日	#5	6	1208.17	4樓柱牆
2月4日	#8	8.22	1216.39	4樓柱牆



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

辦公大樓4F柱牆料單

統計日期:2026.01.05 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	長度	支數	單位重	小計
柱筋續接	#8	#8公	4.00	#8母	4.20	454	3.98	7589
柱筋續接	#8		4.00	#8母	4.00	18	3.98	287
柱筋續接	#8		3.20	#8母	3.20	18	3.98	229
					合計	490		



盛記預拌混凝土有限公司

預拌混凝土送貨單

附件6

B151-3

客戶名稱：久木營造-環保局

契約編號：

出貨單號：SH15020020

工程名稱：

地址：雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話：05-5571542 傳真：05-5574439

竟置地點：虎尾環保局(高鐵前)

日期：115/02/03

出廠時間：15:00 到達時間：

卸完時間：

車次：43

車號	975-N5	林章宏	總重	14,700 kg	水泥型式	
規 格	28日強度	280kg/cm ² kgf/cm ²	空重	12,390 kg	爐石型式	
	設計坍度	18 cm	淨重	2,310 kg	飛灰型式	
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.00 %	附加劑型式	
	設計坍流度	cm	交貨數量	1.0 m ³	累計數量	373.5 m ³

倉米泥機共計 374.5米

備註	1. 在施工现场加水而影響品質，賣方概不負責。 2. 材料計量許可差依CNS3090規定。 3. 本配比得視早期強度及原料變異機動調整。	調度員	林春足	工地簽收	
----	--	-----	-----	------	--

瑞育預拌混凝土股份有限公司 斗六廠			
工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司 施工地點：	日期：115/02/03	編號：SH15020022 下料序號：	
車號	KLP-8262	強度	280 Kg/cm ²
車次	第 29 車	設計坍度	18 CM
數量	9.0 M ³	最大骨材	19 MM
累計數量	256.0 M ³		
總重	33,430 Kg		
加工重	12,660 Kg		
淨重	20,770 Kg		
施工地點	虎尾高鐵學府一路-3F頂板 0923-383-819陳主任		
出車時間	12:50	到達時間	卸料時間
調度員	DL林佳怡	工地簽收	
備註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責 地址：雲林縣斗六市石榴路369巷101號 電話：05-5576664		

第二聯：請款聯

公共工程監造報表

表報編號：雲A01_1150228

本日天氣：上午：晴☀ 下午：晴☀

填報日期：115年02月28日(星期六)

工程名稱								雲林縣環保局辦公廳舍新建工程							
契約工期		600天		開工日期		114年06月17日		預定完工日期		116年02月16日		實際完工日期			
契約變更次數				1次		工期展延天數				10.0天		契約金額		原契約： 607,000,000元	
預定進度(%)		22.0050%		實際進度(%)		26.6280%								變更後契約： 607,000,000元	
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):															
平頂批土施作_B1F 泥作放樣(貼條)_2F 模板封模組立_4F_牆 模板整理工程_3F_頂板 環境整理_全區 樓層接縫打石工程															
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):															
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):															
四、督導工地職業安全衛生事項:															
(一)施工前檢查事項辦理情形: <input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成															
(二)其他工地安全衛生督導事項:															
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):															
監造單位簽章:															
															

註：

1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

建築物施工日誌

表報編號： 257

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/2/28

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0		天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16	累計工期	257	日曆天			
預定進度(%)	22.005%	實際進度(%)	26.628%	本日實際進度(%)	0.080%	剩餘工期	353		天
		實際進度(%)		本日實際進度(%)		展延工期	10		天
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
甲	發包工程費								
壹	建築工程								
一	假設及拆除工程								
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)			式	1.00		0.50		
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬			M	300.00		150.00		
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬			M	525.00		525.00		
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)			檯	2.00	-	2.00		
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)			檯	1.00	-	1.00		
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆			座	1.00		1.00		
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池			式	1.00		1.00		
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)			式	1.00		1.00		
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 二層建築), 長16.5m, (跨度, 3k, 5.4-5.64m), 含水電空調等			棟	1.00		1.00		
11	工地臨時建築設施, 辦公設備, 租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)			式	1.00		1.00		
12	工地臨時建築設施, 臨時廁所			組	1.00		1.00		
13	臨時設施, 工程用電設備、用水、資通訊設備, 含申請及設備架設			式	1.00		1.00		
14	臨時設施, 臨時水、電、電信通訊費			月	20.00		9.00		
15	施工輔助設施, 施工架及防護網, 鋼管, 裝拆(含租金), 扶手先行, 含上下設備及其他所需配件, pc鋪底, 圓盤系統施工架			M2	8,671.00		5,200.00		
16	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(結構挑高區室內架)			M2	3,822.00		750.00		
18	施工輔助設施, 支撐排架, 鋼管, 裝拆(含租金)			M3	8,361.00		3,500.00		
20	動土典禮及完工啟用典禮			式	1.00		0.50		
21	工地清理, 營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件			m2	10,528.00		2,600.00		
二	基礎工程								
1	施工測量, 工地放樣			M2	19,980.00		11,670.00		
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存			M3	17,789.90		17,789.90		
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度			M3	4,874.90		4,800.00		
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置			M3	12,915.00		12,915.00		
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm ² , t=5cm			M2	1,435.00		1,435.00		
6	安全觀測系統			式	1.00		1.00		
7	祛水, 點井, 深度<6m			支	48.00		48.00		
8	擋土設施, 鋼板樁 L=9M			M	235.60		235.00		
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15*20 L=13M			支	295.00		295.00		
三	建築結構體工程								
1	普通模板, (建築, 建築物)			M2	31,257.00	300.00	25,123.00		
2	清水模板, (建築, 建築物)			M2	6,717.00		4,350.00		
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料			T	1,411.00		1,216.00		
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級			個	4,729.00		4,413.00		
6	結構用混凝土, 140kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實			M3	295.00	-	295.00		
7	結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實			M3	8,451.00		6,699.50		
10	混凝土表面處理, 地坪整體粉光處理			M2	10,528.00		8,142.00		
四	鋼構工程								
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24			支	224.00		148.00		
9	剪力釘 \$22mm L=125mm			支	504.00		204.00		

建築物施工日誌

表報編號： 257

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/2/28

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0		天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	257	日曆天	剩餘工期		353
預定進度(%)	22.005%	實際進度(%)	26.628%	本日實際進度(%)	0.080%	展延工期	10		天
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
六	門窗工程								
17	鋼門扇及門檯，推射式，防火門，60A，D06-F，W100*H220			檯	6.00		0.90		
19	鋼門扇及門檯，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220			檯	16.00		2.40		
21	鋼門扇及門檯，推射式，防火門，60A，D10F，W100*H220			檯	14.00		2.10		
23	鋼門扇及門檯，推射式，防火門，60A，雙開，D13-F，W180*H220			檯	8.00		2.40		
24	鋼門扇及門檯，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220			檯	12.00		1.80		
八	地坪裝修工程								
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)			M2	658.00		460.00		
九	牆面裝修工程								
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)			M2	12,374.00	30.00	2,040.00		
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)			M2	1,281.00	20.00	20.00		
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)			M2	1,533.00		450.00		
十	坪頂裝修工程								
2	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層批土磨平(C2)			M2	6,110.00	20.00	120.00		
十一	防水工程								
1	塗液類防潮，地下室外牆防水，含回填保護(含筏基外牆)，(WP1)			M2	1,390.00		1,390.00		
2	塗液類防潮，筏基水池防水防水(五面施工)及地下室外牆內牆防水，(WP2)			M2	2,875.00		2,875.00		
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)			M2	2,740.00		2,740.00		
貳	機電工程								
一	電氣工程								
3	照明插座動力工程								
k	接地銅棒3m × φ19(3/4")mm			只	5.00		5.00		
l	裸銅線 100 mm ²			米	78.00		78.00		
二	弱電工程								
1	電信工程								
z	接地工程接地電阻值小於10歐姆(內設接地端子)及接地銅棒3m × φ19(3/4")mm及裸銅線 60 mm ² 等工程完成所需材料			式	1.00		1.00		
11	避雷接地工程								
d	接地銅棒3m × φ19(3/4")mm			只	7.00		7.00		
e	裸銅線 100 mm ²			米	23.00		23.00		
三	給排水設備工程								
2	排水工程								
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mmφ(4")×6.6mm			米	141.00		141.00		
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通管 配管另件另料			式	1.00		1.00		
一	職業安全衛生，可量化部分			式	1.00		0.45		
二	職業安全衛生，不可量化部分			式	1.00		0.45		
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)			式	1.00		0.60		
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)			式	1.00		0.45		
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)			式	1.00		0.45		
二	品質管理，材料設備檢試驗費			式	1.00		0.60		
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申				1.00	0.080%	26.628%		

建築物施工日誌

表報編號： 257

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/2/28

(星期六)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人	久木營造有限公司			
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號				不計工期	0	天		
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月16日	累計工期	257	日曆天	剩餘工期	353	天
預定進度(%)	22.005%	實際進度(%)	26.628%	本日實際進度(%)	0.080%	展延工期	10	天	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
	請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用),(壹.一~壹.二合計之8%)					
陸	臨時設施,工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00		1.00	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00		100.000%	
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	0.080%	26.628%	
營造業專業工程特定施工項目						

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋,SD420W,連工帶料	T	1,411.0		1,216.0	
鋼筋,鋼筋續接器,D25mm(#8),連工帶料,柱	組	4,729.0		4,413.0	
建築用混凝土,140kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土,280kgf/cm ² ,含澆置及搗實	M3	8,451.0		6,699.5	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組工	4	669	施工架工		268	挖(鏟)土機		69
鐵工		17	泥作工	2	523	混凝土運輸車		705
水電工		383	油漆工	6	56	混凝土泵輪車		21
續接工		15	技術工		292	移動式全吊車		27
鋼筋工		1334	門窗工		11	吊卡車		9
模板工	21	2308				拖車		1
混凝土工		194				搬運車		34

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

有 無 (此項如勾選“有”,則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：有 無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：有 無 無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：有 無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(註4)：地下室平頂批土、2樓泥作貼邊條、4樓牆模板封模組立、三樓頂版模板整理、環境整理、樓層接縫打石

簽章：【工地主任】(註5)：





註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2.本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。

3.施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

4.重要事項紀錄包含：(1)起造人及監造人指示。(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3)本圖是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

5.本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。



營造工程物價指數 (總指數) 銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97	111.83	112.15	112.09	112.43	112.66	112.82	112.27
115	113.81	114.67											114.24

註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1


115.02.02-辦公室3F頂版澆置前樓版清洗



相片說明

2

115.02.03-辦公室3F頂版混凝土澆置



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

3


115.02.03-辦公室3F頂版混凝土試體取樣



相片說明

4


115.02.03-辦公室3F頂版整體粉光施作



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

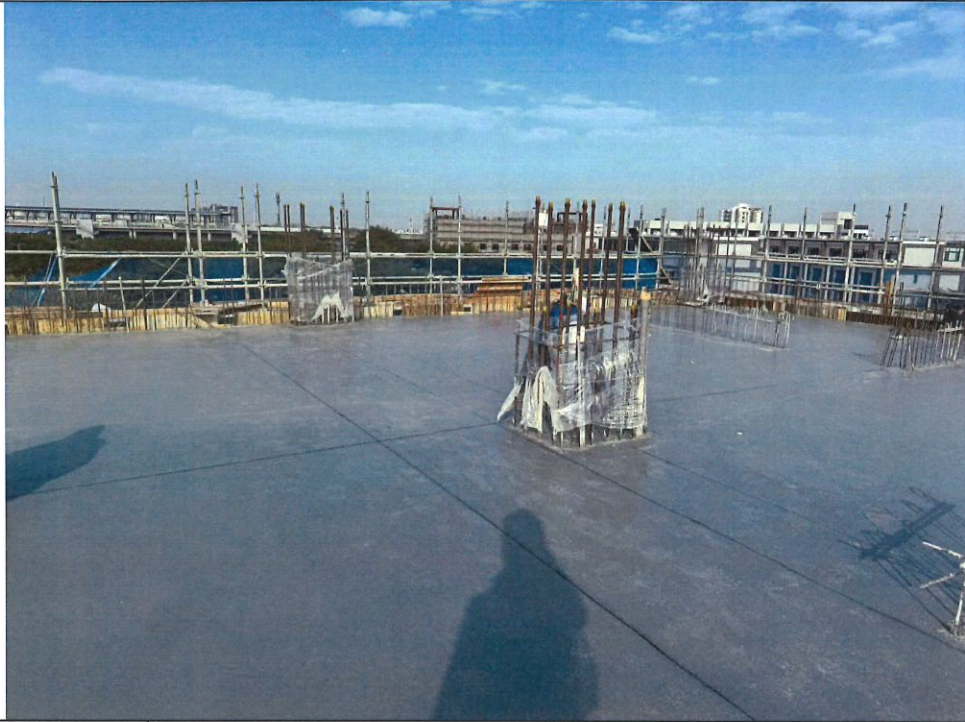

相片說明

115.02.04-辦公室3F頂版澆置完成

5



相片說明

115.02.04-辦公室4F柱牆鋼筋進場取樣

6



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

115.02.06-辦公室4F放樣查驗


7



相片說明


115.02.06-辦公室4F柱扭力值查驗

8



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程
 承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

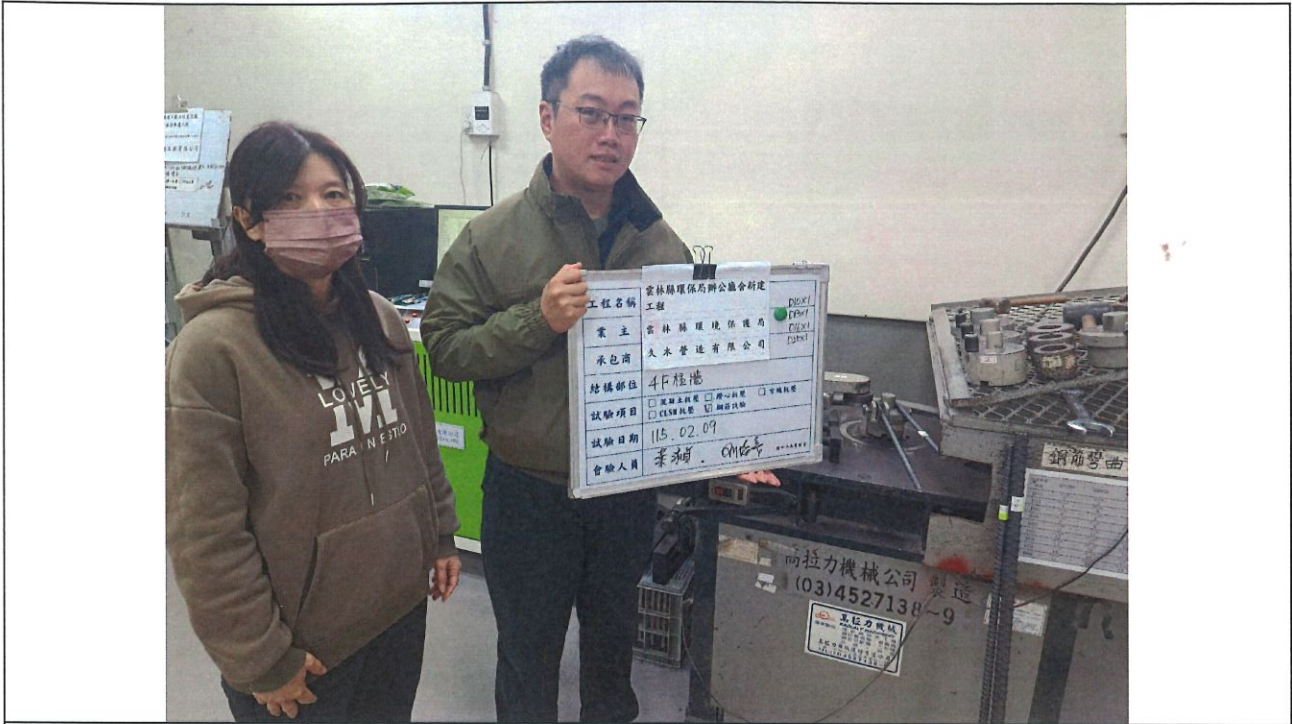

相片說明

115.02.09-辦公室4F柱牆鋼筋試驗

9



相片說明

115.02.23-國際會議廳2F頂版混凝土抗壓試驗37天


10



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調

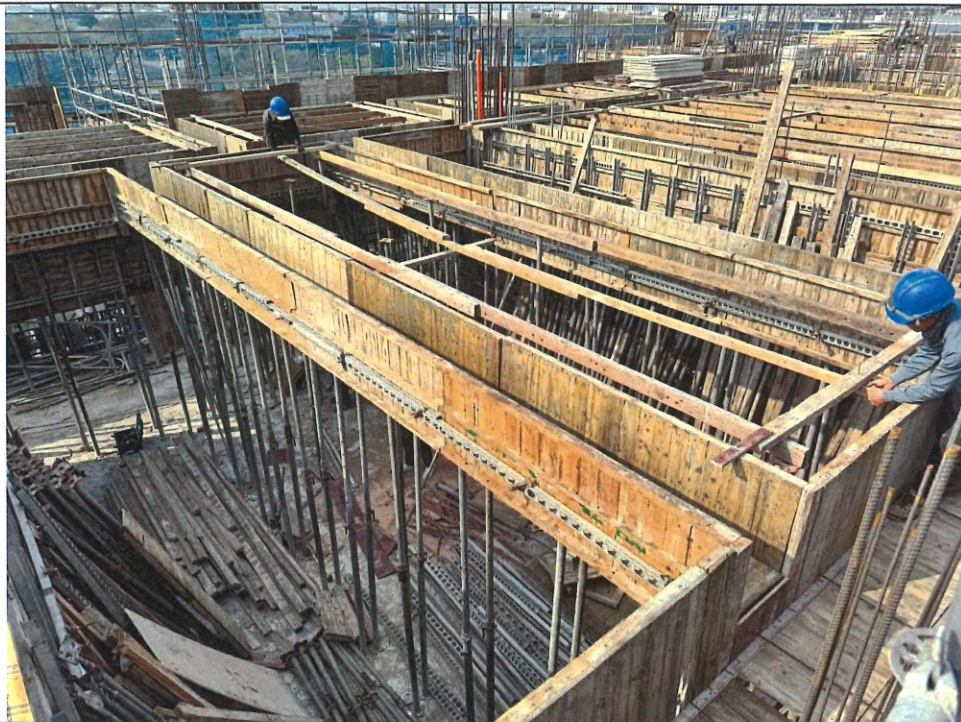

相片說明

11

115.02.28-辦公室4F柱牆模板組立完成



相片說明

12

115.02.28-外牆4F施工架搭設

