

雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 1 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
—	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池	式	1.00	●請款比例：設備0.5+抽排水0.5 式，截至4月底已請0.775 式 ●本期請款數量0.5/20月=0.025 式	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	本期請款數量5月	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	●外鷹架：7271.16+1399.63=8671 M2， 8671*0.9=7803.9 M2 ●截至4月底已請6200 M2 ●本期請款數量7700-6200=1500 M2	1,500.00	附件1
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	●挑高區2947+電梯875=3822 M2， 3822*0.9=3439.8 M2 ●截至4月底已請1500 M2 ●本期請款數量2050-1550=550 M2	550.00	附件2
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	●挑高區2947*0.9=2652.3 M2 ●截至4月底已請500 M2 ●本期請款數量1000-500=500 M2	500.00	附件3
21	工地清理，營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	\$10,528.00	●10528*0.5=5264 M2 ●本期請款數量3100 M2	3,100.00	附件4
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	●6F：柱224.54+樑695.98+牆2249.83=3171.35 M2 ●截至4月底已請29763 M2 ●本期請款數量31203-29763=1440 M2	1,440.00	附件5
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	●B1~6F頂版2056.14+732.92+1155.6+953.44+765.45+753.11+398.27=6814.93 M2 ●截至4月底已請6120 M2 ●本期請款數量6717-6120=597 M2	597.00	附件5
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	●5/28：6F頂版359 M3 ●截至4月底已請7924 M3 ●本期請款數量359 M3	359.00	附件6
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	●RF：56*12.7-54.16-11.07-13.5-19.09-26.39=586.99 M2 ●截至4月底已請942 M2	586.00	

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 2 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
八	地坪裝修工程			●本期請款數量105.28-9942=586 M2		
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	●B1~6F頂版完成:377.82+143.80+30.52+30.52+35.86+8.97=658.02 M2 ●截至4月底已請649 M2 ●本期請款數量658.02-649=9 M2	9.00	附件7
九	牆面裝修工程					
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	●請款比例:油漆30%+粉光25%+打底45% ●B1F→粉光油漆完成→2374.71 M3 1F→粉光+油漆65%→2079.18*0.65=1351.47 M2 2F→粉光+油漆完成65%→1882*0.65=1223.3 M2 3F→粉光+油漆65%→1599.35*0.65=1039.58 M2 4F→粉光完成65%→1612.82*0.7*0.65=733.83 M2 合計:2374.71+1351.47+1223.3+1039.58+733.83=6722.89 M2 ●截至4月底已請5155 M2 ●本期請款數量6310-5155=1155 M2	1,155.00	附件7
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	●請款比例:壁磚65%+打底35% ●1F~3F打底完成→(494.67+180.73+147.95)*0.35=288.17 M2 ●本期請款數量270 M2	270.00	附件7
十	坪頂裝修工程					
1	暗架金屬網天花，含水泥砂漿打底，面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	●請款比例:金屬網55%+粉光/油漆35% ●1~3F→粉光油漆完成 216.13+150.76+184.46=553.35 M2 86.41+50.2+52.96=189.57 M2 174.25+119.65+127.24=421.14 M2 合計:553.35+189.57+421.14=1164.06 M2 ●本期請款數量1164.06*0.35=407 M2	400.00	附件7
十一	防水工程					

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 3 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
6	塗液類防潮，外牆樓層接縫防水，W=30cm，(WP6)	M	930.00	●2~5F完成：247.32+109.46+137.04+156.77=650.59 M ●截至4月底已請356 M ●本期請款數量651-356=295 M	295.00	附件7
7	塗液類防潮，窗框接縫及窗台防水，W=30cm(WP7)	M	2,122.00	●B1~4F完成：13.20+262.25+246.55+374.35+494.55=1390.9 M ●截至4月底已請300 M ●本期請款數量1390.300=1090 M	1,090.00	附件7
9	塗液類防潮，浴廁地壁防水，(WP9).	M2	782.00	●1~3F完成：244.92+121.86+98.16=464.94 M2 ●本期請款數量390 M2	390.00	附件7
—	電氣工程					
3	照明插座動力工程					
m	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 2.0 mm	米	12,512.00	●B1~2F完成→1787.42*3=5362.26 米 ●本期請款數量500 米	5,000.00	附件8
n	PVC 絕緣銅導線 600V，1/C 5.5 mm2	米	24,836.00	●B1~2F完成→3548.00*3=10644 米 ●本期請款數量1600 米	8,000.00	附件8
37	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，16mmΦ(1/2")x1.8mmt	米	11,621.00	●B1~4F完成→1660.14*5=8300.7 米 ●截至4月底已請8000 米 ●本期請款數量8300-8000=300 米	300.00	附件8
38	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，20mmΦ(3/4")x1.8mmt	米	110.00	●B1~4F完成→15.71*5=78.55 米 ●本期請款數量80 米	80.00	附件8
39	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，28mmΦ(1")x2.7mmt	米	442.00	●B1~4F完成→63.14*5=315.7 米 ●本期請款數量315 米	315.00	附件8
40	PVC 導線管(CNS1302 K3006)，35mmΦ(1-1/4")x3.1mmt	米	266.00	●B1~4F完成→38.01*5=190 米 ●本期請款數量190 米	190.00	附件8
47	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●截至4月底已請0.5 式 ●本期請款數量0.7-0.5=0.2 式	0.20	附件8
二	弱電工程					

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 4 頁 共 7 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
1	電信工程					
32	PVC 導線管(CNS1302 K3006)					
3	Φ52mm(2")×3.6mmt	米	126.00	●B1~4F完成→18.00*5=90 米 ●本期請款數量90 米	90.00	附件8
4	Φ80mm(3")×5.1mmt	米	288.00	●B1~4F完成→41.14*5=205.7 米 ●本期請款數量205 米	205.00	附件8
33	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●截至4月底已請0.5 式 ●本期請款數量0.7-0.5=0.2 式	0.20	附件8
3	通訊工程					
1	PVC 導線管(CNS1302 K3006)					
1	Φ20mm(3/4")×1.8mmt	米	270.00	●B1~4F完成→38.57*5=192.85 米 ●本期請款數量195 米	195.00	附件8
6	緊急求救工程					
1	0.5mm×4P		1,660.00	●B1~4F完成→237.14*5=1185.7 米 ●本期請款數量500 米	500.00	附件8
三	給排水設備工程					
1	給水衛生設備工程					
39	給水PVC管(CNS4053)16mmΦ(1/2")×2.7mm	米	594.00	●B1~4F完成→84.86*5=424.3 米 ●本期請款數量425 米	425.00	附件8
40	給水PVC管(CNS4053)20mmΦ(3/4")×3.1mm	米	194.00	●B1~4F完成→27.71*5=138.55 米 ●本期請款數量140 米	140.00	附件8
41	給水PVC管(CNS4053)25mmΦ(1")×3.1mm	米	176.00	●B1~4F完成→25.14*5=125.7 米 ●本期請款數量100 米	100.00	附件8
44	給水PVC管(CNS4053)50mmΦ(2")×4.1mm	米	172.00	●B1~4F完成→24.57*5=122.85 米 ●本期請款數量100 米	100.00	附件8
45	給水PVC管(CNS4053)65mmΦ(2-1/2")×	米	236.00	●B1~4F完成→33.71*5=168.55 米	150.00	附件8

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 5 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
	4.1mm			●本期請款數量150 米		
2	排水工程					
28	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 50mm Φ (2")×4.1mm	米	885.00	●B1~4F完成→126.43*5=632.15 米 ●本期請款數量400 米	400.00	附件8
29	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 80mm Φ (3")×5.1mm	米	765.00	●B1~4F完成→109.29*5=546.45 米 ●本期請款數量300 米	300.00	附件8
30	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 100mm Φ (4")×6.6mm	米	40.00	●B1~4F完成→5.71*5=28.55 米 ●本期請款數量20 米	20.00	附件8
31	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 150mm Φ (6")×8.5mm	米	144.00	●B1~4F完成→20.57*5=102.85 米 ●本期請款數量100 米	100.00	附件8
32	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 生活廢水雨水PVC管 配管另件另料	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
37	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 下水道污水專用橘紅色PVC管 配管另件另料	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
38	透氣PVC管(CNS1298 A管), 50mm Φ (2")×1.8mm	米	479.00	●B1~4F完成→68.43*5=342.15 米 ●本期請款數量300 米	300.00	附件8
39	透氣PVC管(CNS1298 A管), 透氣PVC管 配管另件另料	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
40	另件另料雜項工料費(含管路吊架, 角鐵, 螺絲, 五金, 油漆, 標示, 預留套管, 打鑿修補, 鐵絲, 尼龍線, 防火阻隔, 填縫劑, 止水帶及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
四	消防工程					
1	消防火警警報設備工程					
h	信號線, 1.25mm×1P 遮蔽對絞	米	2,369.00	●B1~4F完成→338.43*5=1692.15 米 ●本期請款數量1000 米	1,000.00	附件8

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表


估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 6 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
j	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	4,738.00	●B1~4F完成→676.86*5=3384.3 米 ●截至4月底已請1000 米 ●本期請款數量2000-1000=1000 米	1,000.00	附件8
m	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準), 1/C 2.0mm	米	2,369.00	●B1~5F完成→338.43*5=1692.15 米 ●截至4月底已請500 米 ●本期請款數量1000-500=500 米	500.00	附件8
p	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
q	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,尼龍線,防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
r	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	●B1~4F完成→0.14*5=0.72 式 ●本期請款數量0.5 式	0.50	附件8
2	消防緊急廣播工程					
c	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	9,465.00	●B1~4F完成→1352.14*5=6760.7 米 ●截至4月底已請2000 米 ●本期請款數量4000-2000=2000 米	2,000.00	附件8
3	消防緊急避難逃生工程					
g	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 1.6 mm	米	4,136.00	●B1~4F完成→590.86*5=2954.3 米 ●截至4月底已請1000 米 ●本期請款數量2000-1000=1000 米	1,000.00	附件8
—	職業安全衛生, 可量化部分	式	1.00	●前期已施作完成金額157,860.2元 第12~21項59,940 元 第1.3~9.11項97,920.2 元 ●前期未請款金額29,057.35 元 ●本期施作完成金額7235.2 元 林姓前期資料	0.05	

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 11 次，第 12 期估驗工程款(截至115年05月31日止)

第 7 頁 共 7 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計 算 式	請款數量	備 註
				第1.3~9.11項7235.2元 ●本期請款金額11,709.35元 ●本期尚未請款金額24,583.2元 $36292.55 - 11709.35$		
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	●本期施作完成金額49,500元 ●本期請款金額49,500元 ●本期尚未請款金額0元	0.05	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	●本期施作完成金額25,000元 ●本期請款金額25,000元 ●本期尚未請款金額0元	0.05	
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	●本期施作完成金額132,500元 ●本期請款金額132,500元 ●本期尚未請款金額0元	0.05	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	●請款比例：設備0.5+剪輯0.5式，截至4月底已請0.775式 ●本期請款數量0.5/20=0.025式	0.025	

承包廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局
115年5月份計算式

項次	項目及說明	單位	契約數量	已請數量	1F	2F	3F	4F	合計	請款數量	備註
3	鋁窗，固定+推射式，WD01，W70*H240	檯	32				2		2		2*0.7=1.4
	鋁百葉，WD01-1，W85*H240	檯	0	2.8						4.9	
4	鋁窗，固定+推射式，WD01-E，W70*H240	檯	0				3	2	5		5*0.7=3.5
	鋁窗，固定+推射式，電動排煙，WD01-F，W70*H240	檯	10								
	鋁窗，固定+推射式，電動排煙，WD01F-E，W70*H240	檯	0	1.4			1	5	6	4.2	6*0.7=4.2
5	鋁窗，固定+推射+橫拉式，WD03，W140*H240	檯	148				6	5	11		11*0.7=7.7
	鋁窗，固定+推射+橫拉式，WD03-E，W140*H240	檯	0	14.7			19	25	44	38.5	44*0.7=30.8
6	鋁窗，固定+推射+橫拉式，電動排煙，WD03-F，W140*H240	檯	54								
	鋁窗，固定+推射+橫拉式，電動排煙，WD03F-E，W140*H240	檯	0	0			8	21	29	20.3	29*0.7=20.3
10	鋁窗，防火檢修門，60A，WD12，W50*H80	檯	5	0	1	1	1	1	4	1.2	4*0.3=1.2
19	鋁門扇及門窗，推射式，防火門，60A，D08-F，W120*H220	檯	16	3.3				2	2	0.6	2*0.3=0.6
	鋁門扇及門窗，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F，W200*H220	檯	12					1	1		1*0.3=0.3
24	鋁門扇及門窗，推射式，防火門，60A，雙開，D14-F-1，W180*H220	檯	13	2.7						0.3	
27	鋁門扇及門窗，推射式，鋁框玻璃門，GD1，W120*H220	檯	19	0	1				1	0.3	1*0.3=0.3
30	鋁門扇及門窗，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD03，W150*H220	檯	2	0	2				2	0.6	2*0.3=0.6

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局
115年5月份計算式

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約 數量	已請 數量	1F	2F	3F	4F	合計	請款數量	備註
32	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，雙開，GD05， W200*H240	樘	1	0	1				1	0.3	1*0.3=0.3
34	鋁門扇及門樘，推射式，鋁框玻璃門，GD08，W100*H220	樘	21	0	3	3			6	1.8	6*0.3=1.8

- ★防火門：本期請4F門框安裝完成30%
 ★鋁窗：本期請3-4F窗框安裝完成70%
 ★鋁框玻璃門：本期請1-2F門框安裝完成30%

承包廠商：



監造單位：



工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架	計算式	A	B	$=(A)*(B)$
	單位	M	M	M2
1	B1F	186.585	6.8	1268.78
2	1F	237.825	4.6	1094.00
3	2F	244.65	4	978.60
4	3F	192.465	4	769.86
5	3F女兒牆	70.035	1.7	119.06
6	4F	176.925	4	707.70
7	4F挑空區	61.32	4	245.28
8	5F	176.925	4	707.70
9	5F挑空區	61.32	4	245.28
10	6F	144.48	5.1	736.85
11	6F女兒牆	125.16	1.7	212.77
12	6F挑空區	36.33	5.1	185.28
總和				7271.16

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架 (第二排)	計算式	A	B	$=(A)*(B)$
	單位	M	M	M2
1	1F	141.015	4.6	648.67
2	2F	147	4	588.00
3	3F	40.74	4	162.96
總和				1399.63




工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號(B3~2F)	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	內架周長	樓高	鋼管鷹架
室內鷹架 (挑高區)	計算式	A	B	$= (A) * (B)$
	單位	M	M	M2
1	B1F	49.5	3.4	168.30
2	1F	281.4	8.5	2391.90
3	2F	56.9	6.8	386.92
總和				2947


工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	外架周長	樓高	鋼管鷹架
外鷹架(電梯)	計算式	A	B	$= (A) * (B)$
	單位	M	M	M2
1	B1F	29.15	5.4	157.41
2	1F	29.15	4.6	134.09
3	2F	29.15	4	116.60
4	3F	29.15	4	116.60
5	4F	29.15	4	116.60
6	5F	29.15	4	116.60
7	6F	29.15	4	116.60
總和				875



工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

編號(B3~2F)	項次	(A)	(B)	(1)
	工項名稱	內架周長	樓高	鋼管鷹架
室內鷹架 (挑高區)	計算式	A	B	$=(A)*(B)$
	單位	M	M	M2
1	B1F	49.5	3.4	168.30
2	1F	281.4	8.5	2391.90
3	2F	56.9	6.8	386.92
總和				2947



事業廢棄物再利用管制遞送三聯單


事業編號		P48A941711500002		4100 建築工程業				
再利用方式		送交其它機構再利用(含子廠)		廢棄物再利用類別				
事業		清除者		公告再利用				
P48A9417久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		N09A0887凌源環保工程行		M36A1106勝輝土資工程有限公司				
雲林縣虎尾鎮大學段一六〇地號		彰化縣和美鎮竹營里忠全路二一九號一樓		(557)南投縣竹山鎮延正里二鄰江西路三八之一二號				
事業機構申報內容		清除機構申報內容		再利用者機構申報內容				
廢棄物清除出廠之實際清運日期		1150205		實際清運日期				
廢棄物清除出廠之實際清運時間		9:00		115年2月5日				
廢棄物清除出廠之實際清除機具車(船)號		KED-5659		實際收受日期				
是否為資源循環網絡流向： ☐ 是， ☒ 否		是否轉運(或更換頭車)： ☐ 是， ☒ 否		實際收受日期				
序號		廢棄物清除出廠之實際廢棄物重量(公噸)		實際收受日期				
廢棄物代碼		是否過磅： ☐ 是， ☒ 否		115年2月5日				
1		R-0503		實際收受時間				
廢棄物總重量(公噸)		8		11時29分(24小時制)				
		8		清除者至處理廠實際清運機具車(船)號				
				KED 5659				
				實際清運廢棄物重量(公噸)				
				是否過磅： ☐ 是， ☒ 否				
				9.48				
廢棄物描述								
序號	製造程序	廢棄物代碼	物種	物理性質	有害特性	有害成分	清理方式	顏色
1	建築工程(建物)作業程序	營建混合物	營建混合物	固狀	無有害特性	無有害成分	將廢棄物作為再利用之工程填料	雜色
	410001	R-0503	0516	S	-	-	R07	
事業P48A9417 久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		承辦人	清除者N09A0887 凌源環保工程行	承辦人	再利用者 M36A1106 勝輝土資工程有限公司	承辦人		
(蓋章)		(簽章)	(蓋章)	(簽章)	(蓋章)	(簽章)		

備註：事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於遞送三聯單書

- 寫過磅重量及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。
- 廢棄物中報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報，建議列印聯單時使用雷射印表機，若使用噴墨印表機列印，應慎防聯單條碼遇水暈染，導致條碼讀取器無法正確讀取條碼，請避免使用點矩陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。
- 用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

事業廢棄物再利用管制遞送三聯單

關閉視窗

聯單編號		P48A941711500001		4100 建築工程業				
再利用方式		送交其它機構再利用(含子廠)		廢棄物再利用類別				
事業		清除者		公告再利用				
								
P48A9417久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		N09A0887凌源環保工程行		M36A1106勝輝土資工程有限公司				
雲林縣虎尾鎮大學段一六〇地號		彰化縣和美鎮竹營里忠全路二一九號一樓		(557)南投縣竹山鎮延正里二鄰江西路三八之一二號				
事業機構申報內容		清除機構申報內容		再利用者機構申報內容				
廢棄物清除出廠之實際清運日期		1150204	實際清運日期	115年2月4日	實際收受日期			
廢棄物清除出廠之實際清運時間		14:00	實際清運時間	14時00分(24小時制)	實際收受時間			
廢棄物清除出廠之實際清除機具車(船)號		KED-5659	實際清運機具車(船)號	KED5659	清除者至處理廠實際清運機具車(船)號			
是否為資源循環網絡流向： ☐ 是， ☒ 否		是否轉運(或更換頭車)： ☐ 是， ☒ 否		實際收受廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否				
序號	廢棄物代碼	廢棄物清除出廠之實際廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否	轉運(或更換頭車)時間 轉運(或更換頭車)之車(船)號 實際清運廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否	8.19				
1	R-0503	6	6					
廢棄物總重量(公噸)								
廢棄物描述								
序號	製造程序	廢棄物代碼	物種	物理性質	有害特性	有害成分	清理方式	顏色
1	建築工程(建物)作業程序	營建混合物	營建混合物	固狀	無有害特性	無有害成分	將廢棄物作為再利用之工程填料	雜色
	410001	R-0503	0516	S	-	-	R07	
事業P48A9417 久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		承辦人	清除者N09A0887 凌源環保工程行		承辦人	再利用者 M36A1106 勝輝土資工程有限公司		承辦人
(蓋章)		(簽章)	(蓋章)		(簽章)	(蓋章)		(簽章)
								

備註：事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，應於三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。

1.寫過磅重量及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。

2.廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報，建議列印聯單時使用印表機，若使用噴墨印表機列印，應慎防聯單條碼遇水暈染，導致條碼讀取器無法正確讀取條碼，請避免使用點矩陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。

3.用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得利用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

事業廢棄物再利用管制遞送三聯單

×關閉視窗

聯單編號		P48A941711500005		4100 建築工程業				
再利用方式		送交其它機構再利用(含子廠)		廢棄物再利用類別				
事業		清除者		再利用者				
P48A9417久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		N09A0887浚源環保工程行		M36A1106勝輝土資工程有限公司				
雲林縣虎尾鎮大學段一六〇地號		彰化縣和美鎮竹營里忠全路二一九號一樓		(557)南投縣竹山鎮延正里二鄰江西路三八之一二號				
事業機構申報內容		清除機構申報內容		再利用者機構申報內容				
廢棄物清除出廠之實際清運日期		1150511	實際清運日期	115年5月11日	實際收受日期			
廢棄物清除出廠之實際清運時間		12:00	實際清運時間	12時00分(24小時制)	實際收受時間			
廢棄物清除出廠之實際清除機具車(船)號		KED-5659	實際清運機具車(船)號	KED 5659	清除者至處理廠實際清運機具車(船)號			
是否為資源循環網絡流向： ☐ 是， ☒ 否		是否轉運(或更換頭車)： ☐ 是， ☒ 否		實際收受廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否				
序號	廢棄物代碼	廢棄物清除出廠之實際廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否	轉運(或更換頭車)時間 轉運(或更換頭車)之車(船)號	實際清運廢棄物重量(公噸) 是否過磅： ☐ 是， ☒ 否				
1	R-0503	8		10.61				
廢棄物總重量(公噸)		8						
廢棄物描述								
序號	製造程序	廢棄物代碼	物種	物理性質	有害特性	有害成分	清理方式	顏色
1	建築工程(建物)作業程序	營建混合物	營建混合物	固狀	無有害特性	無有害成分	將廢棄物作為再利用之工程填料	雜色
	410001	R-0503	0516	S	-	-	R07	
事業P48A9417 久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程-建築		承辦人	清除者N09A0887 浚源環保工程行		承辦人	再利用者 M36A1106 勝輝土資工程有限公司		承辦人
(蓋章)		(簽章)	(蓋章)		(簽章)	(蓋章)		(簽章)
								張秋煌

備註：事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。

1.寫過磅重量及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。

2.廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報，建議列印聯單時使用雷射印表機，若使用噴墨印表機列印，應慎防聯單條碼過水暈染，導致條碼讀取器無法正確讀取條碼。請避免使用點矩陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。

3.用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

事業廢棄物再利用管制遞送三聯單

P48A941711500004

4100 建築工程業

送交其它機構再利用(含子廠)

廢棄物再利用類別

公告再利用

事業

清除者

再利用者

P48A9417久木營造有限公司-雲林縣環保局辦公
廳舍新建工程-建築

N09A0887浚源環保工程行

M36A1106勝輝土資工程有限公司

雲林縣虎尾鎮大學段一六〇地號

彰化縣和美鎮竹營里忠全路二一九號一樓

(557)南投縣竹山鎮延正里二鄰江西路三八
一二號

事業機構申報內容

清除機構申報內容

再利用者機構申報內容

廢棄物清除出廠之實際清運日期 1150508

實際清運日期 115年5月8日

實際收受日期 115年5月8日

廢棄物清除出廠之實際清運時間 14:00

實際清運時間 14時00分(24小時制)

實際收受時間 14時00分(24小時制)

廢棄物清除出廠之實際清除機具車(船)號 KED-5659

實際清運機具車(船)號 KED 5659

清除者至處理廠實際清運機具車(船)號 KED 565

是否為資源循環網絡流向：
是 ☒ 否

是否轉運(或更換頭車)：☐ 是，☒ 否

序
號

廢棄物代碼

廢棄物清除出
廠之實際廢棄
物重量(公噸)
是否過磅：
☐ 是，☒ 否

轉運(或更換頭車)時
間 年 月 日
時 分

轉運(或更換頭車)之
車(船)號

實際清運廢棄物重量(公噸)
是否過磅：☐ 是，☒ 否

實際收受廢棄物重量(公噸)

是否過磅：☐ 是，☒ 否

1 R-0503

廢棄物總重量(公噸)

6

6

廢棄物描述

序號	製造程序	廢棄物代碼	物種	物理性質	有害特性	有害成分	清理方式	顏色
1	建築工程(建物) 作業程序	營建混合物	營建混合 物	固狀	無有害特性	無有害成分	將廢棄物作 為再利用之 工程填料	雜色
	410001	R-0503	0516	S	-	-	R07	

事業P48A9417


久木營造有限公司-雲林縣環保
局辦公廳舍新建工程-建築

承辦人

(蓋章)



(簽章)



清除者N09A0887
浚源環保工程行

(蓋章)



承辦人

(簽章)



再利用者 M36A1106
勝輝土資工程有限公司

(蓋章)



承辦人

(簽章)

張秋煌

備註：事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。
1. 磅重量及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。
2. 廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報，建議列印聯單時使用雷射印表機，若使用噴墨印表機列印，應慎防聯單條碼遇水暈染，導致條碼讀取器無法正確讀取條碼。請避免使用點陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。
3. 用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

×關閉視窗

備註：事業申報遞送三聯單廢棄物重量不論是否過磅，皆申報其重量，而清除者及處理者接受廢棄物若有過磅，則應於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量，若未過磅，則免於遞送三聯單書寫過磅重量及上網申報該重量。

1. 廢棄物申報重量為扣除包裝材之淨重，若包裝材合併處理者則重量得合併申報，建議列印聯單時使用雷射印表機，若使用噴墨印表機列印，應慎防聯單條碼遇水暈染，導致條碼讀取器無法正確讀取條碼。請避免使用點矩陣式印表機以免導致條碼無法正確讀取。

3. 用印原則：事業、清除者、處理者蓋章處應配合以公司章進行遞送聯單蓋章作業，惟得刻用「網路申報專用章」報地方主管機關核備後取代公司章。

各施工樓層統計表(物件)

工程編號：H241103

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 棟別:A

樓層	柱	樑	版	牆	樓梯	基礎
R				122.70		
6	224.54	696.98	398.27	2,249.83		
5	412.41	1,229.31	753.11	2,817.04	44.42	
4	412.41	1,092.83	765.45	2,558.32	44.42	
3	420.65	1,147.14	953.44	2,378.36	44.42	
2	540.54	1,670.66	1,155.60	2,890.32	44.42	
1	648.16	1,181.63	732.92	3,643.76	48.54	
B1	849.87	2,681.80	2,056.14	3,125.68	42.02	37.08
F	421.89	4,492.84	864.19			



盛記預拌混凝土有限公司

預拌混凝土送貨單

B151-3

客戶名稱：久木營造-環保局

契約編號：

出貨單號：SH15050526

工程名稱：

地址：雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話：05-5571542 傳真：05-5574439

澆置地點：虎尾環保局(高鐵前)

日期：115/05/28


出廠時間：13:20 到達時間：

卸完時間：

車次：40

車 號	KER-6538 尤聰銘	總 重	33,970 kg	水泥型式	I型水泥
規 格	28日強度	280久木環保 kgf/cm^2	空 重	12,990 kg	爐石型式
	設計塌度	18 cm	淨 重	20,980 kg	飛灰型式
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.45 %	附加劑型式
	設計塌流度	cm	交貨數量	9.0 m^3	累計數量 359.0 m^3

備 註	1.在施工現場加水而影響品質，賣方概不負責。 2.材料計量許可差依CNS3090規定。 3.本配比得視早期強度及原料變異機動調整。	調 度 員	林春足	工地簽收	黃金治
-----	---	-------	-----	------	-----



工程編號：H241103

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程預算項目總表

工 料 名 稱	單位	F	B1	1	2	3	4	5	6	R	合 計
F4 地坪整體粉光+金鋼砂	M2		377.82	143.80	30.52	30.52	30.55	35.86	8.97		658.02
W1 牆面1:3水泥粉光+批土+水泥漆(一底二度)	M2		2,374.71	2,079.18	1,882.00	1,599.35	1,612.82	1,645.61	1,180.33		12,374.00
W3 牆面1:2水泥打底+面磚	M2			494.67	180.73	147.95	148.38	253.76	55.55		1,281.01
C1 平頂1:3水泥粉光+水泥漆(一底二度)+暗架金屬網天花	M2			216.13	150.76	186.46	265.32	162.39	87.34		1,068.40
C1 梁底1:3水泥粉光+明架金屬天花-走廊、梯廳區	M2			86.41	50.20	52.96	73.37	54.73	30.89		348.56
C1 梁側1:3水泥粉光-走廊、梯廳區	M2			174.25	119.65	127.24	152.75	112.07	60.50		746.46
WP7 窗框接縫及窗台防水，W=30cm	M		13.20	262.25	246.55	374.35	494.55	448.75	282.35		2,122.00
WP6 外牆樓層接縫防水，W=30cm	M				247.32	109.46	137.04	156.77	101.23	178.26	930.08
WP9 浴廁地壁防水(高度以圖說標示為主)	M2			244.92	121.86	98.16	98.47	185.44	33.58		782.43



雲林縣環境保護局

附件8

項次	項目及說明	單位	契約數量	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	RF
貳	機電工程										
一	電氣工程										
3	照明插座動力工程										
m	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 2.0 mm	米	12,512.00	1,787.42	1,787.42	1,787.42	1,787.42	1,787.42	1,787.42	1,787.42	
n	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 5.5 mm2	米	24,836.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	3,548.00	
37	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 16mmΦ(1/2")×1.8mm	米	11,621.00	1,660.14	1,660.14	1,660.14	1,660.14	1,660.14	1,660.14	1,660.14	
38	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 20mmΦ(3/4")×1.8mm	米	110.00	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	15.71	
39	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 28mmΦ(1")×2.7mm	米	442.00	63.14	63.14	63.14	63.14	63.14	63.14	63.14	
40	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 35mmΦ(1-1/4")×3.1mm	米	266.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	
47	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
二	弱電工程										
1	電信工程										
32	PVC 導線管(CNS1302 K3006)										
3	Φ52mm(2")×3.6mm	米	126.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
4	Φ80mm(3")×5.1mm	米	288.00	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	41.14	
33	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
3	視訊工程										
1	PVC 導線管(CNS1302 K3006)										
1	Φ20mm(3/4")×1.8mm	米	270.00	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	38.57	
6	緊急求救工程										
1	0.5mm×4P	米	1,660.00	237.14	237.14	237.14	237.14	237.14	237.14	237.14	
三	給排水設備工程										
1	給水衛生設備工程										
39	給水PVC管(CNS4053)16mmΦ(1/2")×2.7mm		594.00	84.86	84.86	84.86	84.86	84.86	84.86	84.86	



雲林縣環境保護局

[illegible]

雲林縣環境保護局

項次	項目及說明	單位	契約數量	B1	1F	2F	3F	4F	5F	6F	RF
四	消防工程										
1	消防火警報設備工程										
h	信號線, 1.25mm×1P 遮蔽對絞	米	2,369.00	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	
j	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	4,738.00	676.86	676.86	676.86	676.86	676.86	676.86	676.86	
m	耐熱電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準), 1/C 2.0mm	米	2,369.00	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	
n	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 20mmΦ(3/4")×1.8mm	米	2,369.00	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	338.43	
p	PVC 導線管 配管另件	式	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
q	另件另料雜項工料費(含管路吊架,角鐵,螺絲,五金,接線盒油漆,標示,預留套管,打鑿修補,鐵絲,巨龍線,防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)	式	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
r	運什費,倉儲,搬運,吊運費	式	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	
2	消防緊急廣播工程										
c	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm	米	9,465.00	1,352.14	1,352.14	1,352.14	1,352.14	1,352.14	1,352.14	1,352.14	
3	消防緊急避難逃生工程										
g	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 1.6 mm	米	4,136.00	590.86	590.86	590.86	590.86	590.86	590.86	590.86	




公共工程監造報表

表報編號：雲A01_1150531

本日天氣：上午：晴☀ 下午：晴☀

填報日期：115年05月31日(星期日)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程					
契約工期	600天	開工日期	114年06月17日	預定完工日期	116年02月18日	實際完工日期	-
契約變更次數		1次	工期展延天數		11.5天	契約金額	原契約： 607,000,000元
預定進度(%)	31.1370%		實際進度(%)		35.2360%		變更後契約： 607,000,000元
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):							
環境整理_5F_粗清窗框修飾 模板拆除整理_6F_拆牆模							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):							
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):							
四、督導工地職業安全衛生事項:							
(一)施工前檢查事項辦理情形: ☒ 完成 ☐ 未完成							
(二)其他工地安全衛生督導事項:							
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):							
監造單位簽章:							
 115.5.31 							

- 註：
1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
 2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
 3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
 4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
 5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

建築物施工日誌

表報編號： 349

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/5/31

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程					承造人	久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	85
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月18日	累計工期	349	日曆天	剩餘工期	262.5	天
預定進度(%)	31.137%	實際進度(%)	35.236%	本日實際進度(%)	0.000%		展延工期	11.5	天
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目					單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
甲	發包工程費								
壹	建築工程								
一	假設及拆除工程								
1	工地拆除, 拆除、清除與整平, 含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)					式	1.00		0.50
2	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 一般甲種圍籬					M	300.00		300.00
3	施工圍籬, 全阻隔式固定(第一級營建工程), 2.4m ≤ 高度, 含(頂部)警告燈, 裝拆, 綠圍籬					M	525.00		525.00
4	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=8米)					檯	2.00		2.00
5	施工圍籬, 大門, 含(頂部)警告燈, 拆裝(W=4米)					檯	1.00		1.00
6	環境保護, 水污染防治, 洗車台設備及沉澱池, 含裝拆					座	1.00		1.00
7	環境保護, 工區臨時抽排水工程, 含沉澱池					式	1.00		1.00
8	工程告示牌及工地標誌, (及安全衛生告示牌)					式	1.00		1.00
10	工地臨時建築設施, (組立式臨時房屋, 二層建築), 長16.5m, (跨度, 3k, 5.4~5.64m), 含水電空調等					棟	1.00		1.00
11	工地臨時建築設施, 辦公設備, 租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)					式	1.00		1.00
12	工地臨時建築設施, 臨時廁所					組	1.00		1.00
13	臨時設施, 工程用電設備、用水、資通訊設備, 含申請及設備架設					式	1.00		1.00
14	臨時設施, 臨時水、電、電信通訊費					月	20.00		12.00
15	施工輔助設施, 施工架及防護網, 鋼管, 裝拆(含租金), 扶手先行, 含上下設備及其他所需配件, pc鋪底, 圓盤系統施工架					M2	8,671.00		7,700.00
16	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(結構挑高區室內架)					M2	3,822.00		2,050.00
17	施工輔助設施, 內部施工活動架, 鍍鋅鋼管, 裝拆(含租金), 含各安全配件(裝修挑高區室內架)					M2	2,947.00		1,000.00
18	施工輔助設施, 支撐排架, 鋼管, 裝拆(含租金)					M3	8,361.00		6,500.00
20	動土典禮及完工啟用典禮					式	1.00		0.50
21	工地清理, 營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件					m2	10,528.00		3,100.00
二	基礎工程								
1	施工測量, 工地放樣					M2	19,980.00		13,210.00
2	構造物開挖, 機械挖, 含近運暫存					M3	17,789.90		17,789.90
3	構造物回填, 原材料回填, 含運費, 85%≤壓實度					M3	4,874.90		4,874.00
4	廢方處理, 含揚塵抑制, 含近運堆置					M3	12,915.00		12,915.00
5	隧道噴凝土, 175kgf/cm ² , t=5cm					M2	1,435.00		1,435.00
6	安全觀測系統					式	1.00		1.00
7	祛水, 點井, 深度<6m					支	48.00		48.00
8	擋土設施, 鋼板樁 L=9M					M	235.60		235.00
9	輔助加強樁, H型鋼租金 300*300*15*20 L=13M					支	295.00		295.00
三	建築結構體工程								
1	普通模板, (建築, 建築物)					M2	31,257.00		31,203.00
2	清水模板, (建築, 建築物)					M2	6,717.00		6,717.00
4	鋼筋, SD420W, 連工帶料					T	1,411.00		1,411.00
5	鋼筋, 鋼筋續接器, SA級					個	4,729.00		4,729.00
6	結構用混凝土, 140kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實					M3	295.00		295.00
7	結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 第1型水泥, 含澆置及搗實					M3	8,451.00		8,281.00

建築物施工日誌

表報編號： 349

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/5/31

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程					承造人	久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	85
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月18	累計工期	349	日曆天	剩餘工期	262.5	天
預定進度(%)	31.137%	實際進度(%)	35.236%	本日實際進度(%)		0.000%	展延工期	11.5	天
10	混凝土表面處理,地坪整體粉光處理					M2	10,528.00	9,942.00	
四	鋼構工程								
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24					支	224.00	224.00	
9	剪力釘 ϕ 22mm L=125mm					支	504.00	204.00	
六	門窗工程								
3	鋁窗,固定+推射式,WD01,W70*H240					樘	32.00	10.80	
4	鋁窗,固定+推射式,電動排煙,WD01-F,W70*H240					樘	10.00	6.20	
5	鋁窗,固定+推射+橫拉式,WD03,W140*H240					樘	148.00	61.00	
6	鋁窗,固定+推射+橫拉式,電動排煙,WD03-F,W140*H240					樘	54.00	23.30	
7	鋁窗,推射+橫拉式,霧面膜,WD04,W140*H240					樘	3.00	2.10	
8	鋁窗,推射+橫拉式,電動排煙,WD04-F,W140*H240					樘	15.00	7.00	
10	鋁窗,防火檢修門,60A,WD12,W50*H80					樘	5.00	1.50	
13	鋁門扇及門樘,推射式,紙蕊蜂巢美耐板門,D01,W90*H220					樘	9.00	0.60	
14	鋁門扇及門樘,推射式,紙蕊蜂巢美耐板門,D04,W120*H220					樘	2.00	0.60	
17	鋼門扇及門樘,推射式,防火門,60A,D06-F,W100*H220					樘	6.00	0.90	
19	鋼門扇及門樘,推射式,防火門,60A,D08-F,W120*H220					樘	16.00	5.10	
21	鋼門扇及門樘,推射式,防火門,60A,D10F,W100*H220					樘	14.00	2.10	
23	鋼門扇及門樘,推射式,防火門,60A,雙開,D13-F,W180*H220					樘	8.00	2.40	
24	鋼門扇及門樘,推射式,防火門,60A,雙開,D14-F,W200*H220					樘	12.00	3.60	
27	鋁門扇及門樘,推射式,鋁框玻璃門,GD1,W120*H220					樘	19.00	0.30	
30	鋁門扇及門樘,推射式,鋁框玻璃門,雙開,GD03,W150*H220					樘	2.00	0.60	
32	鋁門扇及門樘,推射式,鋁框玻璃門,雙開,GD05,W200*H240					樘	1.00	0.30	
34	鋁門扇及門樘,推射式,鋁框玻璃門,GD08,W100*H220					樘	21.00	1.80	
八	地坪裝修工程								
4	混凝土表面處理,水泥粉光處理,混合金鋼砂(F4)					M2	658.00	658.00	
九	牆面裝修工程								
1	水性水泥漆,1底2度,水泥砂漿打底,面層粉光(W1)					M2	12,374.00	6,310.00	
2	鋪貼壁磚,含打底(W3)					M2	1,281.00	270.00	
3	水泥砂漿打底,面層粉光(W5)					M2	1,533.00	500.00	
4	外牆紋理砂石塗料,水泥砂漿打底,一底二度(W6)					M2	830.00	20.00	
5	外牆紋理砂石塗料,水泥砂漿打底,一底二度,(W8)					M2	1,560.00	20.00	
十	坪頂裝修工程								
1	暗架金屬網天花,含水泥砂漿打底,面層批土磨平(C1)					M2	2,163.00	450.00	
2	水性水泥漆,1底2度,水泥砂漿打底,面層批土磨平(C2)					M2	6,110.00	5,110.00	
十一	防水工程								
1	塗液類防潮,地下室外牆防水,含回填保護(含筏基外牆),(WP1)					M2	1,390.00	1,390.00	
2	塗液類防潮,筏基水池防水防水(五面施工)及地下室外牆內牆防水,(WP2)					M2	2,875.00	2,875.00	
5	塗液類防潮,基礎底板防水,(WP5)					M2	2,740.00	2,740.00	
6	塗液類防潮,外牆樓層接縫防水,W=30cm,(WP6)					M	930.00	660.00	
7	塗液類防潮,窗框接縫及窗台防水,W=30cm(WP7)					M	2,122.00	1,650.00	
9	塗液類防潮,浴廁地壁防水,(WP9)					M2	782.00	390.00	
十二	雜項工程								
17	屋頂機電設備墩座					式	1.00	0.10	
貳	機電工程								
一	電氣工程								
3	照明插座動力工程								
k	接地銅棒3m x ϕ 19(3/4")mm					只	5.00	5.00	

(星期日)

(星期日)

建築物施工日誌

表報編號： 349

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/5/31

(星期日)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	85
開工日期	114年06月17日	核定竣工日期	116年2月18	累計工期	349	日曆天	剩餘工期	262.5	天
預定進度(%)	31.137%	實際進度(%)	35.236%	本日實際進度(%)		0.000%	展延工期	11.5	天
x	PVC 導線管(CNS1302 K3006)								
1	Φ20mm(3/4")×1.8mm				米	742.00		742.00	
9	中央監控工程								
10	線槽工程								
a	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)， 高=100 mm 厚度=1.6 mm，直式 W:300 mm (附蓋板)				米	375.00		250.00	
b	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)， 高=100 mm 厚度=1.6 mm，水平 L 型彎接 頭 W:300mm(附蓋板)				只	8.00		5.00	
c	鋁製密閉式線槽表面陽極處理(附蓋板)， 高=100 mm 厚度=1.6 mm，水平 T 型彎接 頭 W:300mm(附蓋板)				只	7.00		4.00	
d	末端封板 W:300mm(附蓋板)				只	13.00		10.00	
e	鋁製吊架(不含吊桿)300w				支	250.00		175.00	
f	連接片				只	574.00		350.00	
g	固定片(不銹鋼製)				組	500.00		350.00	
h	馬車螺絲(不銹鋼製)				只	2,296.00		1,600.00	
i	接地銅片				片	287.00		180.00	
j	組合及固定螺栓，吊桿				式	1.00		0.60	
l	運雜費				式	1.00		0.60	
m	安裝工資				式	1.00		0.60	
11	避雷接地工程								
d	接地銅棒3m × φ19(3/4")mm				只	7.00		7.00	
e	裸銅線 100 mm ²				米	23.00		23.00	
三	給排水設備工程								
1	給水衛生設備工程								
39	給水PVC管(CNS4053)16mmΦ(1/2")× 2.7mm				米	594.00		450.00	
40	給水PVC管(CNS4053)20mmΦ(3/4")× 3.1mm				米	194.00		150.00	
41	給水PVC管(CNS4053)25mmΦ(1")×3.1mm				米	176.00		100.00	
44	給水PVC管(CNS4053)50mmΦ(2")×4.1mm				米	172.00		100.00	
45	給水PVC管(CNS4053)65mmΦ(2-1/2")× 4.1mm				米	236.00		150.00	
2	排水工程								
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ(4")×6.6mm				米	141.00		141.00	
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通 管 配管另件另料				式	1.00		1.00	
28	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 50mmΦ (2")×4.1mm				米	885.00		400.00	
29	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 80mmΦ (3")×5.1mm				米	765.00		300.00	
30	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ(4")×6.6mm				米	40.00		20.00	
31	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 150mmΦ(6")×8.5mm				米	144.00		100.00	
32	生活廢水雨水PVC管(CNS1298 B管), 生活廢 水雨水PVC管 配管另件另料				式	1.00		0.50	
33	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管 , 50mmΦ(2")×4.1mm				米	684.00		300.00	

建築物施工日誌

表報編號： 349

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/5/31

(星期日)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程			承造人		久木營造有限公司			
建(雜)照號碼		(114)(雲)營建字第00144號					不計工期	0	85	
開工日期		114年06月17日	核定竣工日期	116年2月18	累計工期	349	日曆天	剩餘工期	262.5	天
預定進度(%)		31.137%	實際進度(%)	35.236%	本日實際進度(%)		0.000%	展延工期	11.5	天
34	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 80mmΦ(3")×5.1mm				米		232.00		100.00	
35	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ(4")×6.6mm				米		561.00		300.00	
36	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 125mmΦ(5")×7.0mm				米		110.00		50.00	
37	下水道污水專用橘紅色PVC管(CNS1298 B管), 下水道污水專用橘紅色PVC管 配管另件另料				式		1.00		0.50	
38	透氣PVC管(CNS1298 A管), 50mmΦ(2")×1.8mm				米		479.00		300.00	
39	透氣PVC管(CNS1298 A管), 透氣PVC管 配管另件另料				式		1.00		0.50	
40	另件另料雜項工料費(含管路吊架, 角鐵, 螺絲, 五金, 油漆, 標示, 預留套管, 打鑿修補, 鐵絲, 尼龍線, 防火阻隔, 填縫劑, 止水帶及RC基礎座等工程完成所需材料)				式		1.00		0.50	
四	消防工程									
1	消防火警警報設備工程									
h	信號線, 1.25mm×1P 遮蔽對絞				米		2,369.00		1,000.00	
j	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm				米		4,738.00		2,000.00	
m	耐燃電線 600V(符合CNS11359及消防署認可基準), 1/C 2.0mm				米		2,369.00		1,000.00	
n	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 20mmΦ(3/4")×1.8mm				米		2,369.00		1,500.00	
p	PVC 導線管 配管另件				式		1.00		0.50	
q	另件另料雜項工料費(含管路吊架, 角鐵, 螺絲, 五金, 接線盒油漆, 標示, 預留套管, 打鑿修補, 鐵絲, 尼龍線, 防火阻隔及RC基礎座等工程完成所需材料)				式		1.00		0.50	
r	運什費, 倉儲, 搬運, 吊運費				式		1.00		0.50	
2	消防緊急廣播工程									
c	耐熱電線 380度 600V 1/C, 1.6mm				米		9,465.00		4,000.00	
e	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 16mmΦ(1/2")×1.8mm				米		2,075.00		1,500.00	
3	消防緊急避難逃生工程									
g	PVC 絕緣銅導線 600V, 1/C 1.6 mm				米		4,136.00		2,000.00	
i	PVC 導線管(CNS1302 K3006), 16mmΦ(1/2")×1.8mm				米		2,068.00		1,500.00	
4	空調水管工程									
3	管材, 鍍鋅鋼管 80φ 5.5mm				M		212.00		50.00	
一	職業安全衛生, 可量化部分				式		1.00		0.60	
二	職業安全衛生, 不可量化部分				式		1.00		0.60	
三	環境保護, 環境保護措施(可量化部分)				式		1.00		0.60	
四	環境保護, 環境保護措施(不可量化部分)				式		1.00		0.60	
一	品質管理, 品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)				式		1.00		0.60	
二	品質管理, 材料設備檢試驗費				式		1.00		0.70	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用), (壹. 一~壹. 二合計之8%)						1.00		0.35	
陸	臨時設施, 工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)				式		1.00		1.00	

建築物施工日誌

表報編號： 349

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026/5/31

(星期日)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼		(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	85
開工日期		114年06月17日	核定竣工日期	116年2月18日	累計工期	349	日曆天	剩餘工期	262.5	天
預定進度(%)		31.137%	實際進度(%)	35.236%	本日實際進度(%)		0.000%	展延工期	11.5	天
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)						1.00		1.00	
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)						1.00		35.236%	
營造業專業工程特定施工項目										

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.0		1,411.0	
鋼筋, 鋼筋續接器, D25mm(#8), 連工帶料, 柱	組	4,729.0		4,729.0	
建築用混凝土, 140kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	8,451.0		8,281.0	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組 工	3	980	施工架工		370	挖(鏟)土機		78
鐵 工		20	泥作工		1148	混凝土運輸車		811
水電工		873	油漆工		108	混凝土泵輸車		24
續接工		22	技術工		403	移動式全吊車		33
鋼筋工		1664	門窗工	3	55	吊卡車		14
模板工	11	3295				拖車		3
混凝土工		249				搬運車		34

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

☐有☐無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(註4)：5F粗清窗框修飾, 6F拆牆模

簽章：【工地主任】(註5)：

簡源泰

主任簡源泰



註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂。

3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

雲林縣環境保護局

物價指數(總指數)調整工程款明細表

工程名稱：		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程			契約編號		114-041		調整方式：		增減均調整	
開標(議價)日	114年03月07日	開標(議價)當月物價指數：(A)			112.56		預付款E%：(註1)		2.50%		0%	
估驗期別	估驗日期 (估驗基準日)	當期直接工程費				調整門檻%：	指數增減率 $C=(B/A-1)*100\%$	調整金額(註3)(註6) $H*(C之絕對值-調整門檻)*1.05$		備註：應扣除金額E 之明細說明		
		估驗金額(D)	應扣除金額(E) (註2)	小計H=D-E	估驗日當月物價 指數(B)							
1	114.06.30	9,301,917	1,256,708	8,045,208	111.97	-0.5242%	0					
2	114.07.31	33,335,922	5,389,717	27,946,204	111.83	-0.6485%	0					
3	114.08.31	14,357,822	2,590,182	11,767,640	112.15	-0.3643%	0					
4	114.09.30	17,995,460	2,823,540	15,171,920	112.09	-0.4176%	0					
5	114.10.31	20,596,460	2,793,297	17,803,162	112.43	-0.1155%	0					
6	114.11.30	20,089,494	2,779,231	17,310,262	112.66	0.0888%	0					
7	114.12.31	18,783,936	2,423,230	16,360,706	112.82	0.2310%	0					
8	115.01.31	17,514,884	2,320,909	15,193,975	113.81	1.1105%	0					
9	115.02.28	9,527,427	1,329,427	8,198,000	114.69	1.8923%	0					
10	115.03.31	19,996,288	2,555,646	17,440,642	115.60	2.7008%	36,769					
11	115.04.30	18,280,799	2,422,255	15,858,544	117.51	4.3977%	315,987					
12	115.05.31	14,057,364	1,864,710	12,192,654	118.76	5.5082%	385,115					

註：
 1. 係指已付預付款之最高額估約總價之百分比。
 2. 係指契約規定應扣除項目：(例如：規劃費、設計費、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費……)、營業稅、保險費、利潤、訓練費、檢(試)驗費……等)之當期估驗總金額。
 3. 指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償；指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。
 4. 工程款物價指數調整處理原則、計算方式(範例)、函釋等，參見工程會全球資訊網「政府採購」工程款物價指數調整。
 5. 契約訂有辦理物價指數調整者，本表應併入結(法)算、估驗等計價明細表內。
 6. 物價指數調整款係契約第5條契約價金之給付條件第(6)款本契約依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過2.5%之部分。

承包廠商：

監造單位：



$$\begin{aligned}
 &= 1.05 \times (1391253 - 1831055) \times \\
 &\quad \left(\frac{118.96 - 112.56}{112.56} - 0.025 \right) \\
 &= 1.05 \times 11941498 \times 0.030819341862118 \\
 &= 399182 \checkmark
 \end{aligned}$$

營造工程物價指數（總指數）銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97	111.83	112.15	112.09	112.43	112.66	112.86	112.27
115	113.81	114.69	115.62	117.50	118.76								114.70

註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1


115.05.05_6樓柱續接扭力值查驗



相片說明

2

115.05.06_6F柱牆鋼筋試驗



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

3


115.05.07_1F廁所防水施工查驗(第三道)



相片說明

4

115.05.08_外牆6F施工架搭設



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

5


115.05.19-6F牆模板封模

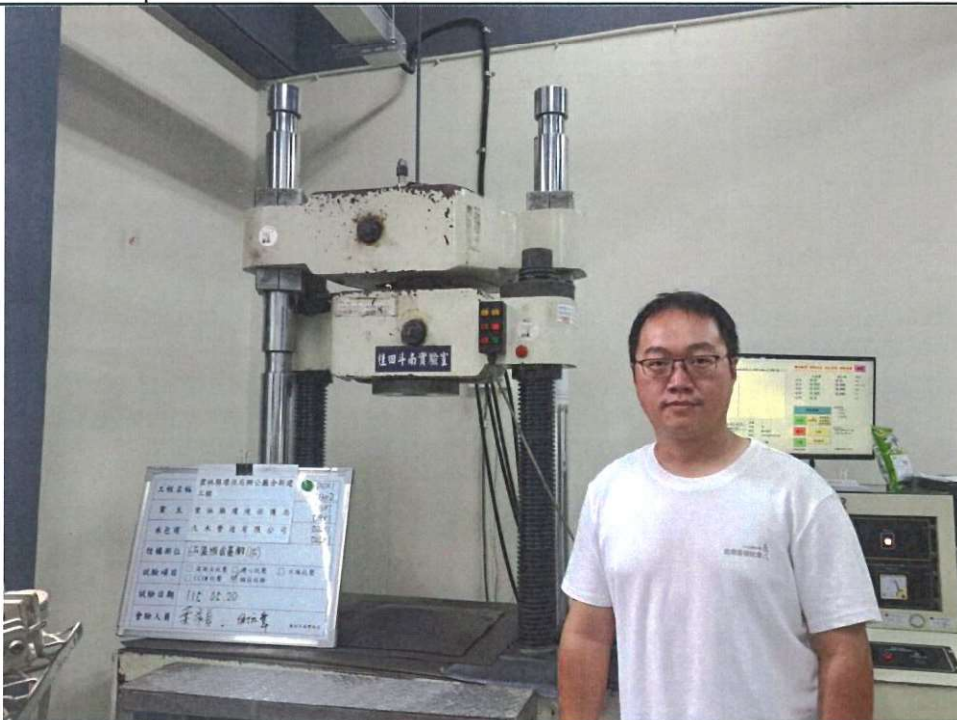

相片說明

6

115.05.20_6F頂版含基腳(1F)鋼筋試驗



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

7

115.05.22_6F頂版清水模板組立



相片說明

8

115.05.25_3~4F窗框防水施工查驗(第二道)



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

9


115.05.25_4~5F樓層接縫施工查驗(第二道)



相片說明

10

115.05.27_6F頂版鋼筋綁紮完成



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

11


115.05.27_6F頂版灌漿前樓版清洗



相片說明

12

115.05.28_6F頂版混凝土試體取樣



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

13


115. 05. 28_6F頂版灌漿完成



相片說明

14

115. 05. 29_6F頂版灌漿後灑水養護



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

15

115.05.31_1~3F廁所防水施作



相片說明

16

115.05.31_4F牆面打底粉光完成



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

17

115.05.31_3~4F鋁窗框安裝



相片說明

18

115.05.31_4F防火門框安裝

