

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第 007 次工務會議-會議記錄

一、會議時間：114 年 7 月 28 日（星期一）下午 14 時

二、會議地點：雲林縣虎尾鎮大學段 160 地號工務所

三、主持人：張書瑋

記錄：張書瑋

四、與會人員：詳如簽到單

五、工程概況：

契約工期	開工日期	預定完工日期	已用工期 至 114.7.25 止	備註
600 日曆天	114.06.17	116.2.6	38 日 (尚餘 562 天)	

六、工程進度：

統計日期	114 年 7 月 25 日	備註
預定進度	2.014%	
實際進度	6.512%	
進度差異 (實際-預定=差異)	4.498%	

七、上週已施作項目：(7/19-7/25)

- 1、基礎上層筋綁紮
- 2、基礎模板組立
- 3、基礎混凝土澆置
- 4、地梁放樣
- 5、連通管施作、接地線施作

八、本周預計施作項目：(7/25-8/1)

- 1、地梁模板組立

九、下周預計施作項目：(8/2-8/8)

- 1、地梁混凝土澆置
- 2、BS 板模板組立

十、報告事項：

- (1) 目前[6.512]%，目前[超前][4.498]%，請施工廠商說明落後原因及準備施工進度精進計畫。
- (2) 分項施工計畫送審管制情形：截至[114年07月25日]，
 建築-應送審[27]項，已送審[12]項，已核定[8]項，[4]項審查中，[]項退回修正中。
 機電-應送審[5]項，已送審[]項，已核定[]項，[]項審查中，[]項退回修正中。
 下次應於[年月日]前提送[~分項施工計畫]。
- (3) 材料設備送審管制情形：截至[114年07月25日]，
 建築-應送審[53]項，已送審[5]項，已核定[5]項，[0]項審查中，未送審 []項，[]項退回修正中。
 機電-應送審[34]項，已送審[1]項，已核定[1]項，[]項審查中，[]項退回修正中。
 (材料送審管制雖在預估時程內提送，但仍請承包廠商盡早提送，以利後續工程進行)
- (4) 監造單位上周(114/7/21~7/25)執行材料進場查驗[2]：模板材料進場、底板灌漿。
- (5) 缺失改善情形與督導查核改善說明。
- (6) 職業安全衛生執行項目

項次	工安及環保項目	檢查次數	缺失改善	累計次數 (檢查)	累計已改善	備註
1	安全宣導	7	0	38	0	
2	環境檢查	7	1	38	3	
3	臨時用電	7	0	38	0	
4	防汛抽查記錄表	1	0	2	0	
5	施工架檢查	1	0	4	0	
累計次數		23	1	120	3	
本週檢查 23 次，合格 22 次，缺失改善 1 次，本週改善 1 次，已改善 1 次， 累計已改善 3 次，累計檢查 120 次						

十一、歷次會議管制事項：

項次	提議日期	管制事項	單位	辦理情形	備註
1	114/06/17	智慧工地預計7月10日前安裝完成環境攝影機，再請營造單位確認實際施作時間、提供訊號至政風室。	營造方/ 主辦方/	待決議，系統已初步設置完成。尚有細節如人臉辨識尚須調整。 後續需掌握工班名單後建置人臉辨識清單做確認。 熱危害警示須連動主辦機關系統，尚未設置。	
2	114/06/17	開挖工法變更討論： 變更圖說及預算請設計監造單位提供主辦機關做後續變更流程。	設計方/ 主辦方/	待決議。	

十二、討論事項與決議：

項次	內容	備註
1	機關提出事項： 1. 爾後如遇有其他政府機關(如勞動部等)至工地稽查，請於工作群組告知，以利本局隨時掌握相關狀況。	
	決議：遵照機關指示辦理。	
2	監造提出事項： 營造再清一遍待釋疑的事項，目前各自提出的釋疑有點分散，看是否統整提出。	
	決議：有關營造提出釋疑表，將統一彙整成 Excal 表填寫，由監造單位提供公板 google 表單，並請營造與監造單位每周清點釋疑內容。 雲端 google 表格連結： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A_ZSSju7chSyBmfeAxBPUToPGNvlcueRsv6bEWJMYJA/edit?gid=0#gid=0	
3	監造提出事項： 污水納管的高程檢討製造圖。	
	待決議：請營造提出相關圖說。	
4	監造提出事項： 工區內土地泥濘整地，請提供回填材合法來源證明。	
	決議：營造提出此骨材為合法來源購買 AC 填充材料，並請營造提出合法來源證明。	
5	監造提出事項： 護坡瀆凝土具體完成時間。護欄完成時間。	
	待決議：考量近期天候不佳，請營造廠好天氣坡漿完成後應盡早安排完成護欄，列入追蹤事項持續追蹤管制。	
6	營造提出事項： 1. 地下車道結構討論	
	待決議：調整圖說詳附件。 1_地下室梁與鐵捲門衝突待請結構技師提供圖說。 2_車道梁結構檢討，詳附件。	
7	營造提出事項： 2. 鋼構工程與金屬工程數量計算檢討	
	待決議，營造廠與監造安排時間討論。	
8	營造提出事項： 4. 鋼構造防火時效檢討	
	決議，詳附件。	
9	營造提出事項：	

	5. 汙水納管檢討請營造提供(昇位高程/平面位置)	
	此內容重複提出	
10	營造提出事項： 排水立管檢討(括柱埋牆/明管?)	
	待決議	
11	營造提出事項： 截水溝長度檢討	
	待決議	
12	監造提出_由於颱風及豪大雨平凡，請提高工地職業安全及汛期相關自主檢查表之檢查頻率。	
	決議：營造單位遵照辦理，應持續注意颱風、大雨基地環境情形作管制。	
13	營造提出_樓梯階數檢討	
	待決議	
14	監造提出_有關工地會議提升品質，下周督導請留意準備麥克風相關設備。	
	決議：營造單位遵照辦理。	
15	監造提出_近期天候不佳，須多留意水位高程，視情況增加抽水次數以減少側向壓力。	
	決議：營造單位遵照辦理。營造持續觀測水位並保持抽水作業。	
16		

十三、臨時動議：

1_有關營造未收到 004~006 工務會議記錄函文紙本，監造與營造每周請於雲端資料夾確認紙本文是否確實有收到。

2_空調釋疑內容列入本周會議紀錄，詳附件。

4_機關需求；有關 114/7/25 工程督導會議紀錄尚未收到，請主辦機關發文。

十四、散會:15 時 20 分

附件一_三周預定進度表

三週進度表

開工日期	114年6月17日
合約工期	600日曆天
本週日曆天	7
累計日曆天	38

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

日	期	7月							7月/8月							7月/8月							備註
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		上週							本週							下週							
週	別	上週							本週							下週							備註
星	期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
假設工程施工	預定																						
	實際																						
基礎鋼筋工程施工	預定																						
	實際																						
地梁鋼筋工程施工	預定																						
	實際																						
基礎模板施工	預定																						
	實際																						
基礎混凝土澆置	預定																						
	實際																						
地梁放樣	預定																						
	實際																						
連通管施作	預定																						
	實際																						
地梁模板組立	預定																						
	實際																						
地梁混凝土澆置	預定																						
	實際																						
筏基頂版模板組立	預定																						
	實際																						
筏基頂版水電放樣	預定																						
	實際																						
筏基頂版鋼筋綁紮	預定																						
	實際																						
說明																							

附件二_驗廠及廠驗時程表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

項次	材料(設備)名稱	預定驗廠日期	實際廠驗日期	協力廠商	聯絡人	備註
1	混凝土	114.06.06	114.06.06	瑁育預拌混凝土有限公司	許先生	下午 1:00
		114.06.06	114.06.06	盛記預拌混凝土有限公司	李素蘭	上午 10:00
2	鋼筋	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
3	鋼筋續接器	114.06.06	114.06.06	嘉一鋼鐵工業股份有限公司	劉先生	下午 2:00
4	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B、A36、其他結構用鋼板	115.04.01				
5	粗木作，GLT、CLT	115.03.01				
6	建築鋼結構，鋼構外框架收邊	115.05.01				
7	金屬製品，花架、花槽、外牆金屬板、擴張網牆、金屬屋頂、倒吊平鋼板天花等系統材料	115.05.01				
8	金屬製品，欄杆	115.05.01				
9	開關箱	115.03.01			林漢昱	
10	發電機	115.03.01			林漢昱	

項次名稱	應送審項數	至 114/07/25 已送審 項數	至 114/07/25 逾期送審 項數	退回	審查中	審定	掃描完成	
施工計畫 總計	35	15	0	0	4	11	0	
整體施工、品質、 職業安全衛生	3	3	0	0	0	3	0	
分項施工計畫書	建築	27	12	0	0	4	8	0
	水電	5	0	0	0	0	0	0
材料設備	總計	87	6	0	0	1	5	0
	建築	53	5	0	0	1	4	0
	水電	34	1	0	0	0	1	0
施工圖	建築	17	1	0	0	1	0	0
	水電	10	0	0	0	0	0	0

說明：

一、【截至 114/07/25】應送審計畫、材料及施工圖，依排定之送審管制總表期程提審查。

1. 本週預定送審(114/07/26~114/08/01)：

★PVC 管材料(第一版)

★筏基管路配置施工圖(第一版)

★BIF 柱、牆、版鋼筋加工及施工大樣圖(第一版)


2. 下週預定送審(114/08/02~114/08/08)：


★無障礙電動升降梯材料(第一版)


3. 送審審查時程逾 1 個月案件：


*目前無逾 1 個月案件

附件四、鋼構主要構造檢討

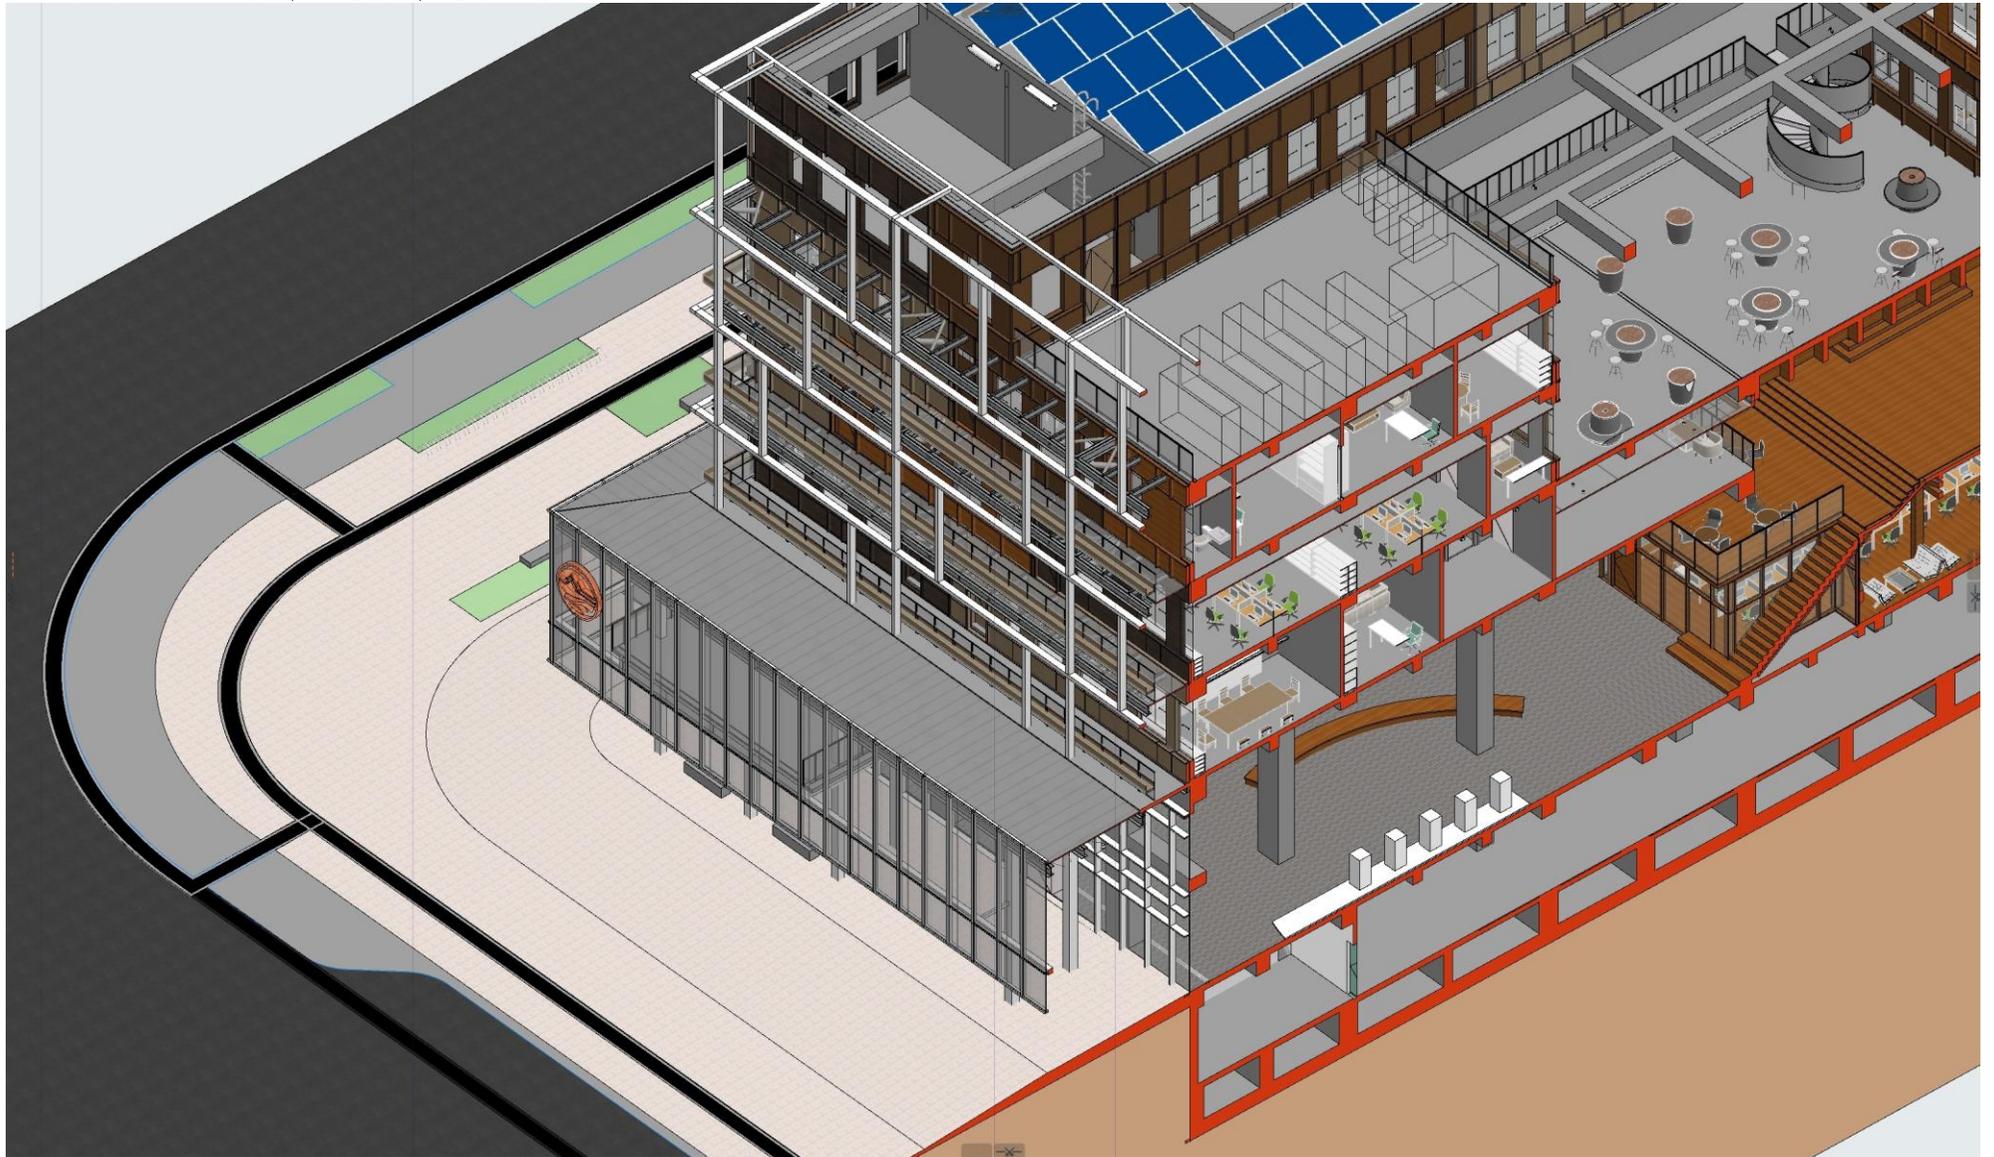


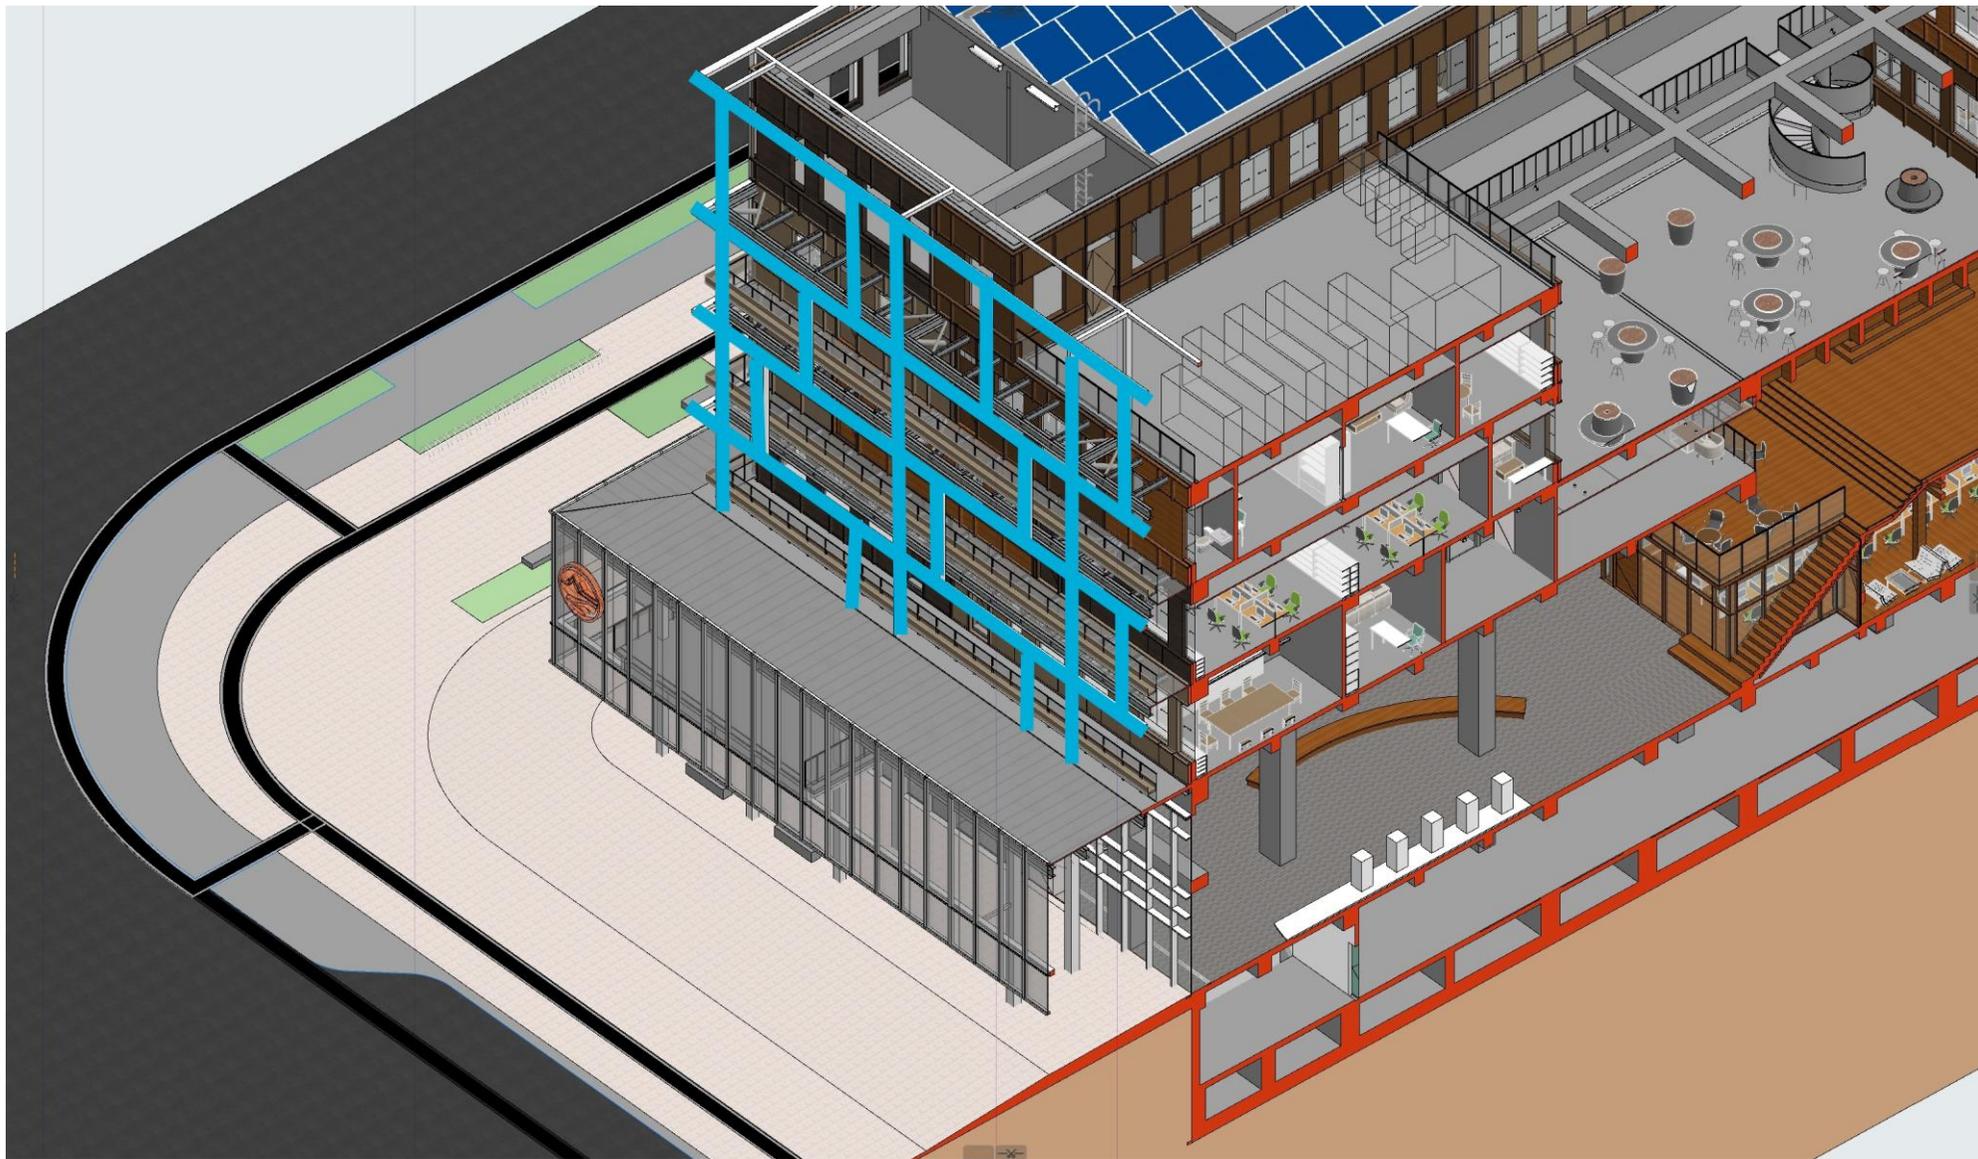

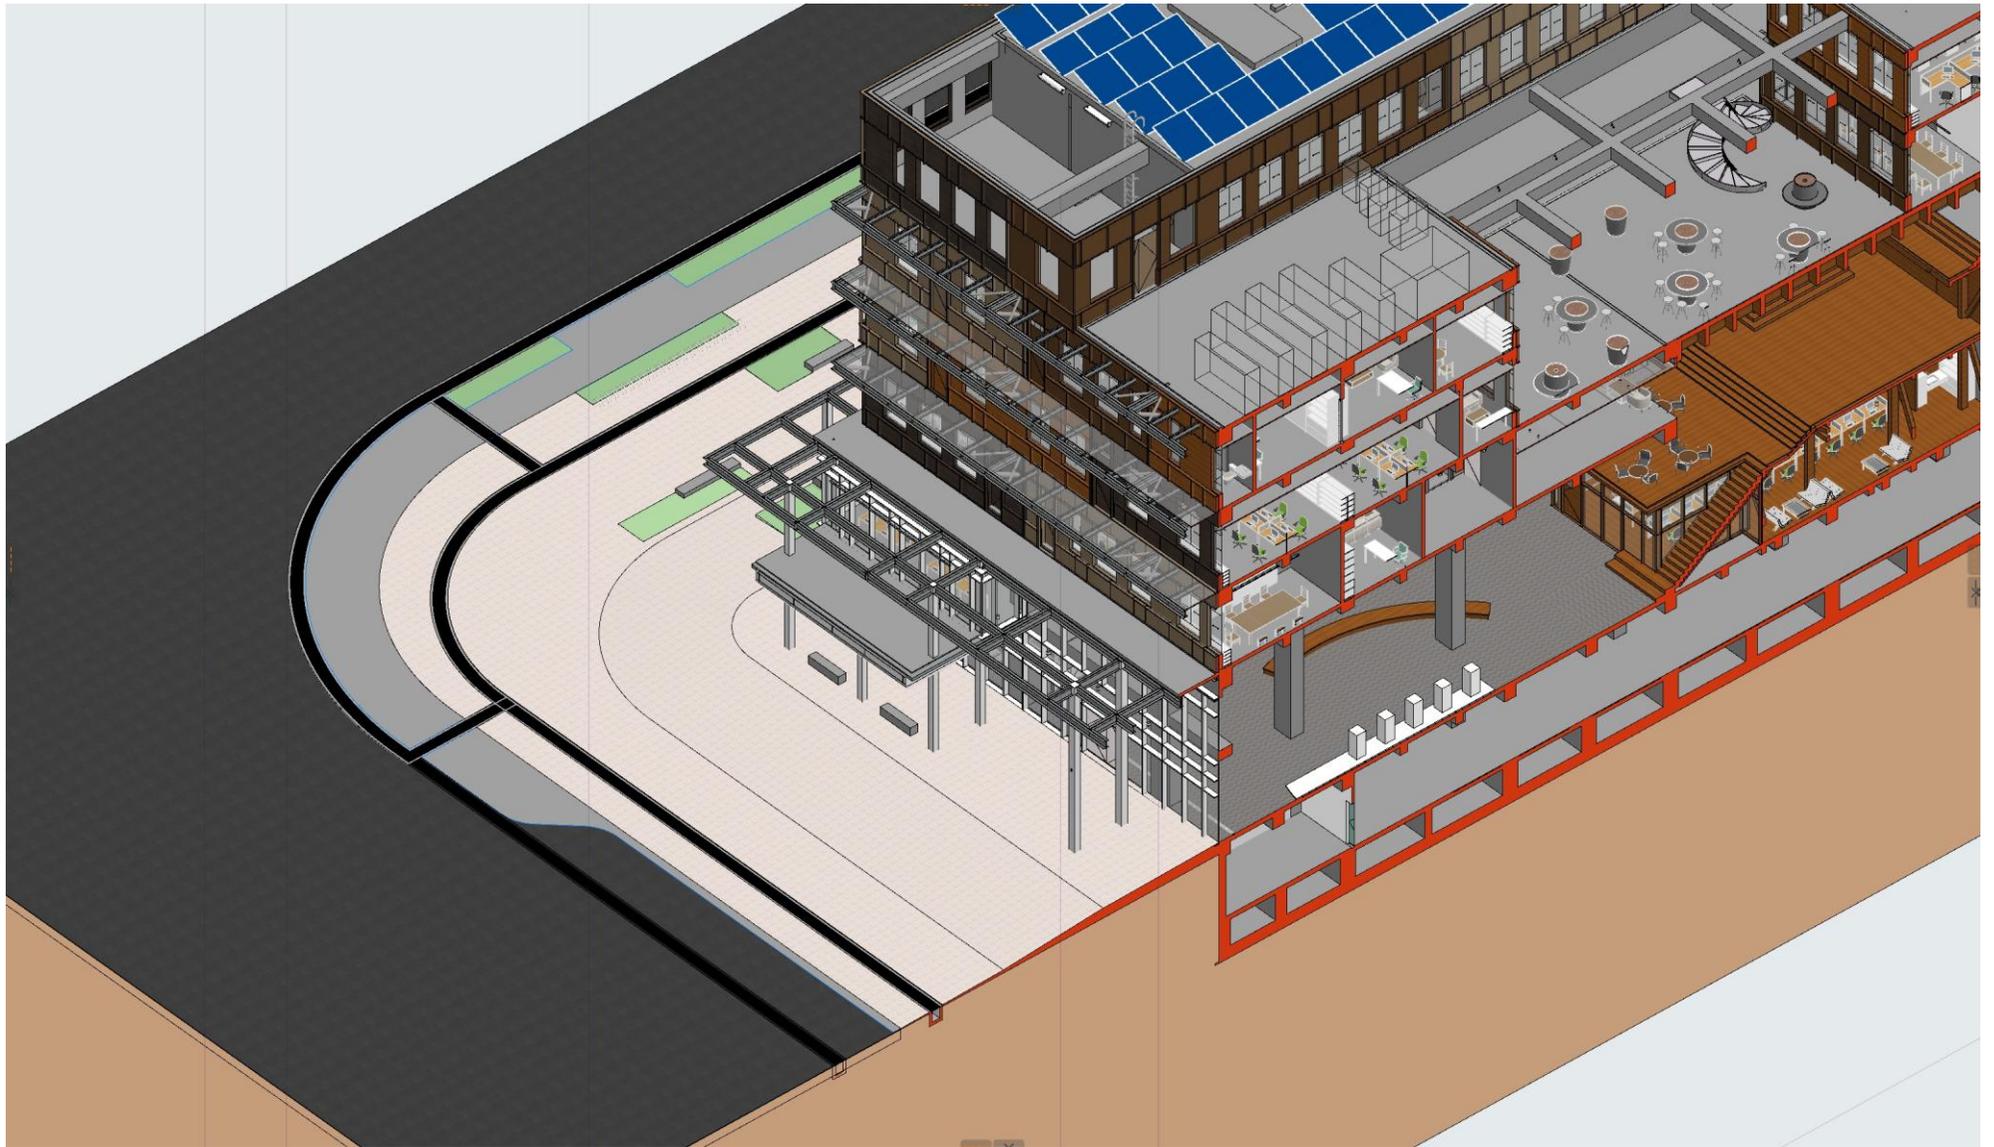


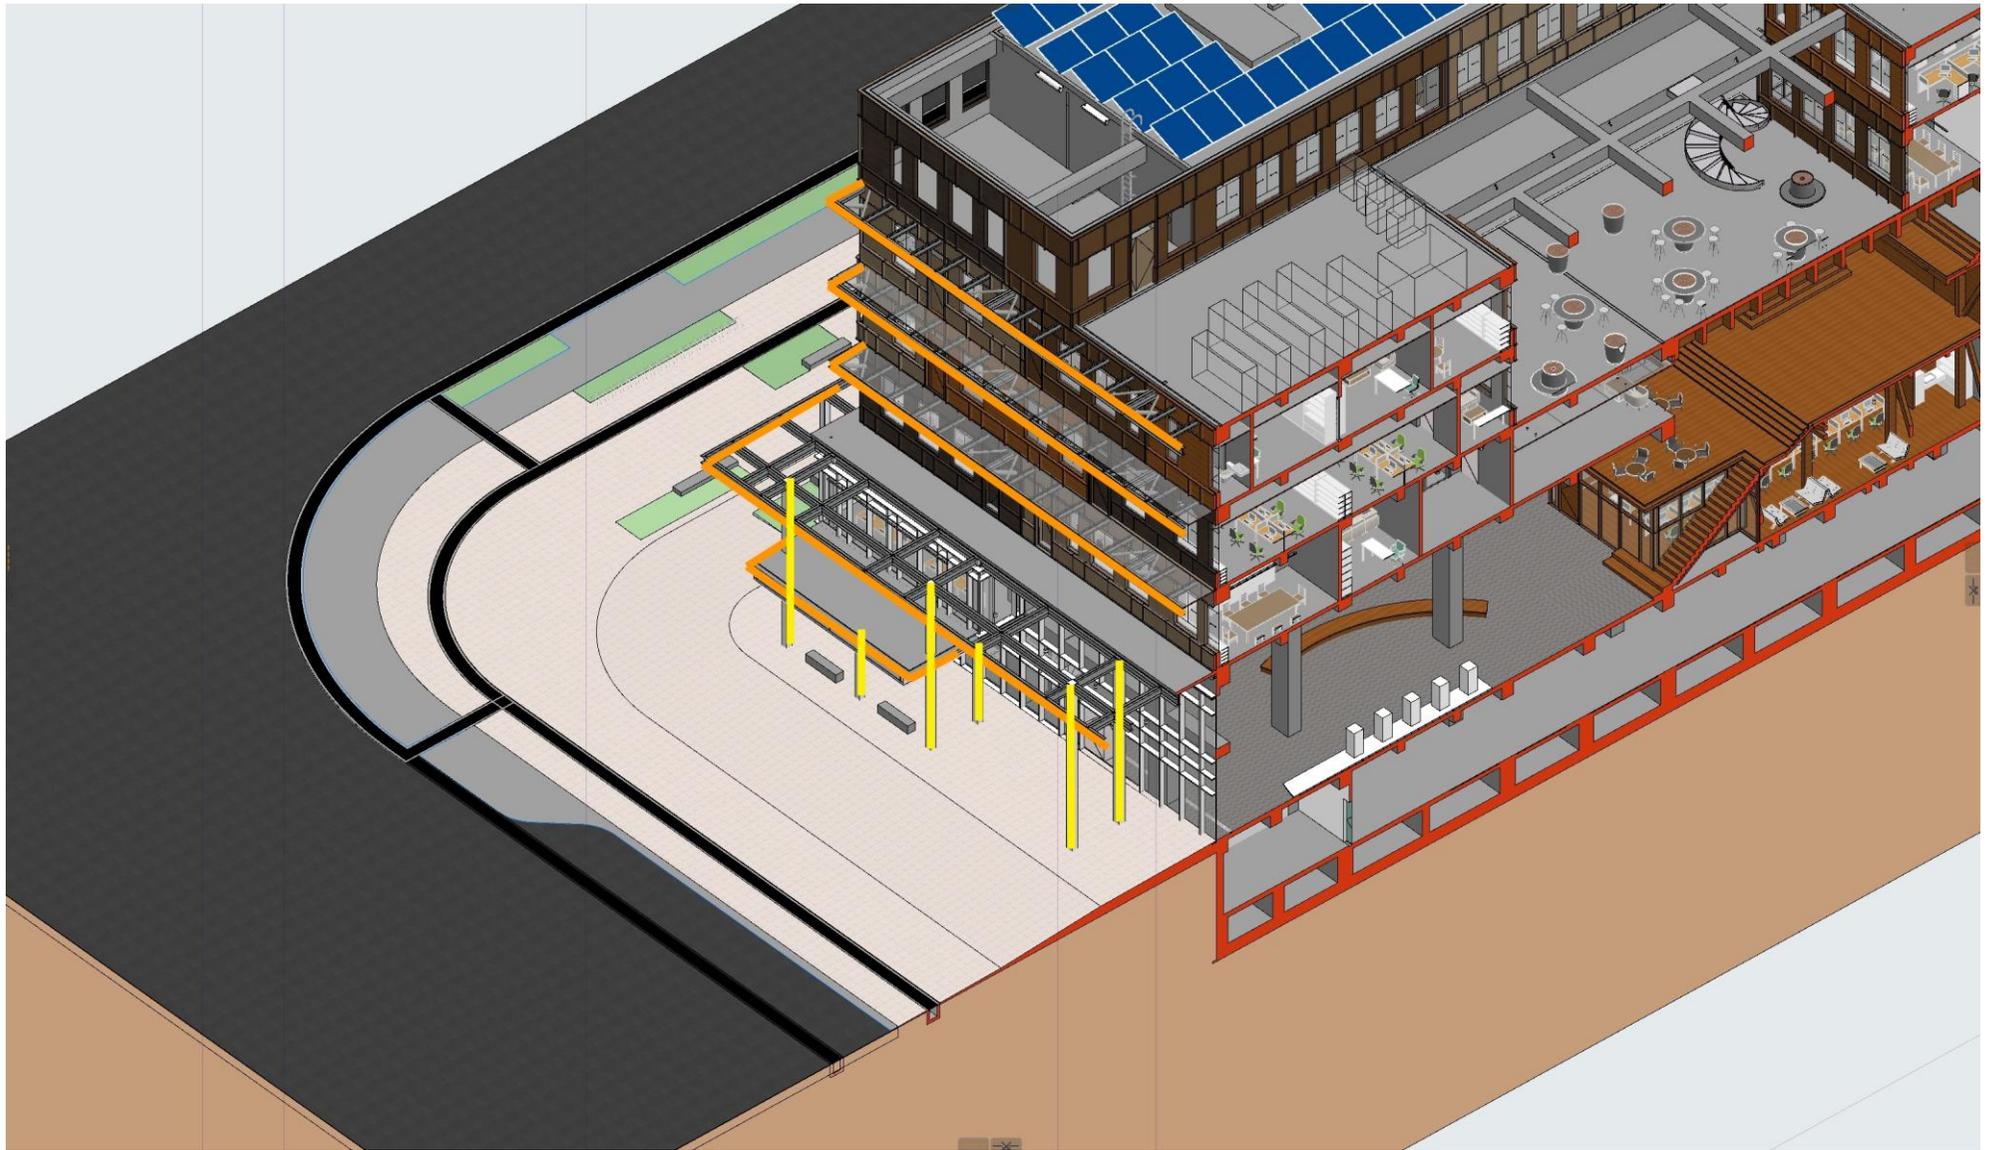



技術規則70條

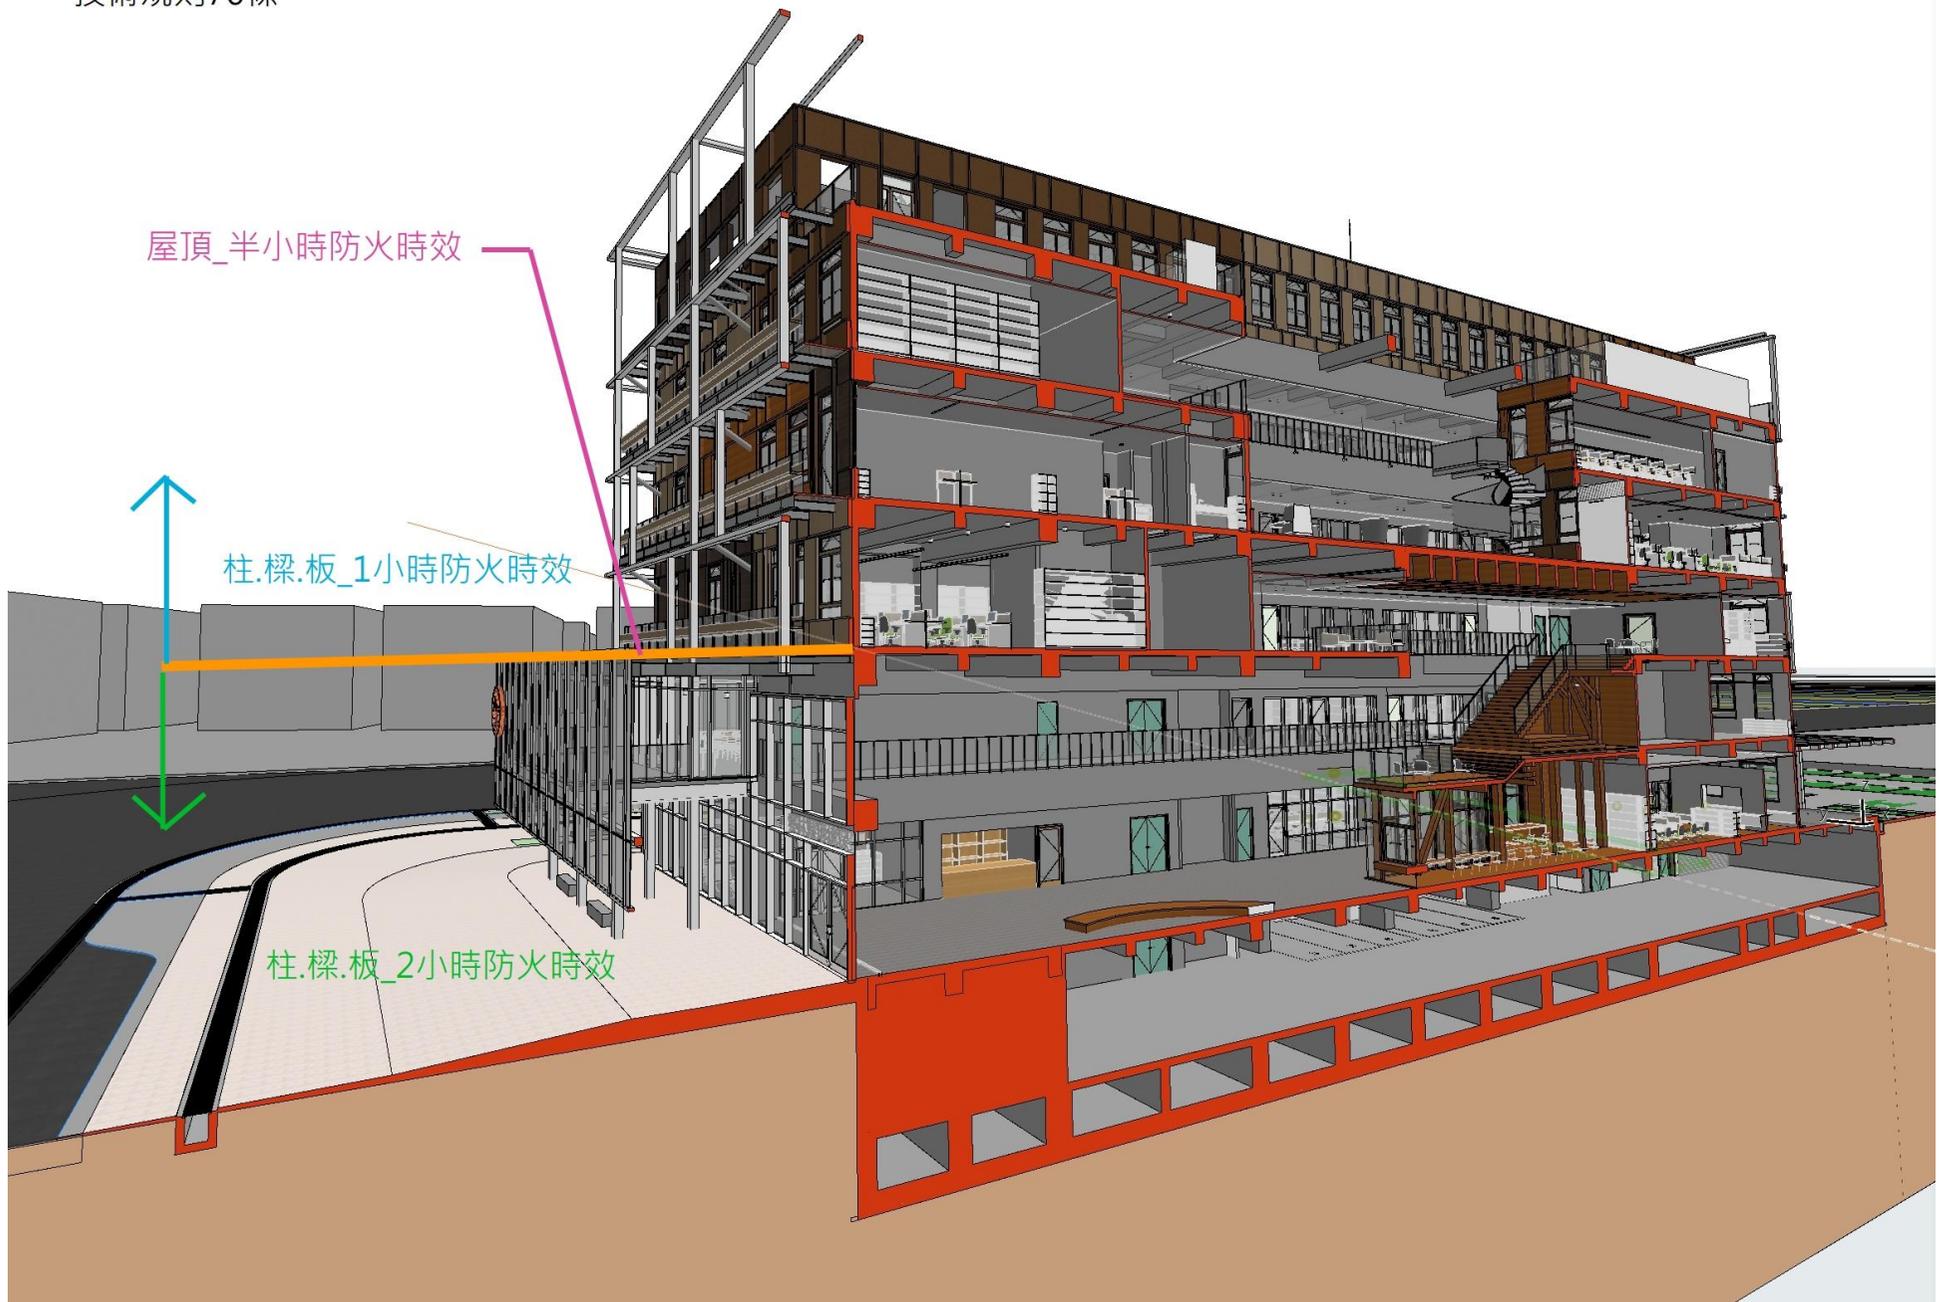

附件五、車道構造檢討

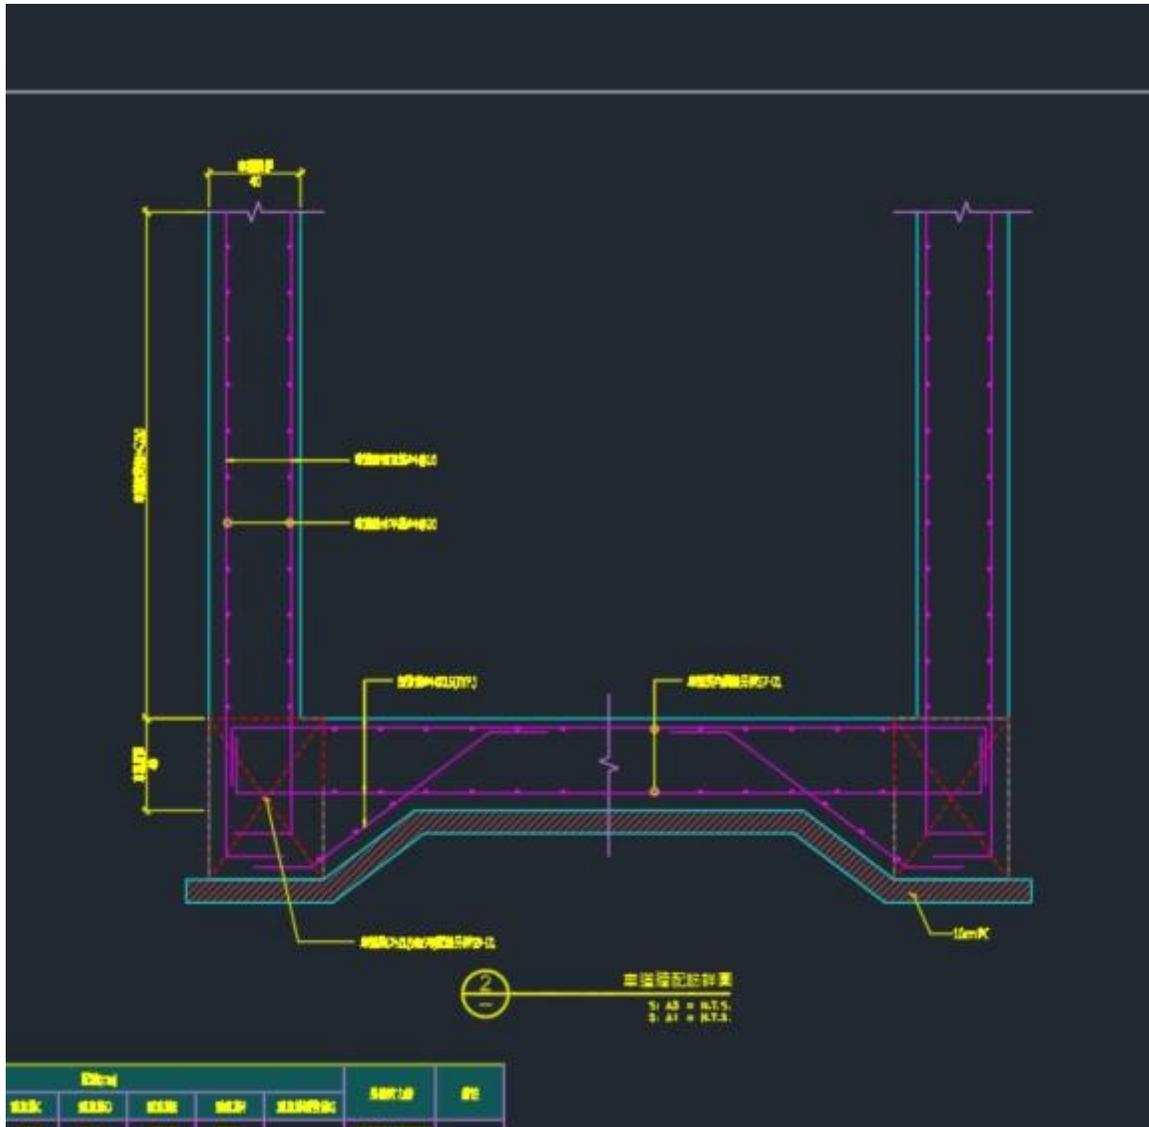

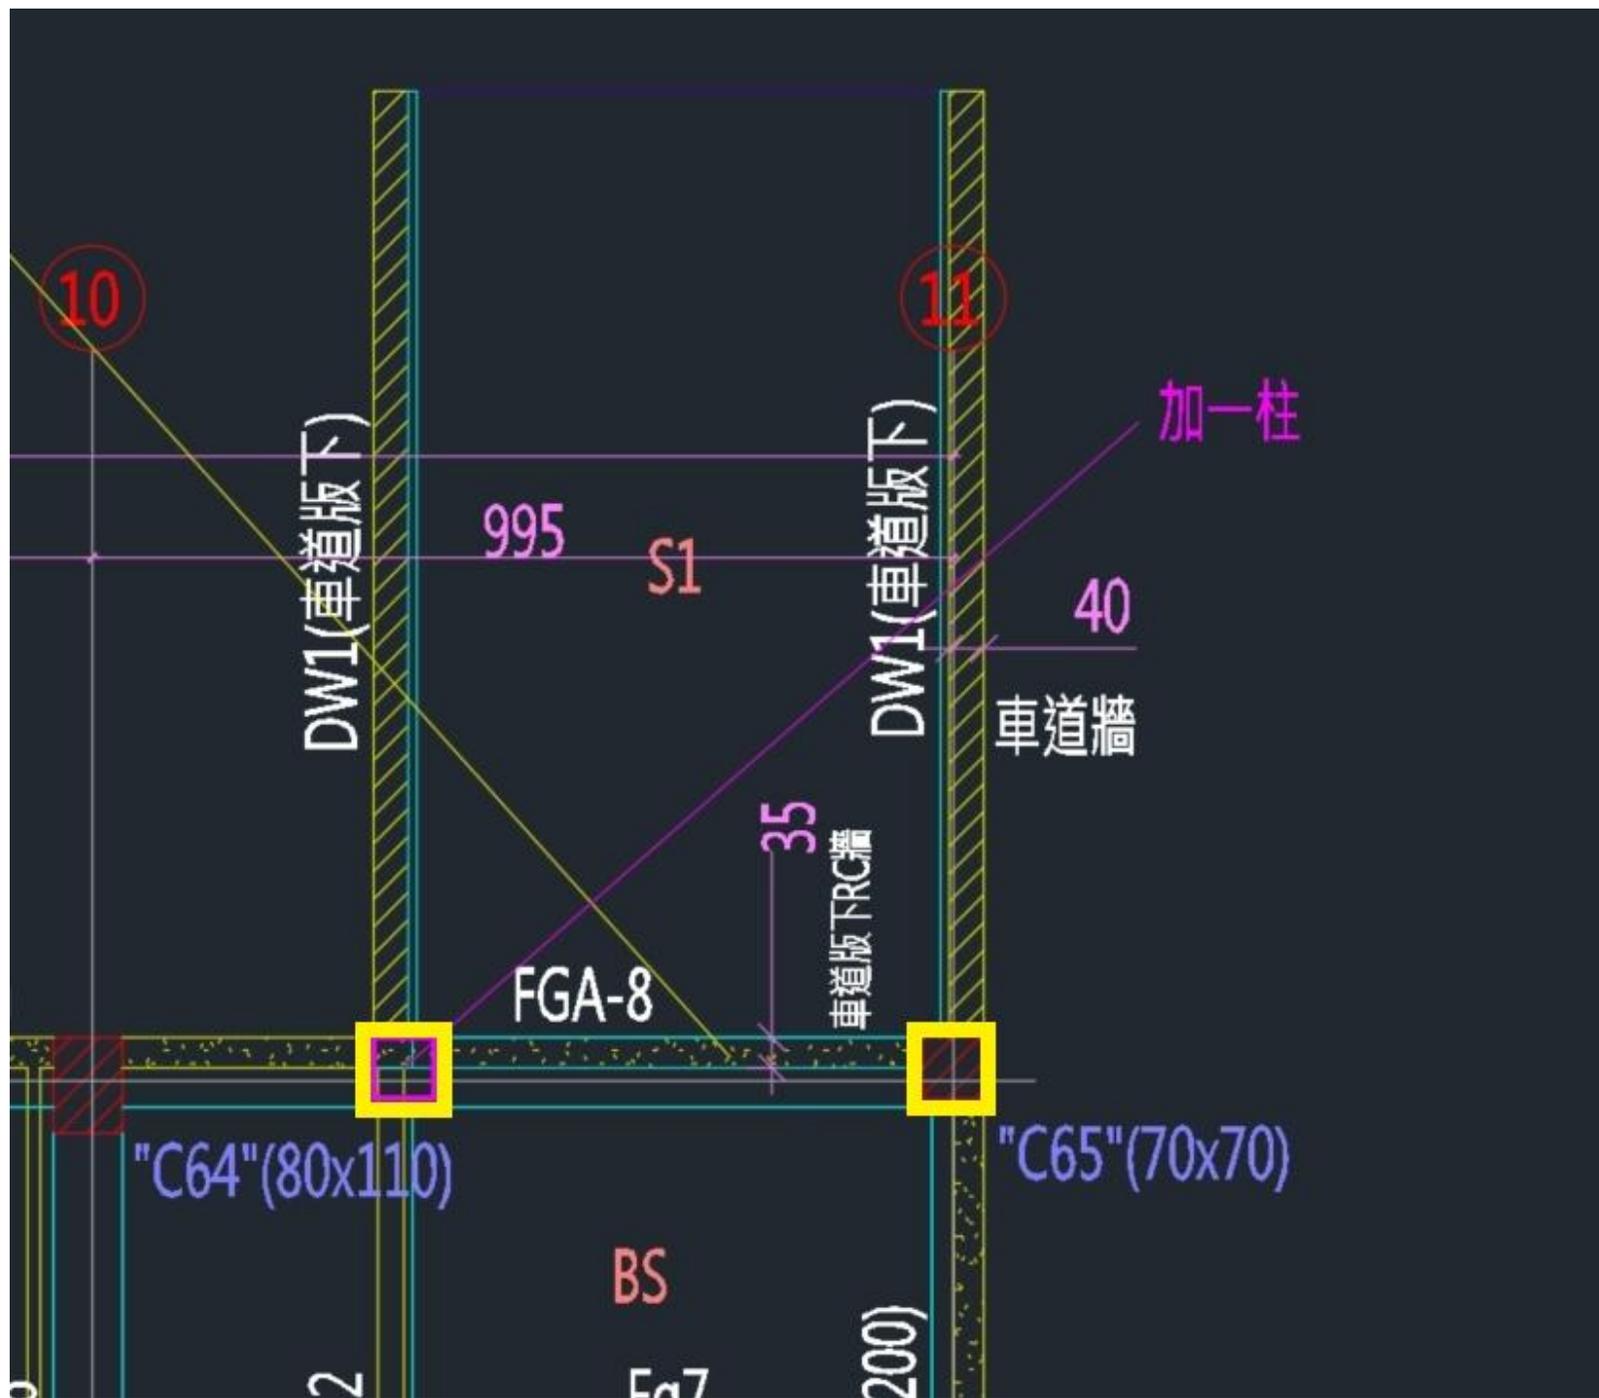

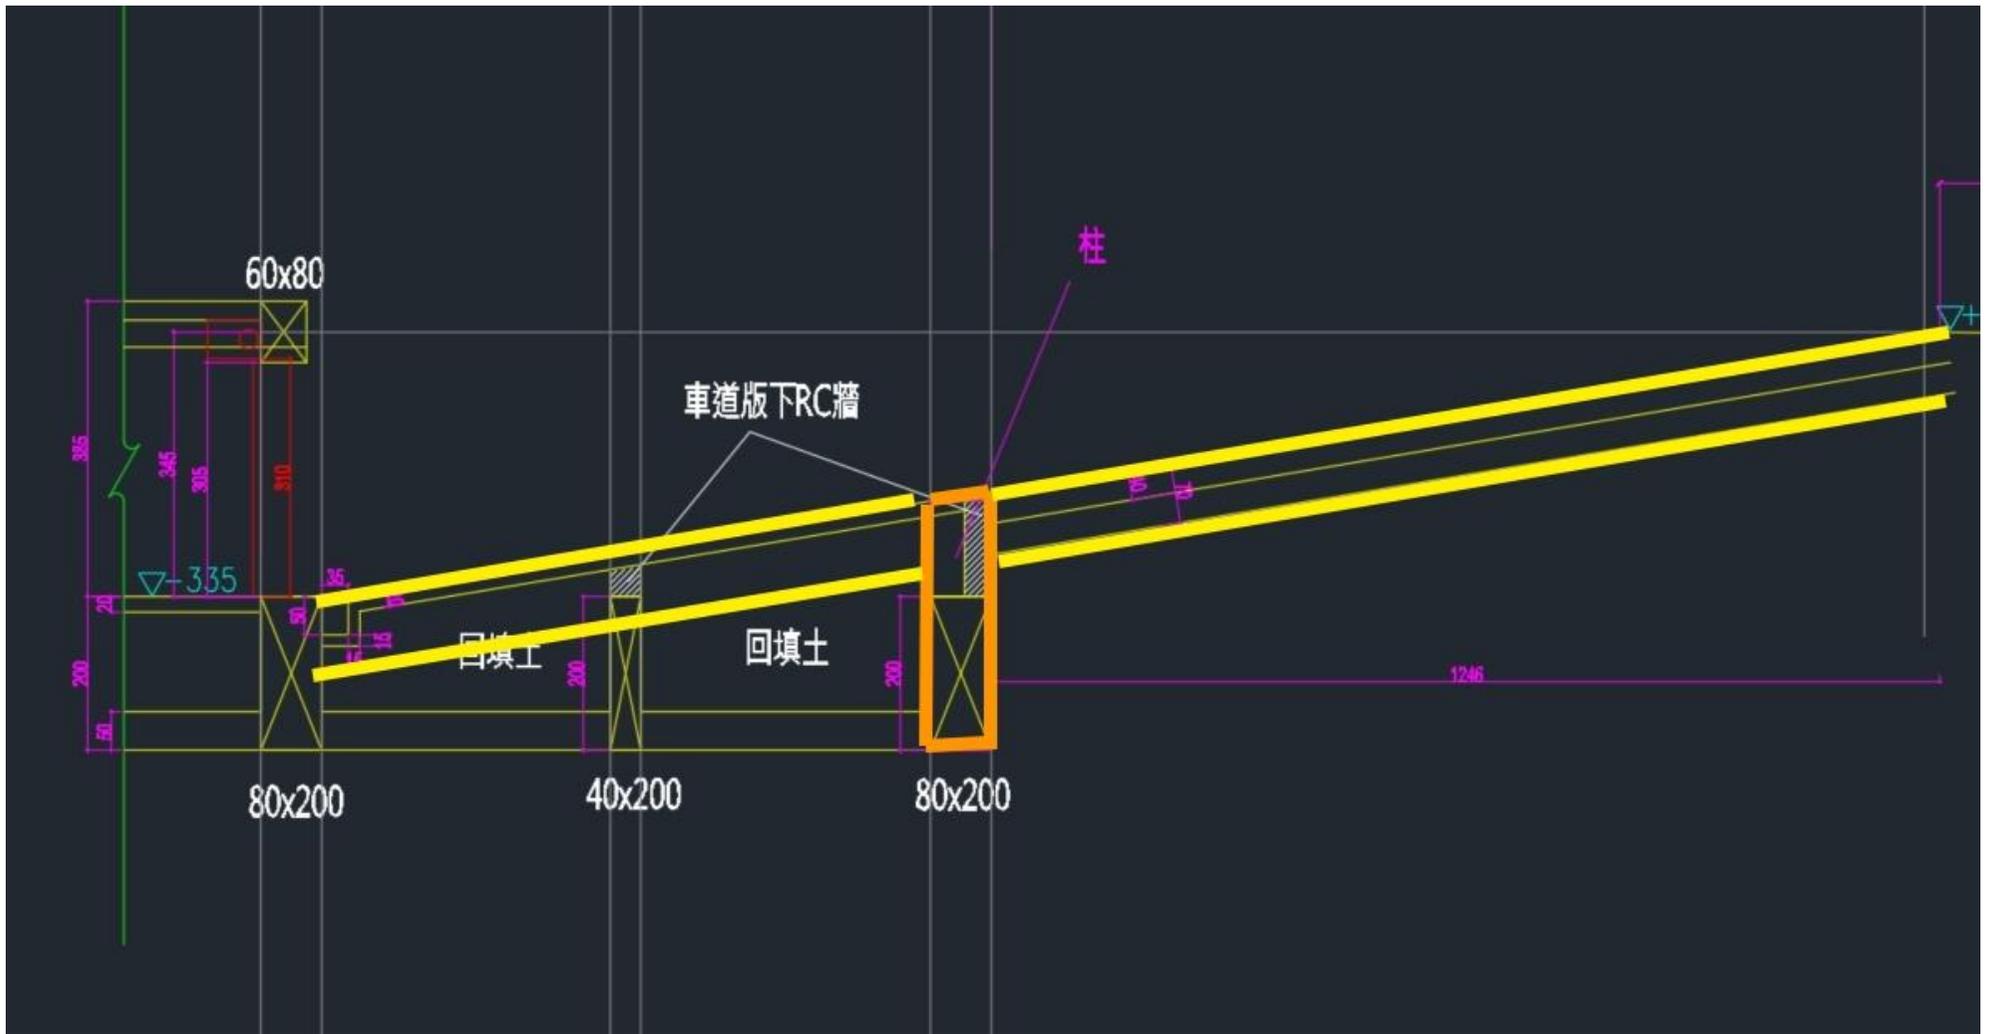

附件六：回填材料購買證明

楠峰實業股份有限公司

瀝青 混凝土出料單

誠信第一·品質保證

114 年 07 月 25 日

叫料專線：(05)6222999
總機電話：(05)6221858

送貨單號：HP14(7)158

客戶名稱	久木營造有限公司				料 別	刨除料			
交料地點	白潭-虎尾				數 量	24.28	累 計	24.28	
出料時間	08 : 32	黏層：	桶	累	桶	車 號	KLM-5820	車 次	1
到達時間		底油：	桶	計	桶	過磅資料	總重 39,200	空重 14,920	淨重 24,280
備註	※客戶要求加水後，預拌混凝土強度，本公司恕不負責。 會簽：				駐廠：	司機簽名 劉世視	收料人簽收		
					調度：方盈穎				

第二聯：司機收存

工廠地址：雲林縣虎尾鎮惠來里 145-10 號

F-15-02

楠峰實業股份有限公司

瀝青 混凝土出料單

誠信第一·品質保證

114 年 07 月 25 日

叫料專線：(05)6222999
總機電話：(05)6221858

送貨單號：HP14(7)158

客戶名稱	久木營造有限公司				料 別	刨除料			
交料地點	白潭-虎尾				數 量	25.52	累 計	49.80	
出料時間	09 : 06	黏層：	桶	累	桶	車 號	KLP-5575	車 次	2
到達時間		底油：	桶	計	桶	過磅資料	總重 41,520	空重 16,000	淨重 25,520
備註	※客戶要求加水後，預拌混凝土強度，本公司恕不負責。 會簽：				駐廠：	司機簽名 曹建華	收料人簽收		
					調度：方盈穎				

第二聯：司機收存

工廠地址：雲林縣虎尾鎮惠來里 145-10 號

F-15-02



楠峰實業股份有限公司

瀝青 混凝土出料單

叫料專線:(05)6222999
總機電話:(05)6221858

誠信第一·品質保證

114 年 07 月 25 日

送貨單號:HP14(07)158

客戶名稱	久木營造有限公司				料 別	刨除料			
交料地點	白蟬-虎尾				數 量	24.84	累 計	74.64	
出料時間	10 : 28	黏層:	桶	累	桶	車 號	KLM-5820	車 次	3
到達時間		底油:	桶	計	桶	過磅資料	總重 39,760	空重 14,920	淨重 24,840
備註	※客戶要求加水後,預拌混凝土強度,本公司恕不負責。 會簽:				駐廠:	司機簽名	劉世碩	收料人簽收	
					調度:	方盈穎			

第二聯:司機收存

工廠地址:雲林縣虎尾鎮惠來里145~10號

F-15-02

楠峰實業股份有限公司

瀝青 混凝土出料單

叫料專線:(05)6222999
總機電話:(05)6221858

誠信第一·品質保證

114 年 07 月 25 日

送貨單號:HP14(07)158

客戶名稱	久木營造有限公司				料 別	刨除料			
交料地點	白蟬-虎尾				數 量	23.60	累 計	98.24	
出料時間	11 : 03	黏層:	桶	累	桶	車 號	KLH-5575	車 次	4
到達時間		底油:	桶	計	桶	過磅資料	總重 39,600	空重 16,000	淨重 23,600
備註	※客戶要求加水後,預拌混凝土強度,本公司恕不負責。 會簽:				駐廠:	司機簽名	曹建華	收料人簽收	
					調度:	方盈穎			

第二聯:司機收存

工廠地址:雲林縣虎尾鎮惠來里145~10號

F-15-02

