

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國114年11月6日
發文字號：雲環行字第1140016813號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」第三次估驗，既經監造單位同意，同意核定，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所114年10月21日碩環字第1141021001號函。
- 二、第三次估驗資料1式3份，由久木營造有限公司、貴事務所及本局各執1份備查。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環境保護局

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

第三次估驗

主辦機關：雲林縣環境保護局

監造單位：吳建志賴人碩聯合建築師事務所

承包廠商：久木營造有限公司

估驗期間：114.09.01~114.09.30

共同投標估驗計價款各成員分配表

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

估驗日期：114年09月30日

估驗次別：第三次

成員名稱	本期分配金額	累計分配金額	廠商確認核章
久木營造有限公司	17,455,596	72,741,386	 
祥旺機電工程有限公司	0	0	 
正益空調工程有限公司	0	0	 
合計	17,455,596	72,741,386	

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

(契約編號：114-041)

工期計算統計表

項目 月別	日曆 天	免計日曆天		展延 日曆天	實際 日曆天	累計 日曆天	備註
		民俗 例假	其他 原因				
114年6月	14	0	0	0	14	14	1. 本工程 114.6.17 開工
114年7月	31	0	0	4	27	41	1. 114.07.07 丹納斯颱風申請展延工期 1 日 2. 114.07.08~114.07.10 申請展延工期 2.5 日 3. 114.07.28 申請展延工期 0.5 日
114年8月	31	0	0	4	27	68	1. 114.08.02~114.08.04 申請展延工期 3 日 2. 114.08.13 楊柳颱風申請展延工期 1 日
114年9月	30	0	0	0	30	98	
合計	106	0	0	8	98	98	

施工廠商



監造廠商



雲林縣環境保護局

工程採購估驗申請書(第三次估驗)

填表日期：114年09月30日

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		
主辦單位	雲林縣環境保護局		
監造單位	吳建志賴人碩聯合建築師事務所		
承包廠商	久木營造有限公司		
契約金額	607,000,000	變更後契約金額	
前次估驗金額	56,995,661 ✓	已估驗金額	56,995,661 ✓
本次估驗金額	17,995,460 ✓	累計估驗金額	74,991,121 ✓
實際開工日期	114年06月17日	預訂竣工日期	116年02月14日
本次估驗基準日	114年09月30日 ✓	前次估驗基準日	114年08月31日 ✓
本次估驗基準日之預定進度	7.620%	前次估驗基準日之預定進度	4.780%
本次估驗基準日之實際進度	12.737%	前次估驗基準日之實際進度	9.894%

檢附：估驗計價文件(1式3份)：

- 1. 工程採購估驗申請書。
- 2. 估驗計價單。
- 3. 計價保留金額計算。
- 4. 估驗計價總表。
- 5. 估驗計價明細表。
- 6. 估驗數量計算表。
- 7. 估驗基準日之施工日誌。
- 8. 物價指數調整工程款明細表。(無者免)
- 9. 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主)。

16 2024 9/30 施工日誌

廠商及負責人 (蓋章)	專任工程人員 (簽章)	監造單位 審查結果	監造單位 (蓋章)
	 朱宗信	☒ 符合契約約定。 ☐ 未符合契約約定。	 

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

第1頁共1頁 單位：元

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程		估驗次別	3	完成百分比	本次	2.96
工程編號		開工日期	原契約金額	607,000,000	百分比	累計	12.35
契約編號	114-041	履約期限	最近一次契約變更後之契約金額		已工作日數		106日曆天
廠商名稱	久木營造有限公司	估驗期間	累計撥付預付款		累計撥付未扣回預付款		
驗 估 細 表							
	估驗指數調整款(C)	物價指數調整款(D)	扣款(E)	保留款(F)	扣回預付款(G)	應付金額(H)	備註
本次	17,995,460			539,864		17,455,596	
截至前次累計	56,995,661			1,709,871		55,285,790	
截至本次累計	74,991,121			2,249,735		72,741,386	
本次「扣款」(E1)欄位內容說明：							
本次估驗自「應付金額」(H1)扣抵「建約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：							
監造單位  承包廠商 							
		承包廠商專任工程師					
		秘書					
		科長					
		承辦人					
		副局長					
		局長					

雲林縣環境保護局
估驗請款計價單

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				第3次付款		第1頁共1頁	
工程編號					預算施工金額	本期核發金額	17,455,596	
契約編號	114-041	實際開工日期	114年06月17日	承 包 金 額	607,000,000	本期核發金額	0	
工程地點	雲林縣虎尾鎮	規定完工期限	608日曆天	變更設計 增減金額	0	本期實發金額	17,455,596	
施工單位	久木營造有限公司	估驗日期	114年09月30日	應 應 增 減	0	以前核發金額	55,285,790	
				結果淨增、減	0	總計核發金額	72,741,386	
表								
估驗項目	原契約或追加減後總價	完成百分率		估驗計價	保留金額		核發金額	備註
		本次	累計		本次	累計		
施工費(114年09月30日)	607,000,000	2.96	12.35	74,991,121	539,864	2,249,735	17,455,596	
物價指數調整款(116年08月)								
合計				74,991,121	539,864	2,249,735	17,455,596	
項 目	金 額	本單所計價款及完成百分率已核對無訛，謹此發認。						專任工程人員：朱宗信
本 次		施工廠商：久木營造有限公司						
應 扣 還 金 額		負責人：賴雪燕						
合 計		中華民國 年 月 日(發票送達日期)						
監造單位	承辦人	科長		秘書		副局長		局長
								

副本

檔 號：

保存年限：

行政院公共工程委員會 函

630

雲林縣斗南鎮長安路一段115號

受文者：久木營造有限公司

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)李青蔚

(聯絡電話)02-87897728

(傳真)02-87897741

(E-mail)wei@mail.pcc.gov.tw



發文日期：中華民國112年12月29日

發文字號：工程管字第1120301425號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



主旨：「第23屆公共工程金質獎」得獎名單已公布於本會全球資訊網，請依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定辦理，請查照並轉知所屬(轄)。

說明：

- 一、依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定辦理。
- 二、旨揭得獎廠商已公告於政府電子採購網「優良廠商名單」資料庫，對得獎廠商之獎勵如下：

(一)公共工程品質優良獎及公共設施維護管理獎：

- 1、機關依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第33條之5規定，辦理減收優良廠商押標金、履約保證金或保固保證金之作業；其減收額度為原定應繳總額之百分之五十。
- 2、機關辦理工程及技術服務採購，依優良廠商得獎紀錄納為最有利標、評分及格最低標之評選加分項目，其方式為評審項目單獨列項。特優者，加五分；優等者，加三分；佳作者，加二分。
- 3、機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留款額度，特優者，減低百分之三；優等者，減低百分之二；佳作者，減低百分之一。
- 4、特優及優等者，得由機關依政府採購法規定優先邀請比價。

(二)特別貢獻獎：機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留款額度，特別貢獻獎五屆者（為獲公共工程品質優良獎連續五屆），減低百分之零點五；特別貢獻獎十屆者，減低百分之一；特別貢獻獎十五屆者，減低百分之一點五。

- 三、本案得獎廠商之獎勵期間，「佳作」自113年1月1日起1年，「特優」及「優等」自113年1月1日起2年。
- 四、如上述廠商已參與投標，並繳納相關押標金或保證金後方為優良廠商者，不溯及適用減收規定；減收後獎勵期間屆滿者，免補繳減收之金額。
- 五、「第23屆公共工程金質獎」得獎名單請逕至本會全球資訊網(<https://www.pcc.gov.tw/>)工程管理>公共工程金質獎項下載。


正本：總統府第三局、行政院秘書處、立法院秘書處、司法院秘書處、考試院秘書處、監察院秘書處、國家安全局、國家安全會議秘書處、審計部、行政院各部會行總處、直轄市政府、各縣市政府、各鄉鎮市區公所

副本：台灣世曦工程顧問股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、泰興工程顧問股份有限公司、榮工工程股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、宏義工程股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、恆康工程顧問股份有限公司、翔益營造有限公司、旭盛營造有限公司、仲冠工程顧問有限公司、義力營造股份有限公司、黎明工程顧問股份有限公司、松東營造股份有限公司、林同棧工程顧問股份有限公司、開源營造股份有限公司、嘉盛工程顧問有限公司、協誠營造股份有限公司、和建工程顧問股份有限公司、逢國營造有限公司、總福營造有限公司、新綠主義股份有限公司、富石營造有限公司、長泰營造股份有限公司、宜大國際景觀科技股份有限公司、正岳營造股份有限公司、鼎佑工程顧問有限公司、甲曄營造有限公司、泰普營造有限公司、洋活有限公司、金永發營造有限公司、境觀設計有限公司、金煌營造有限公司、湧基營造工程有限公司、吳旗清建築師事務所、許正璟建築師事務所、建皇營造工程有限公司、立成工程顧問有限公司、友宏營造股份有限公司、鼎晟工程顧問有限公司、來永營造有限公司、忠彥工程技術顧問股份有限公司、裕元營造股份有限公司、聯安工程顧問有限公司、皇林工程股份有限公司、坤鉅營造有限公司、永鉅技術顧問有限公司、瑞鋒營造股份有限公司、東山林工程有限公司、岡山營造有限公司、冠偉工程顧問有限公司、田茂營造事業有限公司、傑朋集成有限公司、中棧工程顧問股份有限公司、安倉營造股份有限公司、三源興股份有限公司、崇峻工程顧問有限公司、久旺營造股份有限公司、鴻成工程顧問有限公司、甲頂營造有限公司、大桂環境科技股份有限公司、黃苑景觀設計顧問有限公司、唐億營造股份有限公司、鴻威國際工程顧問股份有限公司、振勝營造有限公司、開巨技術顧問有限公司、郁東營造有限公司、源隆技術顧問有限公司、群輝營造工程有限公司、造齊工程顧問有限公司、昕豐營造有限公司、友上營造有限公司、豐華工程顧問股份有限公司、湧泉營造有限公司、亞際工程技術顧問有限公司、泰邦營造有限公司、立上營造有限公司、鋒璟工程顧問企業股份有限公司、昇意營造有限公司、王騰建築師事務所、三星營造股份有限公司、永龍企業股份有限公司、宗邁建築師事務所、春原營造股份有限公司、喻台生建築師事務所、建國工程股份有限公司、九典聯合建築師事務所、華興聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司、豪志工程股份有限公司、王正源建築師事務所、石昭永建築師事務所、美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、帆宣系統科技股份有限公司、吳嘉翔建築師事務所、合隆發營造股份有限公司、吳坤曜建築師事務所、日富營造股份有限公司、九建工程股份有限公司、馮則維建築師事務所、典興建築師事務所、東久營造工程有限公司、晁豎企業有限公司、高聚工程有限公司、誠蓄工程顧問股份有

限公司、余曉嵐建築師事務所、劉漢卿建築師事務所、億展聯合建築師事務所、鼎信營造有限公司、力曜機電科技有限公司、趙文弘建築師事務所、新科營造股份有限公司、賴銘昌建築師事務所、許育嘉建築師事務所、大將作營造股份有限公司、程俊強建築師事務所、福泰營造股份有限公司、李浚煒建築師事務所、久木營造有限公司、欣聯合建築師事務所、三暘營造有限公司、台灣高野景觀規劃股份有限公司、陳尚鋒建築師事務所、佳恩營造實業有限公司、詹益寧建築師事務所、張巽堯建築師事務所、見安營造股份有限公司、謝明修建築師事務所、坤達營造工程有限公司、楊宗維建築師事務所、百豐營造股份有限公司、吉興工程顧問股份有限公司、高堃營造股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、川崎重工株式會社、中國鋼鐵股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、華電聯網股份有限公司、中興電工機械股份有限公司、揚盛工程顧問股份有限公司、聖大營造股份有限公司、弘業聯合電機技師事務所、瑋辰工程有限公司、恒基工程顧問股份有限公司、翊榕環境設計有限公司、全勝園藝事業有限公司、喜來登水電工程有限公司、家有興營造有限公司、惠民實業股份有限公司、禾銘環境工程顧問有限公司、青山工程顧問股份有限公司、杜風工程服務股份有限公司、仁德工程有限公司、仝葉工程顧問有限公司、中欣行股份有限公司、定洋實業股份有限公司、台灣整合防災工程技術顧問有限公司、牛埔生態文史工作室、財團法人中興工程顧問社、昇樞科技有限公司

主任委員

吳澤成



司、限公
限公
造齊
股份
限公
限公、建
建有限公
公司、明
商傑師
建有限公
有東營
股份有

第23屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」得獎名單及等第

項次	類別	機關別	類別	工程名稱	主辦機關	洽辦單位	設計單位	監造單位	施工單位	分包單位	專業管理單位	等第		
												佳作	優等	特優
52	建築	地方	2	臺中市南屯區精密圍區停三立 燈停車場新建工程	臺中市停車管理處	-	趙文弘建築師事務所	趙文弘建築師事務所	新科營造股份有限公司	-	賴錦昌建築師事務所	V		
53	建築	中央	3	祝山車站改建工程	農業部林業及自然保育署 阿里山林業鐵路及文化資產管理處	-	許育森建築師事務所	許育森建築師事務所	大將營造股份有限公司	-	-			V
54	建築	地方	3	臺北氣象站(板橋站區)及氣象 儀器檢校中心合署辦公廳舍興 建工程	新北市政府新建工程處	交通部中央氣象署	程俊強建築師事務所	程俊強建築師事務所	福泰營造股份有限公司	-	-		V	
55	建築	地方	3	朱鳥國小老舊校舍拆除重建工 程	雲林縣二崙鄉朱鳥國民小 學	-	李凌波建築師事務所	李凌波建築師事務所	久木營造有限公司	-	-		V	
56	建築	地方	3	梗枋漁港卸魚場改建工程	宜蘭縣政府	-	欣聯合建築師事務所	欣聯合建築師事務所	三賜營造有限公司	-	-	V		
57	建築	地方	3	安農之心-張公園綠色旅遊 站興建工程	宜蘭縣政府	-	台灣高野景觀規劃股份有 限公司	陳尚澤建築師事務所	佳思營造實業有限公 司	-	-	V		
58	建築	中央	4	縣定古蹟阿里山貴賓館整修工 程	農業部林業及自然保育署 嘉義分署	-	詹益寧建築師事務所	詹益寧建築師事務所	施工單位因有公共工 程金質獎頒發作業要 點第9點第2項第1款之 事由，爰取消資格。	-	-			V
59	建築	地方	4	臺中市大雅區大雅國民小學附 設公共化幼兒園舍新建工程	臺中市政府教育局	臺中市大雅區大 雅國民小學	張果為建築師事務所	張果為建築師事務所	見安營造股份有限公司	-	-		V	
60	建築	地方	4	金門縣歷史建築-沙美張文帝 洋樓修繕暨活化工程	金門縣文化局	文化局文化資產 局	謝明修建築師事務所	程俊強建築師事務所	坤達營造工程有限公 司	-	-		V	

雲林縣環境保護局

計價保留金額計算(第4期,截至114年9月30日止)

項次	工作項目	成員編號1-(3%) 久木營造有限公司 假設、基礎、建築結構、鋼 構、木構、門窗、金屬、裝 修、防水、雜項、設備、景觀 工程	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司 電氣、弱電、給排水、消防工 程	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司 空調工程
甲.壹	建築工程	15,171,920.00		
甲.貳	機電工程			
	小計	15,171,920.00		
	第04期	100.00%		
甲.參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費 0.74%	619,169.25		
甲.肆	品質管制作業費 0.6%	132,500.00		
甲.伍	承包商管理及利潤費 8%	1,213,753.60		
甲.陸	臨時設施,工地縮時攝影	1,250.00		
甲.柒	營造綜合保險 0.25%			
甲.捌	營業稅 5%	856,867.14		
	小計	17,995,459.99	17,995,460	
	合計			
	保留金額小計	539,864		
	(B)保留金額合計		539,864	

物調保留金額計算

項次	工作項目	成員編號1-(3%) 久木營造有限公司	成員編號2-(5%) 祥旺機電工程有限公司	成員編號3-(5%) 正益空調工程有限公司
	小計			
	合計			
	物調保留金額小計			
	(D)保留金額合計			

核發金額核算


	本期估驗計價	17,995,460	
	-估驗計價保留款	539,864	
	本期物調指數		
	-物調指數保留款		
	總價(總計)	17,455,596	
	(E)核發金額合計		17,455,596

註: 1. 以上保留金額計算方式(第1成員:久木-3%)、(第2成員:祥旺-5%)、(第3成員:正益-5%)

2. 依契約第5條(一).2.(8), (第1成員:久木)估驗保留款減低為3%。

承包商:

監造單位:



雲林縣環境保護局


估驗計價總表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止)第 1 頁 共 2 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約金額		前期累計估驗金額		本期累計估驗金額		累計完成估驗金額	
			數量	單 價	總 價	數量	總 價	數量	總 價	數量
甲	發包工程費									
壹	建築工程									
一	假設及拆除工程		1	20,206,750	✓ 20,206,750	1	✓ 20,206,750	1	747,560.00	1
二	基礎工程		1	22,152,085	✓ 22,152,085	1	✓ 22,152,085	1	515,050.00	1
三	建築結構體工程		1	122,725,370	✓ 122,725,370	1	✓ 122,725,370	1	13,909,310.00	1
四	鋼構工程		1	28,800,734	✓ 28,800,734					
五	木構工程		1	25,366,336	✓ 25,366,336					
六	門窗工程		1	51,756,778	✓ 51,756,778					
七	金屬工程		1	44,582,805	✓ 44,582,805					
八	地坪裝修工程		1	18,757,610	✓ 18,757,610	1	✓ 18,757,610	1	174,800.00	1
九	牆面裝修工程		1	23,725,575	✓ 23,725,575					
十	坪頂裝修工程		1	20,177,200	✓ 20,177,200					
十一	防水工程		1	9,913,150	✓ 9,913,150	1	✓ 9,913,150	1	1,164,500.00	1
十二	雜項工程		1	12,147,925	✓ 12,147,925					
十三	設備工程		1	3,817,880	✓ 3,817,880					
十四	景觀工程		1	12,526,947	✓ 12,526,947					
	建築工程合計(甲.壹)			416,657,145	✓ 416,657,145		✓ 416,657,145		15,171,920.00	
貳	機電工程									
一	電氣工程		1	33,970,706	✓ 33,970,706					
二	弱電工程		1	24,731,200	✓ 24,731,200					
三	給排水設備工程		1	12,340,000	✓ 12,340,000					
四	消防工程		1	7,196,210	✓ 7,196,210					
五	空調工程		1	31,644,846	✓ 31,644,846					
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集		1	874,000	✓ 874,000					
	機電工程合計(甲.貳)			110,756,962	✓ 110,756,962					
	直接工程費用			527,414,107	✓ 527,414,107		✓ 527,414,107		15,171,920.00	

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價總表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止)第 2 頁 共 2 頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數 量	單 價	總 價	數 量	總 價	數 量	數 量	總 價	數 量	總 價	數 量	總 價
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)									990000/20(個月)		100% 數量計算		
一	職業安全衛生，可量化部分		1	234,187	✓ 234,187		✓ 58,546.75	1				1	58,546.75	
二	職業安全衛生，不可量化部分		1	990,000	✓ 990,000	1	✓ 148,500.00	1	1	49,500.00			198,000.00	
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)		1	2,178,677	✓ 2,178,677	1	✓ 544,669.25	1	1	544,669.25			1,089,338.50	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)		1	500,000	✓ 500,000	1	✓ 75,000.00	1	1	25,000.00			100,000.00	
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)									500000/20(個月)				
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)		1	2,650,000	✓ 2,650,000	1	✓ 397,500.00	1	1	132,500.00 → 90		1	530,000.00	
二	品質管理，材料設備檢驗試驗費		1	514,485	✓ 514,485	1	✓ 77,172.75	1				1	77,172.75	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.一~壹.二合計之8%)		1	42,193,129	✓ 42,193,129	1	✓ 3,820,724.28	1	1	1,213,753.60 → 8%		1	5,034,477.88	
	合計(甲.壹~甲.伍)			576,674,585	✓ 576,674,585		✓ 52,881,166.53			17,137,342.85			70,018,509.38	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)		1	50,000	✓ 50,000	1	✓ 28,750.00	1	1	1,250.00		1	30,000.00	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1	1,441,686	✓ 1,441,686	1	✓ 1,441,686.00					1	1,441,686.00	
捌	營業稅(甲.壹~甲.伍合計5%)		1	28,833,729	✓ 28,833,729	1	✓ 856,867.14	1	1	856,867.14		1	3,500,925.47	
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)			607,000,000	✓ 607,000,000		✓ 56,995,660.86			17,995,459.99		50	74,991,120.85	
	總價(總計)			607,000,000	✓ 607,000,000		✓ 56,995,661			17,995,460			74,991,121	

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 1 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
甲	發包工程費													
壹	建築工程													
一	假設及拆除工程													
1	工地拆除、拆除、清除與整平，含運棄(含既有行人道、景觀及既有雜項物)	式	1.00	350,000	✓ 350,000	0.50	175,000.00			-	0.50	175,000.00		
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬	M	300.00	1,550	✓ 465,000	150.00	232,500.00				150.00	232,500.00		
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤ 高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬	M	525.00	6,000	✓ 3,150,000	472.00	2,832,000.00			-	472.00	2,832,000.00		
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)	樁	2.00	48,500	✓ 97,000	1.70	82,450.00				1.70	82,450.00		
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)	樁	1.00	28,500	✓ 28,500	0.80	22,800.00				0.80	22,800.00		
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆	座	1.00	77,500	✓ 77,500	0.90	69,750.00				0.90	69,750.00		
7	環境保護，工區臨時排水工程，含沉澱池	式	1.00	120,000	✓ 120,000	0.575	69,000.00		0.025	3,000.00	0.600	72,000.00		
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)	式	1.00	36,000	✓ 36,000	0.50	18,000.00				0.50	18,000.00		
9	竣工文件，竣工銘牌(不鏽鋼80*50*2mm 蝕刻字體及平面配置圖)	式	1.00	50,000	✓ 50,000		-							
10	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等	棟	1.00	230,000	✓ 230,000	1.00	230,000.00				1.00	230,000.00		

承包廠商：
監造單位：

雲林縣環境保護局



估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 2 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)	式	1.00	66,890	✓ 66,390	1.00	✓ 66,890.00				1.00		66,890.00	
12	工地臨時建築設施，臨時廁所	組	1.00	37,800	✓ 37,300	1.00	✓ 37,800.00				1.00		37,800.00	
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設	式	1.00	150,000	✓ 150,000	1.00	✓ 150,000.00				1.00		150,000.00	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	38,000	✓ 760,000	3.00	✓ 114,000.00	1.00		38,000.00	4.00		152,000.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	690	✓ 5,982,990	500.00	✓ 345,000.00	1,024.00		706,560.00	1,524.00		1,051,560.00	
16	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(結構挑高區室內架)	M2	3,822.00	440	✓ 1,681,580									
17	施工輔助設施，內部施工活動架，鍍鋅鋼管，裝拆(含租金)，含各安全配件(裝修挑高區室內架)	M2	2,947.00	440	✓ 1,296,580									
18	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，裝拆(含租金)	M3	8,361.00	310	✓ 2,591,910									
19	工地清理，交屋清潔費	式	1.00	1,000,000	✓ 1,000,000									
20	動土典禮及完工啟用典禮	式	1.00	500,000	✓ 500,000	0.50	✓ 250,000.00				0.50		250,000.00	
21	工地清理，營建混合物申報及處理、運棄費、合法處理及證明文件	m2	10,528.00	100	✓ 1,052,300									
22	資料送審〔含竣工圖、竣工資料製作、建築勘驗使用執照申辦取得相關費用(含無障礙勘驗申辦取得等)、綠建築標章作業及報告書製作、各式文書作業雜項費用〕	式	1.00	350,000	✓ 350,000									
23	工區結構物及設施復原	式	1.00	132,000	✓ 132,000									

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 3 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	小計				✓20,206,750			✓4,695,190.00		747,560.00		5,442,750.00		
二	基礎工程													
1	施工測量，工地放樣	M2	19,980.00	50	✓999,000	5,460.00	✓273,000.00			-	5,460.00	273,000.00		
2	構造物開挖，機械挖，含近運暫存	M3	24,525.00	300	✓7,357,500	17,789.90	✓5,336,968.50				17,789.90	5,336,968.50		
3	構造物回填，原材料回填，含運費，85%≤壓實度	M3	11,610.00	300	✓3,483,000	1,300.00	✓390,000.00			-	1,300.00	390,000.00		
4	廢方處理，含揚塵抑制，含近運堆置	M3	12,915.00	247	✓3,190,005	12,915.00	✓3,190,005.00				12,915.00	3,190,005.00		
5	隧道噴凝土，175kgf/cm2，t=5cm	M2	3,642.00	1,390	✓5,062,380	1,435.00	✓1,994,650.00				1,435.00	1,994,650.00		
6	安全觀測系統	式	1.00	140,200	✓140,200	0.75	✓105,150.00			35,050.00	1.00	140,200.00		
7	抽水，點井，深度<6m	支	48.00	40,000	✓1,920,000	36.00	✓1,440,000.00			480,000.00	48.00	1,920,000.00		
	小計				✓22,152,085		✓12,729,773.50			515,050.00		13,244,823.50		
三	建築結構體工程													
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	1,110	✓34,695,270	3,689.00	✓4,094,790.00			8,115,210.00	11,000.00	12,210,000.00		
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	1,200	✓8,060,400					2,421,600.00	2,018.00	2,421,600.00		
3	銲接鋼線網，點焊鋼線網 7×7×150×150mm	M2	57.00	500	✓28,500									
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	33,000	✓46,563,000	405.00	✓13,365,000.00			2,937,000.00	494.00	16,302,000.00		
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級	個	4,729.00	250	✓1,182,250					363,000.00	1,452.00	363,000.00		
6	結構用凝土，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	295.00	3,000	✓885,000	293.00	✓879,000.00			6,000.00	295.00	885,000.00		
7	結構用凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	3,500	✓29,578,500	2,946.00	✓10,311,000.00			66,500.00	2,965.00	10,377,500.00		
8	水泥凝土鋪面，t=40cm，輕質凝土	M3	55.00	2,500	✓137,500									
9	砌紅磚，紅磚，1/2B，連工帶料(含1:3水泥砂漿、吊運費及工資)	M2	21.00	750	✓15,750									
10	凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	10,528.00	150	✓1,579,200	2,300.00	✓345,000.00			-	2,300.00	345,000.00		

承包商：



監造單位：



雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 4 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	總價
	小計				✓ 22,725,370		✓ 28,994,790.00				13,909,310.00			42,904,100.00
四	鋼構工程													
1	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，SN400B，含加工及組立	T	51.00	82,000	✓ 4,182,000									
2	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，A36，含加工及組立	T	2.00	82,000	✓ 164,000									
3	結構用鋼材，建築結構用軋鋼料，基礎鋼板、接合鋼板、加勁鋼板，含加工及組立	T	9.00	82,000	✓ 738,000									
4	建築鋼結構，鋼構工程，扁管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	183.00	89,000	✓ 16,287,000									
5	建築鋼結構，鋼構工程，方管鋼，鋼構製作(含運輸、安裝組立)	T	8.00	89,000	✓ 712,000									
6	鋼柱基礎螺栓及埋設M24	支	88.00	650	✓ 57,200									
7	鋼樑基礎螺栓及埋設M24	支	224.00	650	✓ 145,600									
8	高拉力螺栓 M22 S10T	支	1,294.00	85	✓ 109,990									
9	剪力釘 ϕ 22mm L=125mm	支	504.00	36	✓ 18,144									
10	拉桿 R16	組	12.00	3,600	✓ 43,200									
11	鋼柱底無收縮水泥灌漿	處	41.00	1,500	✓ 61,500									
12	鋼樑無收縮水泥灌漿	處	156.00	1,500	✓ 234,000									
13	鋼材專業塗裝，防火	M2	6,264.00	895	✓ 5,606,280									
14	鍍鋅鋼承板工料 3W(1.2mmTH)	M2	51.00	820	✓ 41,820									
15	建築鋼結構，鋼構製作(含試裝、運輸、安裝及接合等)	式	1.00	400,000	✓ 400,000									
	小計				✓ 28,800,734									
五	木構工程													
1	粗木作，大型原木結構，GLT(柱+樑+斜撐)	才	22,429.00	245	✓ 5,495,105									

承包廠商：

監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 10 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量
八	地坪裝修工程													
1	鋪地磚，止滑地磚，含打底，(F1)	M2	600.00	1,530	✓ 918,000									
2	鋪地磚，亞麻地坪，含打底，(F2)	M2	3,158.00	1,900	✓ 6,000,200									
3	鋪地磚，鑲面磨石子地磚，含打底，(F3)	M2	1,631.00	1,560	✓ 2,544,360									
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)	M2	658.00	460	✓ 302,680	380.00	✓ 174,800.00					380.00	174,800.00	
5	鋪地磚，止滑地磚30*60cm，含打底，(F5-1)	M2	201.00	1,725	✓ 346,725									
6	鋪地磚，止滑地磚30*30cm，含打底，(F5-2)	M2	118.00	1,725	✓ 203,550									
7	地毯，連工帶料，含底塗料、防水黏膠及工資，1:3水泥砂漿打底另計(F6)	M2	302.00	2,240	✓ 676,480									
8	鋪地磚，石塑地板(木紋)，含打底，(F7)	M2	86.00	1,975	✓ 169,850									
9	環氧樹脂砂漿地坪，石英砂(F9)	M2	2,026.00	990	✓ 2,005,740									
10	鋪地磚，屋頂隔熱磚+高架式木地板，含打底，(F10)	M2	587.00	5,500	✓ 3,228,500									
11	鋪地磚，屋頂隔熱磚，含打底，(F11)	M2	1,369.00	1,725	✓ 2,361,525									
	小計				✓ 18,757,610		✓ 174,800.00						174,800.00	
九	牆面裝修工程													
1	水性水泥漆，1底2度，水泥砂漿打底，面層粉光(W1)	M2	12,374.00	1,150	✓ 14,230,100									
2	鋪貼壁磚，含打底(W3)	M2	1,281.00	2,025	✓ 2,594,025									
3	水泥砂漿打底，面層粉光(W5)	M2	1,533.00	1,150	✓ 1,762,950									
4	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	830.00	2,150	✓ 1,784,500									
5	外牆紋理砂石塗料，水泥砂漿打底，一底二度(W6)	M2	1,560.00	2,150	✓ 3,354,000									

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 11 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	二度, (W8)													
	小計				✓23,725,575									
十	坪頂裝修工程													
1	暗架金屬網天花, 舍水泥砂漿打底, 面層批土磨平(C1)	M2	2,163.00	2,950	✓6,380,850									
2	水性水泥漆, 1底2度, 水泥砂漿打底, 面層批土磨平(C2)	M2	6,110.00	1,100	✓6,721,000									
3	暗架砂酸鈣板天花, 舍面層磨平批土噴漆(C3)	M2	2,025.00	1,190	✓2,409,750									
4	木格柵天花(C5)	材	6,480.00	720	✓4,665,600									
	小計				✓20,177,200									
十一	防水工程													
1	塗液類防潮, 地下室外牆防水, 舍回填保護(筏基外牆), (WP1)	M2	1,390.00	920	✓1,278,800									
2	塗液類防潮, 筏基水池防水(五面施工)及地下室外牆內側防水, (WP2)	M2	2,875.00	600	✓1,725,000									
3	塗液類防潮, 電梯機坑防水(五面施工), (WP3)	M2	57.00	600	✓34,200									
4	塗液類防潮, 地下室外露地坪及牆面防水, H=30cm(WP4)	M2	1,073.00	1,500	✓1,609,500									
5	塗液類防潮, 基礎底板防水, (WP5)	M2	2,740.00	425	✓1,164,500	2,740.00	✓1,164,500.00				2,740.00	1,164,500.00		
6	塗液類防潮, 外牆樓層接縫防水, W=30cm, (WP6)	M	930.00	280	✓260,400									
7	塗液類防潮, 窗框接縫及窗台防水, W=30cm(WP7)	M	2,122.00	275	✓583,550									
8	塗液類防潮, 屋頂平台及牆面防水, H=	M2	1,989.00	1,500	✓2,983,500									

承包廠商：

監造單位：




雲林縣環境保護局
估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 12 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量
	30cm, (WP8)													
9	塗液類防潮, 浴廁地壁防水, (WP9)	M2	782.00	350	✓ 273,700									
	小計				✓ 9,913,150		✓ 1,164,500.00						1,164,500.00	
十二	雜項工程													
1	無障礙電動升降梯, 載人用(含人貨兩用, 附殘障設備), 60m/min, 無障礙電梯 (B1F-6F, 7停), 12人座	台	1.00	2,280,500	✓ 2,280,500									
2	無障礙電動升降梯, 載人用(含人貨兩用, 附殘障設備), 60m/min, 無障礙電梯 (B1F-6F, 7停), 15人座	台	2.00	2,428,000	✓ 4,856,000									
3	捲簾, 電動式, 電梯遮運用	組	21.00	52,000	✓ 1,092,000									
4	金屬製品(電梯緩衝坑內不銹鋼爬梯 H=175cm)	支	3.00	14,760	✓ 44,280									
5	金屬製品(筏基水池不銹鋼爬梯 H=100cm)	支	11.00	11,340	✓ 124,740									
6	金屬製品(屋頂不銹鋼爬梯 H=390cm)	支	2.00	45,000	✓ 90,000									
7	浴廁強化美耐板隔間, 小便斗隔板	組	19.00	1,860	✓ 35,340									
8	浴廁強化美耐板隔間, 隔間及門板	M2	193.00	4,215	✓ 813,495									
9	伸縮縫蓋板組裝, SUS 304不銹鋼板(地坪伸縮縫6mm蓋板W=25cm)	M	25.00	10,900	✓ 272,500									
10	伸縮縫蓋板組裝, SUS 304不銹鋼板(坪頂伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	6.40	6,700	✓ 42,880									
11	伸縮縫蓋板組裝, SUS 304不銹鋼板(外牆伸縮縫1.5mm蓋板W=25cm)	M	17.20	6,700	✓ 115,240									
12	金屬材料(防臭型方蓋方框鑄鐵化妝人孔蓋 80*80cm)	組	11.00	15,000	✓ 165,000									
13	不銹鋼無障礙警示帶, 電梯用(30*60cm)	處	21.00	4,500	✓ 94,500									

承包廠商：監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 14 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價
s	戶外掛地式投射燈，連工帶料	盞	30.00	4,300	✓ 129,000								
t	上項燈具用防水型變壓器 20W，連工帶料	個	30.00	500	✓ 15,000								
u	戶外嵌入式壁燈，連工帶料	盞	13.00	4,300	✓ 55,900								
v	線性泛光嵌燈，連工帶料	盞	203.00	3,800	✓ 771,400								
w	泛光圓嵌燈，連工帶料	盞	122.00	600	✓ 73,200								
	小計				✓ 3,817,880								
十四	景觀工程												
1	鋪地磚，30*30戶外地磚(深灰)(L3)	M2	1,635.00	2,355	✓ 3,850,425								
2	鋪地磚，30*30戶外地磚(淺灰)(L4)	M2	660.00	2,355	✓ 1,554,300								
3	瀝青混凝土鋪面，(第1類型，密級配)，粗粒料37.5mm，黏度AC-20(L6)	M3	1,200.00	2,180	✓ 2,616,000								
4	高壓連鎖磚鋪面修復	式	1.00	143,982	✓ 143,982								
5	無障礙停車位劃線350*600cm	式	3.00	5,000	✓ 15,000								
6	停車位劃線250*550cm	式	88.00	1,500	✓ 132,000								
7	排水管溝，UA型，場鑄，含不銹鋼化妝蓋版	M	282.00	12,780	✓ 3,603,960								
8	排水管溝，UB型，暗溝，場鑄	M	32.00	6,290	✓ 201,280								
9	陰井，含蓋，GA型	組	20.00	8,000	✓ 160,000								
10	陰井，含蓋，GB型	組	15.00	10,000	✓ 150,000								
11	基地內水溝銜接至外溝設置費	式	1.00	100,000	✓ 100,000								
	小計				✓ 12,526,947								
	建築工程合計(甲.壹)				✓ 416,657,145				✓ 47,759,053.50		15,171,920.00		62,930,973.50
貳	機電工程												
一	電氣工程	式											
1	開關箱工程	式											
a	MOF PANEL	式											

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 135 頁 共 136 頁

項次	項目及說明	單位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額		
			數量	單價	總價	數量	總價	數量	數量	總價	數量	總價	數量	總價
	小計				398,202									
	空調工程合計(甲.貳.五)				31,644,346									
六	機電工程施工圖繪製與竣工圖整理資料收集	式	1.00	874,000	874,000									
	機電工程合計(甲.貳)				110,756,962									
	直接工程費用				527,414,107					47,759,053.50		15,171,920.00		62,930,973.50
參	職業安全衛生管理作業費及環境保護經費(合計約直接工程費用0.74%)													
一	職業安全衛生，可量化部分	式	1.00	234,187	234,187	0.25	58,546.75			-	0.25	58,546.75		
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	990,000	990,000	0.15	148,500.00	0.05		49,500.00	0.20	198,000.00		
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	2,178,677	2,178,677	0.25	544,669.25	0.25		544,669.25	0.50	1,089,338.50		
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	500,000	500,000	0.15	75,000.00	0.05		25,000.00	0.20	100,000.00		
肆	品質管制作業費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項、機電設備運轉測試等費用，(合計約直接工程費用0.6%)													
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	2,650,000	2,650,000	0.15	397,500.00	0.05		132,500.00	0.20	530,000.00		
二	品質管理，材料設備檢驗試驗費	式	1.00	514,485	514,485	0.15	77,172.75			-	0.15	77,172.75		
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關牽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用)，(壹.~壹.二合計之8%)		1.00	42,193,129	42,193,129		3,820,724.28			1,213,753.60		5,034,477.88		
	合計(甲.壹~甲.伍)				576,674,585		52,881,166.53			17,137,342.85		70,018,509.38		

承包廠商：



監造單位：



雲林縣環境保護局

估驗計價明細表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第136頁 共136頁

項次	項 目 及 說 明	單 位	契約金額			前期累計估驗金額			本期累計估驗金額			累計完成估驗金額	
			數 量	單 價	總 價	數 量	總 價	數 量	數 量	總 價	數 量	總 價	總 價
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	50,000	✓50,000	0.575	✓28,750.00	0.025		1,250.00	0.600	30,000.00	
柒	營造綜合保險(甲.壹~甲.伍合計0.25%)		1.00	1,441,686	✓1,441,686	1.000	✓1,441,686.00				1.00	1,441,686.00	
捌	營業稅,(甲.壹~甲.伍合計5%)		1.00	28,833,729	✓28,833,729		✓2,644,058.33			856,867.14		3,500,925.47	
	發包工程費合計(甲.壹~甲.捌)				✓607,000,000		✓6,995,660.86			17,995,459.99		74,991,120.85	
	總價(總計)				✓607,000,000		✓56,995,661			17,995,460		74,991,121	

承包廠商：




監造單位：



雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 1 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
一	假設及拆除工程					
7	環境保護，工區臨時排水工程，含沉澱池	式	1.00	●請款比例：設備0.5+抽排水0.5式，截至7月底已請0.5式 ●本期請款數量0.5/20月=0.025式	0.025	
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費	月	20.00	本期請款數量1月(9月)	1.00	
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架	M2	8,671.00	●B1F:14.44+1510.15=1524.59 M2 ●截至8月底已請500 M2 ●本期請款數量1524-500=1024 M2	1,024.00	附件1
二	基礎工程					
6	安全觀測系統	式	1.00	本期請款數量1/4=0.25式	0.25	
7	排水，點井，深度<6m	支	48.00	本期請款數量48/4=12支	12.00	
三	建築結構體工程					
1	普通模板，(建築，建築物)	M2	31,257.00	●F層+B1F:5182.51+5822.74=11005.25 M2，截至8月底已請3689 M2 ●本期請款數量11000-3689=7311 M2	7,311.00	附件2
2	清水模板，(建築，建築物)	M2	6,717.00	●B1F頂版:2018.53 M2 ●本期請款數量2018 M2	2,018.00	附件2
4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	1,411.00	●鋼筋料單：基礎342.654+BS版66.634+1F柱牆84.65=493.938 T ●截至8月底已請405 T ●本期請款數量494-405=89 T	89.00	附件3
5	鋼筋，鋼筋鐵接器，SA級	個	4,729.00	●#10:28+28=56個，#8:698+698=1396個，合計56+1396=1452個 ●本期請款數量1452個	1,452.00	附件4
6	結構用混凝土，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	295.00	●筏基:150+126=276 M3，土方回填區:45 M3，合計276+45=321 M3 ●截至8月底已請293 M3 ●本期請款數量295-293=2 M3	2.00	附件5
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實	M3	8,451.00	●9/13車道版及牆RC:19 M3 ●本期請款數量19 M3	19.00	附件6



承攬廠商：



監造單位：




雲林縣環境保護局 估驗數量計算表

估驗次數：第 3 次，第 4 期估驗工程款(截至114年9月30日止) 第 2 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	契約數量	計算式	請款數量	備註
二	職業安全衛生，不可量化部分	式	1.00	●本期施作完成金額49,500元 ●本期請款金額49,500元 ●本期尚未請款金額0元	0.05	
三	環境保護，環境保護措施(可量化部分)	式	1.00	●前期已施作完成金額863,357.175元 第4.13~17項329,627.375元 第1~3.5~6.11項33,331.5元 第8項353,728.3元 第10.12項146,670元 ●前期未請款金額536,555.625元 ✓ ●本期施作完成金額25,442.125元 第4.13~17項14,331.625元 第1~3.5~6.11項11,110.5元 ●本期請款金額544,669.25元 ●本期尚未請款金額17,328.5元	0.25	
四	環境保護，環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00	●本期施作完成金額25,000元 ●本期請款金額25,000元 ●本期尚未請款金額0元	0.05	
一	品質管理，品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00	●本期施作完成金額132,500元 ●本期請款金額132,500元 ✓ ●本期尚未請款金額0元	0.05	
陸	臨時設施，工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00	●請款比例：設備0.5-剪輯0.5式 ●本期請款數量0.5/20=0.025式	0.025	

承包廠商：







監造單位：



金益開發9月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程編號：JY1140021

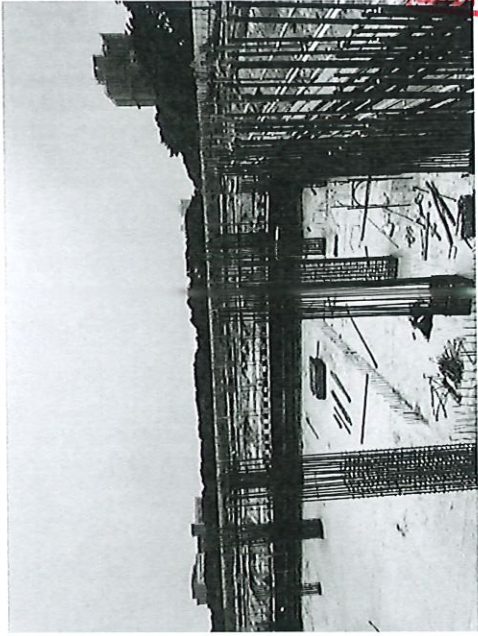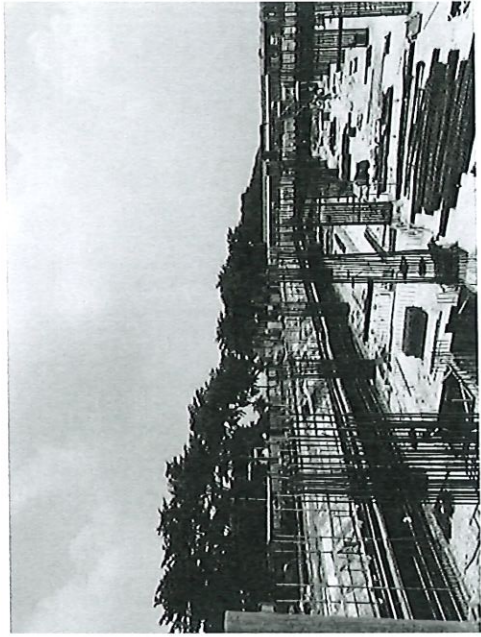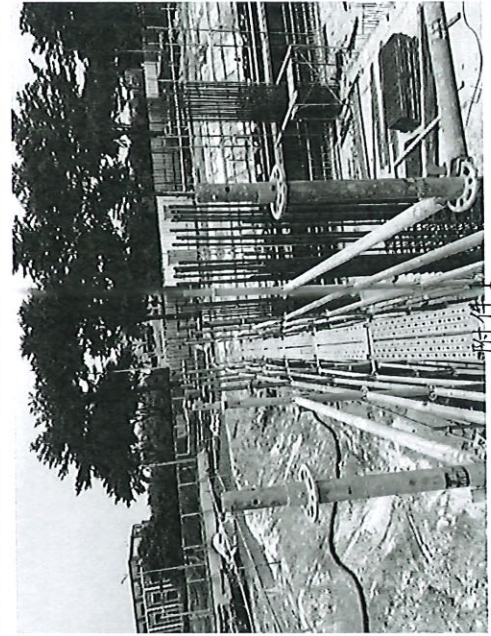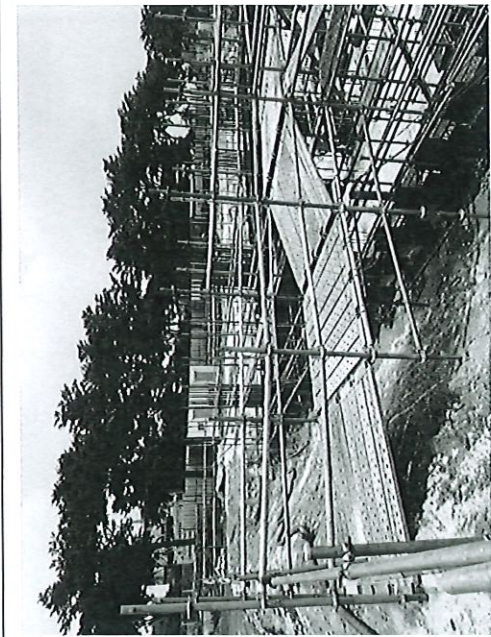

外架			
型式	長	高	小計
1829	4.877	1	4.88
1829	1.829	1.9	3.48
1829	1.829	3.325	6.08
722	7.316	5.225	38.23
722	221.341	6.65	1471.92
總計/M2			1829
			722
			14.44
			1510.15

梯 4


壁拉桿 35



金益開發9月份搭架完工確認估驗單

工程名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

工程編號：JY1140021

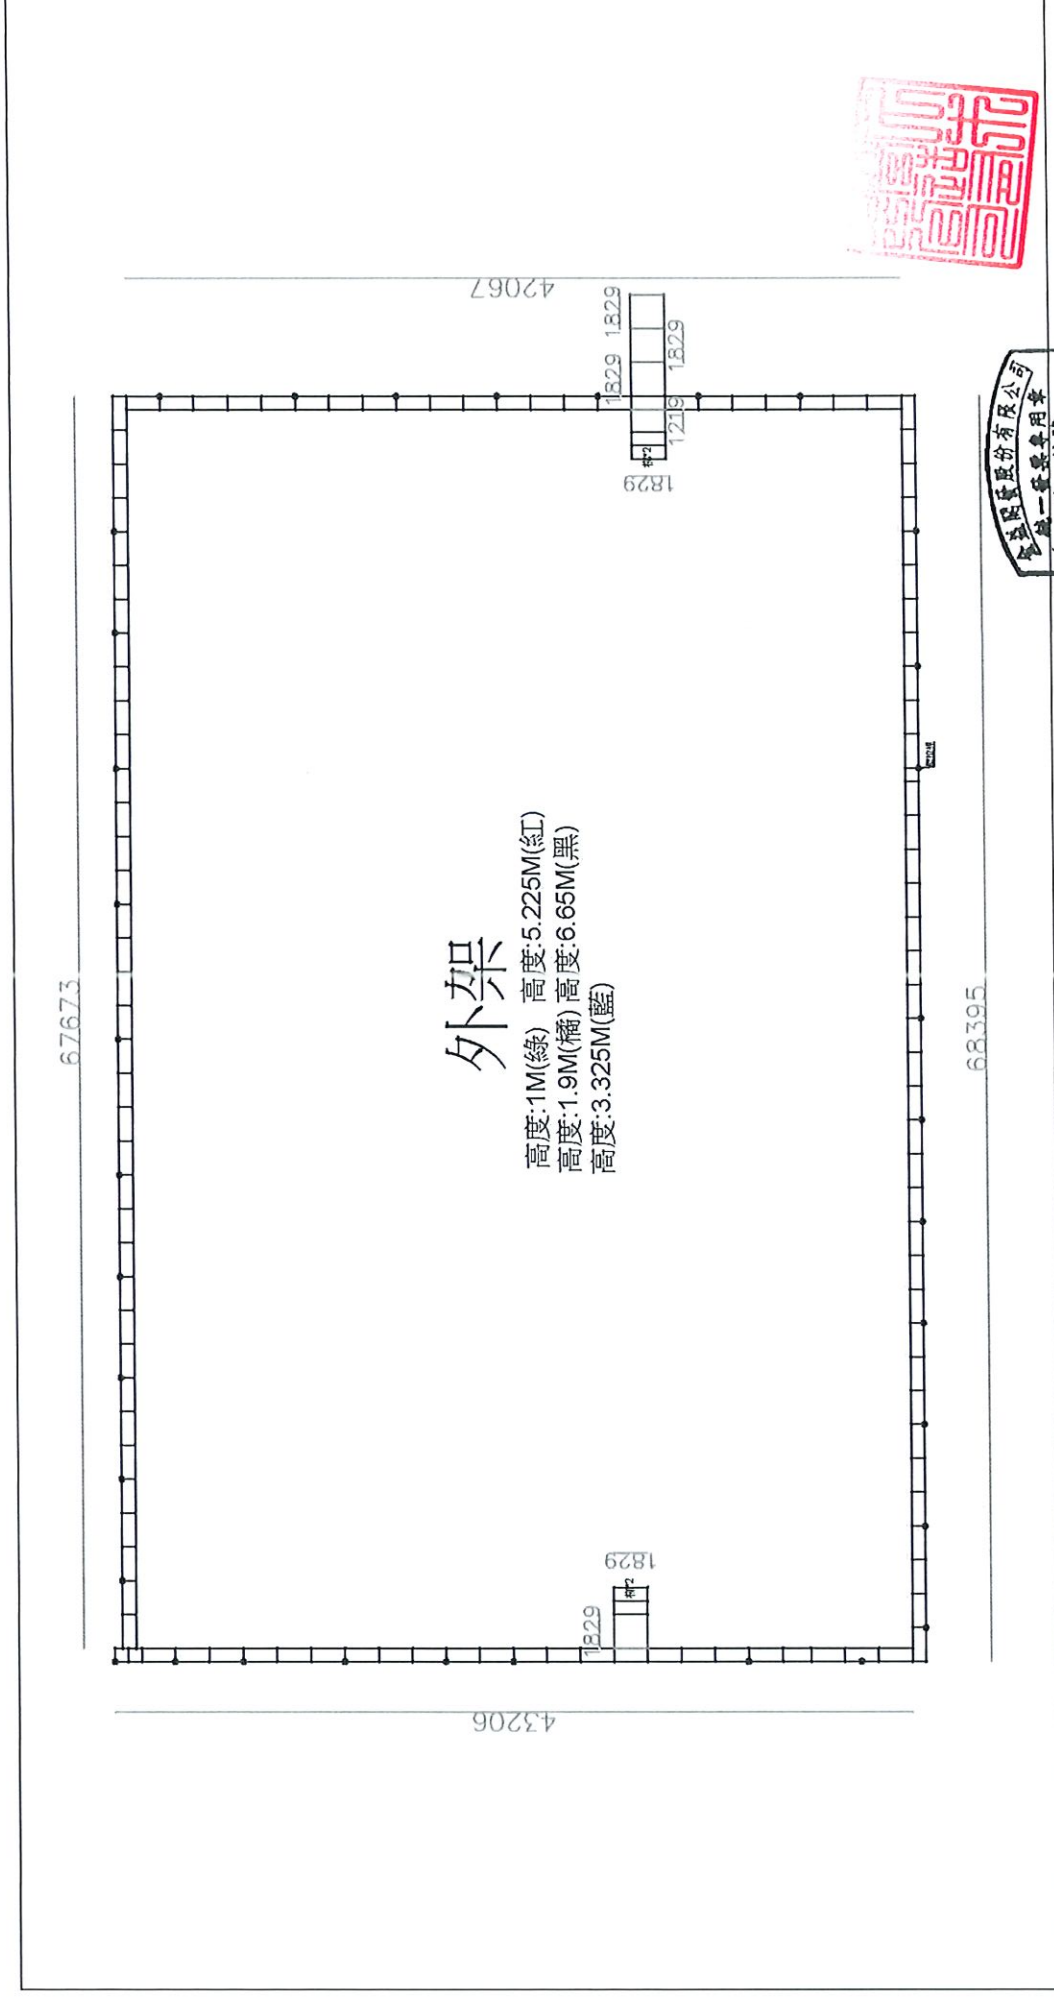

業主簽認：

施工廠商簽認：



工程預算項目總表

列表日期:2025/08/29
共 1 頁 第 1 頁

工程編號：K2508AA
工程名稱：久木營造-雲林縣環保局辦公廳舍新建工程(結構) 棟別：A





序號	工料編號	工料名稱	單位	F	BI	1	2	3	4	5	6	R1	合計
1	C0001070	清水模板	m3	3,069.34	1,541.79	831.84	892.28	628.07	583.79	626.06	403.58	11.36	8,588.12
2	C0102010	高拉力鋼筋及彎紮組立SD420W	噸	405.40	266.55	161.56	172.17	126.99	111.77	118.34	66.20	1.77	1,430.75
3		清水模板		0.00	3,851.03	556.85	1,020.94	777.04	753.27	738.88	441.60	0.00	8,139.61
	C03010	清水模板	m2		2,018.53	556.85	1,020.94	777.04	753.27	738.88	441.60		6,307.10
	F00020	獨立柱	m2		289.61								289.61
	G00012	空垮樑	m2		1,542.89								1,542.89
4		普通模板		5,182.51	3,990.24	5,152.31	4,409.68	3,561.38	3,480.48	3,856.41	2,640.78	126.52	32,400.31
	C03020	普通模板	m2	5,182.51	5,822.74	5,152.31	4,409.68	3,561.38	3,480.48	3,856.41	2,640.78	126.52	34,232.80




雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

B1F基礎料單

統計日期:2025.05.22 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	剪長度	支數	單位重	小計
樑箍筋	#4	1.82		1.82	5.30	2913	0.994	15346
樑箍筋	#4	1.82		1.82	4.90	2367	0.994	11529
樑箍筋	#4	1.82		1.82	4.50	987	0.994	4415
牆預留筋	#5		1.80		1.80	3154	1.56	8856
牆預留筋	#4		5.00		5.00	180	0.994	895
牆預留筋	#4		1.60		1.60	528	0.994	840
寬止筋	#4	0.30		0.25	0.80	150	0.994	119
							#10	117914
							#8	33292
							#7	0
							#6	21620
							#5	16885
							#4	152944
							#3	0
							合計	342654



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

B1F-BS版料單

統計日期:2025.06.27 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	剪長度	支數	單位重	小計
版上層筋	#4		7.80		7.80	12	0.994	93
版上層筋	#4		7.40		7.40	300	0.994	2207
版上層筋	#4		7.00		7.00	588	0.994	4091
版上層筋	#4		6.60		6.60	156	0.994	1023
版上層筋	#4		6.20		6.20	13	0.994	80
版上層筋	#4		5.80		5.80	298	0.994	1718
版上層筋	#4		5.40		5.40	226	0.994	1213
版上層筋	#4		5.00		5.00	364	0.994	1809
版上層筋	#4		4.60		4.60	1547	0.994	7074
版上層筋	#4		3.80		3.80	146	0.994	551
版上層筋	#4		3.40		3.40	27	0.994	91
上工作筋	#4		5.00		5.00	540	0.994	2684
版馬椅	#4		0.20 0.08 0.40	0.08 0.34	1.10	2012	0.994	2200
牆預留筋	#3		0.70	0.20	0.90	2200	0.56	1109
牆預留筋	#3		5.00		5.00	200	0.56	560
備品	#4		6.00		6.00	200	0.994	1193
備品	#3		6.00		6.00	200	0.56	672



樣品

#5	1
#4	3
#3	1

#10	0
#8	0
#7	0
#6	0
#5	599
#4	62182
#3	3853
合計	66634

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

B1F柱牆料單

統計日期:2025.07.16 單位:公尺 材質:#3以上SD420W

備註欄	號數	彎鉤	型狀	彎鉤	剪長度	支數	單位重	小計
			0.35	180度				
寬止筋	#3		0.17	0.08	0.60	300	0.56	101
備品	#3		6.00		6.00	200	0.994	1193
備品	#4		6.00		6.00	200	0.56	672
樣品					#10	1	#10	1400
#8 母材					#8	1	#8	19780
續接器 #8					#7		#7	0
#10 母材					#6		#6	0
續接器 #10					#5	1	#5	19967
					#4	2	#4	33083
					#3	1	#3	10421
合計							84650	



盛記預拌混凝土有限公司

預拌混凝土送貨單

B151-3

客戶名稱：久木營造-環保局

契約編號：

出貨單號：SH14070022

工程名稱：

地址：雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話：05-5571542 傳真：05-5574439

澆置地點：虎尾環保局(高鐵前)

日期：114/07/05

出廠時間：15:55 到達時間：

卸完時間：

車次：47

車 號	KEF-3215 謝東翰		總 重	29,100 kg	水泥型式	
規 格	28日強度	140kg/cm ² kgf/cm ²	空 重	12,970 kg	爐石型式	
	設計塌度	15 cm	淨 重	16,130 kg	飛灰型式	
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.00 %	附加劑型式	
	設計塌流度	cm	交貨數量	7.0 m ³	累計數量	150.0 m ³

含1米水泥管共計151米

備 註	1.在施工现场加水而影響品質，賣方概不負責。 2.材料計量許可差依CNS3090規定。 3.本配比得視早期強度及原料變異機動調整。	調 度 員	林春足	工地簽收	黃金治
-----	---	-------	-----	------	-----

瑞育預拌混凝土股份有限公司 斗六廠 工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 客戶名稱：F3A059 久木營造有限公司 施工地點： 日期：114/07/08 下料序號：					
車 號	KEF-3512	強 度	140	Kg/cm ²	
車 次	第 14 車	設計坍度	15	CM	
數 量	9.0 M ³	最大骨材	25	MM	
累計數量	126.0 M ³				
總 重	33,280 Kg				
空 重	12,300 Kg				
淨 重	20,980 Kg				
施工地點	虎尾高鐵學府一路-PC 0931-534-776黃主任				
出車時間	10:45	到達時間	卸料時間		
調 度 員	DL張淑麗	工地簽收	黃金治		
備 註	*在施工现场加水而影響其強度者，預拌廠概不負責				
地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號				
電 話	05-5576664				

瑁育預拌混凝土股份有限公司


工地名稱：雲林縣環保局辦公廳舍新預拌混凝土送貨單
 客戶名稱：F3A059 久本營造有限公司
 施工地點：日期：114/08/16

斗六廠

編號：SH14080229
 下料序號：

車 號	KEN-6053	強 度	140	Kg/cm ²
車 次	第 5 車	設計坍度	18	CM
數 量	9.0 M ³	最大骨材	25	MM
累計數量	45.0 M ³			
總 重	33,700 Kg			
空 重	12,700 Kg			
淨 重	21,000 Kg			
施工地點	虎尾高鐵學府一路-PC	0931-534-776	黃主任	
出車時間	11:10	到達時間		卸料時間
調 度 員	DL林佳怡	工地簽收	黃金治	
備 註	*在施工現場加水而影響其強度者，預拌廠概不負責		地 址	雲林縣斗六市石榴路369巷101號
		地 電	話	05-5576664

第三聯：客戶存執



盛記預拌混凝土有限公司

預拌混凝土送貨單

B151-3

客戶名稱: 久木營造-環保局

契約編號:

出貨單號: SH14090216

工程名稱:

地址: 雲林縣斗六市榴北里石寮路2-12號

電話: 05-5571542 傳真: 05-5574439

澆置地點: 虎尾環保局(高鐵前)

日期: 114/09/13 出廠時間: 13:36 到達時間: 卸完時間: 車次: 3

車 號	KER-6537 謝有爵		總 重	19,820 kg	水泥型式	
規 格	28日強度	280kg/cm ² kgf/cm ²	空 重	12,900 kg	爐石型式	
	設計塌度	15 cm	淨 重	6,920 kg	飛灰型式	
	最大粒徑	19 mm	水灰(膠)比	0.00 %	附加劑型式	
	設計塌流度	cm	交貨數量	3.0 m ³	累計數量	19.0 m ³

含1米水泥漿共計 20米

備 註	1.在施工现场加水而影響品質，賣方概不負責。 2.材料計量許可差依CNS3090規定。 3.本配比得視早期強度及原料變異機動調整。	調 度 員	林春足	工地簽收	
-----	---	-------	-----	------	--



表報編號： 106

建築物施工日誌

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/9/30

(星期二)

工程名稱		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼		(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	天
開工日期		114年06月17日	核定竣工日	116年2月14日	累計工期	106	日曆天	剩餘工期	502	天
預定進度(%)		7.620%	實際進度(%)	12.737%	本日實際進度(%)	0.253%	展延工期	8	天	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：										
項次	施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
甲	發包工程費									
壹	建築工程									
一	假設及拆除工程									
1	工地拆除，拆除、清除與整平，含運棄(含既有人行道、景觀及既有雜項物)				式	1.00		0.50		
2	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈，裝拆，一般甲種圍籬				M	300.00		150.00		
3	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≤高度，含(頂部)警告燈，裝拆，綠圍籬				M	525.00		525.00		
4	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=8米)				檯	2.00	-	2.00		
5	施工圍籬，大門，含(頂部)警告燈，拆裝(W=4米)				檯	1.00	-	1.00		
6	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，含裝拆				座	1.00		1.00		
7	環境保護，工區臨時抽排水工程，含沉澱池				式	1.00		1.00		
8	工程告示牌及工地標誌，(及安全衛生告示牌)				式	1.00		1.00		
10	工地臨時建築設施，(組立式臨時房屋，二層建築)，長16.5m，(跨度，3k，5.4~5.64m)，含水電空調等				棟	1.00		1.00		
11	工地臨時建築設施，辦公設備，租用折舊(含桌椅、櫥櫃、電腦、事務影印機)				式	1.00		1.00		
12	工地臨時建築設施，臨時廁所				組	1.00		1.00		
13	臨時設施，工程用電設備、用水、資通訊設備，含申請及設備架設				式	1.00		1.00		
14	臨時設施，臨時水、電、電信通訊費				月	20.00		4.00		
15	施工輔助設施，施工架及防護網，鋼管，裝拆(含租金)，扶手先行，含上下設備及其他所需配件，pc鋪底，圓盤系統施工架				M2	8,671.00		1,400.00		
20	動土典禮及完工啟用典禮				式	1.00		0.50		
二	基礎工程									
1	施工測量，工地放樣				M2	19,980.00		5,460.00		
2	構造物開挖，機械挖，含近運暫存				M3	24,525.00		24,525.00		
3	構造物回填，原材料回填，含運費，85%≤壓實度				M3	11,610.00		1,300.00		
4	廢方處理，含揚塵抑制，含近運堆置				M3	12,915.00		12,915.00		
5	隧道噴凝土，175kgf/cm2，t=5cm				M2	3,642.00		3,642.00		
6	安全觀測系統				式	1.00		1.00		
7	祛水，點井，深度<6m				支	48.00		48.00		
三	建築結構體工程									
1	普通模板，(建築，建築物)				M2	31,257.00	100.00	10,513.00		
2	清水模板，(建築，建築物)				M2	6,717.00		2,020.00		
4	鋼筋，SD420W，連工帶料				T	1,411.00	40.00	534.00		
5	鋼筋，鋼筋續接器，SA級				個	4,729.00		1,482.00		
6	結構用混凝土，140kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實				M3	295.00		295.00		
7	結構用混凝土，280kgf/cm2，第1型水泥，含澆置及搗實				M3	8,451.00		2,961.00		
10	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理				M2	10,528.00		2,300.00		
八	地坪裝修工程									
4	混凝土表面處理，水泥粉光處理，混合金鋼砂(F4)				M2	658.00		380.00		
十一	防水工程									
5	塗液類防潮，基礎底板防水，(WP5)				M2	2,740.00		2,740.00		
二	弱電工程				式					
1	電信工程				式					
z	接地工程接地電阻值小於10歐姆(內設接地端子)及接地銅棒3m x Φ19(3/4")mm及裸銅線 60 mm ² 等工程完成所需材料				式	1.00		1.00		
11	避雷接地工程				式					

建築物施工日誌

表報編號： 106

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/9/30

(星期二)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程					承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	天	
開工日期	114年06月17日	核定竣工日	116年2月14日	累計工期	106	日曆天	剩餘工期	502	天	
預定進度(%)	7.620%	實際進度(%)	12.737%	本日實際進度(%)	0.253%		展延工期	8	天	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
d	接地銅棒3m × φ19(3/4")mm	只	7.00		7.00	
e	裸銅線 100 mm ²	米	23.00		23.00	
三	給排水設備工程	式				
2	排水工程	式				
z	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 100mmΦ(4")×6.6mm	米	141.00		141.00	
27	筏基連通管PVC管(CNS1298 B管), 筏基連通管 配管另件另料	式	1.00		1.00	
一	職業安全衛生, 可量化部分	式	1.00		0.20	
二	職業安全衛生, 不可量化部分	式	1.00		0.20	
三	環境保護, 環境保護措施(可量化部分)	式	1.00		0.50	
四	環境保護, 環境保護措施(不可量化部分)	式	1.00		0.20	
一	品質管理, 品管事務費(包括品管人員及廠商品質管理作業規定之應辦事項等費用)	式	1.00		0.20	
二	品質管理, 材料設備檢試驗費	式	1.00		0.15	
伍	承包商管理及利潤費(包含工地管理費、利潤、契約規定之工程保險費、使用執照申請作業費、工程勘驗、竣工審查與其相關簽證、綠建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費、配合主辦機關申請國內獎項及其他雜項費用), (壹. 一~壹. 二合計之8%)		1.00	0.250%	12.73%	
陸	臨時設施, 工地縮時攝影(含設備租借及剪輯費)	式	1.00		100.00%	
柒	營造綜合保險(甲. 壹~甲. 伍合計0.25%)		1.00		100.00%	
捌	營業稅, (甲. 壹~甲. 伍合計5%)		1.00	0.250%	12.73%	
營造業專業工程特定施工項目						

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
鋼筋, SD420W, 連工帶料	T	1,411.0		494.0	
鋼筋, 鋼筋續接器, D25mm(#8), 連工帶料, 柱	組	4,729.0		1,482.0	
建築用混凝土, 140kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	295.0		295.0	
結構用混凝土, 280kgf/cm ² , 含澆置及搗實	M3	8,451.0		2,961.0	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人	工別	本日人數	累計人	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
組 工	2	187	施工架工		34	挖(鏟)土機		48
鐵 工		11	泥作工		20	混凝土運輸車		356
水電工		120	油漆工		14	混凝土泵輸車		11
續接工		4	技術工		115	移動式全吊車	1	22
鋼筋工	40	542				吊卡車		4
模板工	10	726				拖車		
混凝土工		78				搬運車		26

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

建築物施工日誌

表報編號： 106

本日天氣： 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2025/9/30

(星期二)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				承造人		久木營造有限公司		
建(雜)照號碼	(114)(雲)營建字第00144號						不計工期	0	天
開工日期	114年06月17日	核定竣工日	116年2月14日	累計工期	106	日曆天	剩餘工期	502	天
預定進度(%)	7.620%	實際進度(%)	12.737%	本日實際進度(%)	0.253%	展延工期	8	天	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
六、施工取樣試驗紀錄：									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄(註4)：地下室一層牆模板支撐(含修改)、地下室一層頂版梁鋼筋綁紮、召開第15次工務會議									
簽章：【工地主任】(註5)：									

- 註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。
3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

公共工程監造報表

表報編號：雲A01_1140930

本日天氣：上午：晴☀ 下午：晴☀

填報日期：114年09月30日(星期二)

工程名稱	雲林縣環保局辦公廳舍新建工程						
契約工期	600天	開工日期	114年06月17日	預定完工日期	116年02月14日	實際完工日期	-
契約變更次數	0次	工期展延天數		8.0天	契約金額	原契約：607,000,000元	
預定進度(%)	7.6200%	實際進度(%)		12.7370%		變更後契約：\$0元	
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量):							
1、模板束模_B1F牆 (含修改) 2、鋼筋綁紮_B1F樑、頂版							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形):							
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形):							
四、督導工地職業安全衛生事項:							
(一)施工前檢查事項辦理情形: ☒ 完成 ☐ 未完成							
(二)其他工地安全衛生督導事項:							
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等):							
召開_工務會議_第015次							
監造單位簽章:							



註：

1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部最新訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

雲林縣環境保護局

物價指數(總指數)調整工程款明細表

工程名稱：		雲林縣環保局辦公廳舍新建工程				契約編號		114-041		增減均調整	
開標(議價)日		114年03月07日		開標(議價)當月物價指數：(A)		112.56		預付款E%：(註1)		調整方式：	
估驗期別	估驗日期(估驗基準日)	當期直接工程費		小計H=D-E	估驗日當月物價指數(B)	調整門檻%：		指數增減率 C=(B/A-1)*100%	調整金額(註3)(註6) H*(C之絕對值-調整門檻)*1.05	備註：應扣除金額E之明細說明	
		估驗金額(D)	應扣除金額(E) (註2)								
1	114.06.30	9,301,917	1,256,708	8,045,208	111.97			-0.5242%	0		
2	114.07.31	33,335,922	5,389,717	27,946,205	111.83			-0.6485%	0		
3	114.08.31	14,357,822	2,590,182	11,767,640	112.15			-0.3643%	0		
4	114.09.30	17,995,460	2,823,540	15,171,920	112.09			-0.4176%	0		

註：
 1. 係指已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。
 2. 係指契約規定應扣除項目：(例如：規劃費、設計費、管理費(品質管理費、安全維護費、安全衛生管理費.....)、營業稅、保險費、利潤、訓練費、檢(試)驗費...等)之當期估驗總金額。
 3. 指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償；指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。
 4. 工程款物價指數調整處理原則、計算方式(範例)、函釋等，參見工程會全球資訊網>政府採購>工程款物價指數調整。
 5. 契約訂有辦理物價指數調整者，本表應併入結(決)算、估驗等計價明細表內。
 6. 物價指數調整款依契約第5條契約價金之給付條件第(6)款本契約依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過2.5%之部分。

監造單位：

承包廠商：




營造工程物價指數（總指數）銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56	112.49	112.23	111.97	111.83	112.15	112.09				

註：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

1


114.09.01-B1F柱續接器扭力值查驗

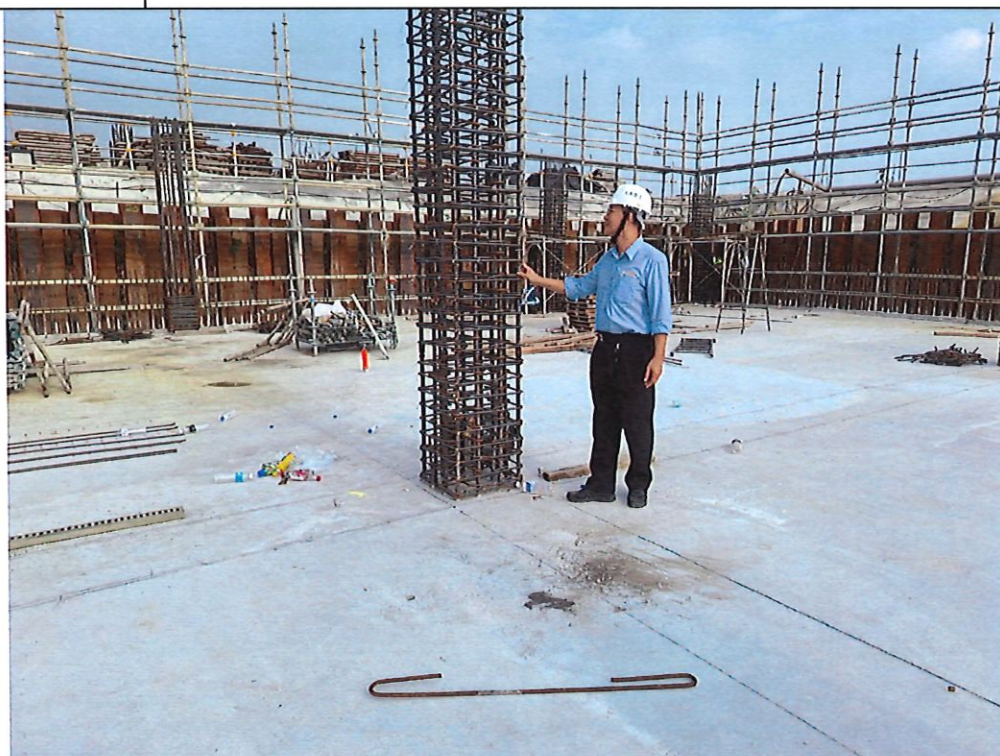

相片說明

2

114.09.01-技師督導B1F續接柱鋼筋



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程


承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

114. 09. 02-地樑混凝土抗壓試驗(280kg/cm2)


3

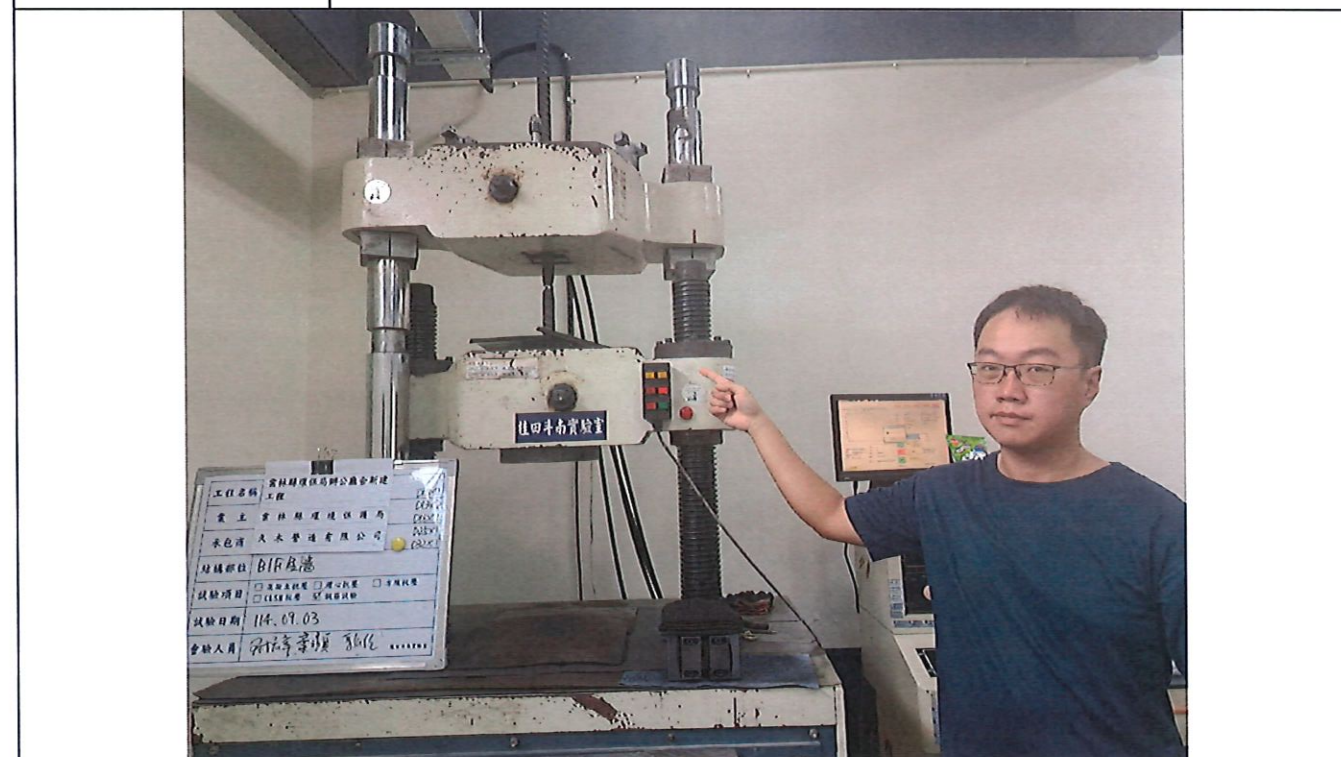

相片說明

114. 09. 03-B1F柱牆鋼筋試驗

4



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

5


114. 09. 08-車輛出入洗車台清洗



相片說明

6

114. 09. 12-B1F柱牆鋼筋綁紮



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

7



114.09.13-B1F車道版混凝土試體取樣(280kg/cm²)



相片說明

8

114.09.13-B1F車道版混凝土澆置完成



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

9


114.09.15-筏基頂版混凝土抗壓試驗(140kg/cm²)



相片說明

10

114.09.17-B1F牆模板封模



雲林縣環境保護局

工程名稱: 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商: 久木營造/祥旺機電/正益空調



相片說明

114. 09. 21-B1F牆模板封模完成


11



相片說明

114. 09. 21-B1F頂版樑及清水模板組立


12



雲林縣環境保護局

工程名稱:雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

承包廠商:久木營造/祥旺機電/正益空調

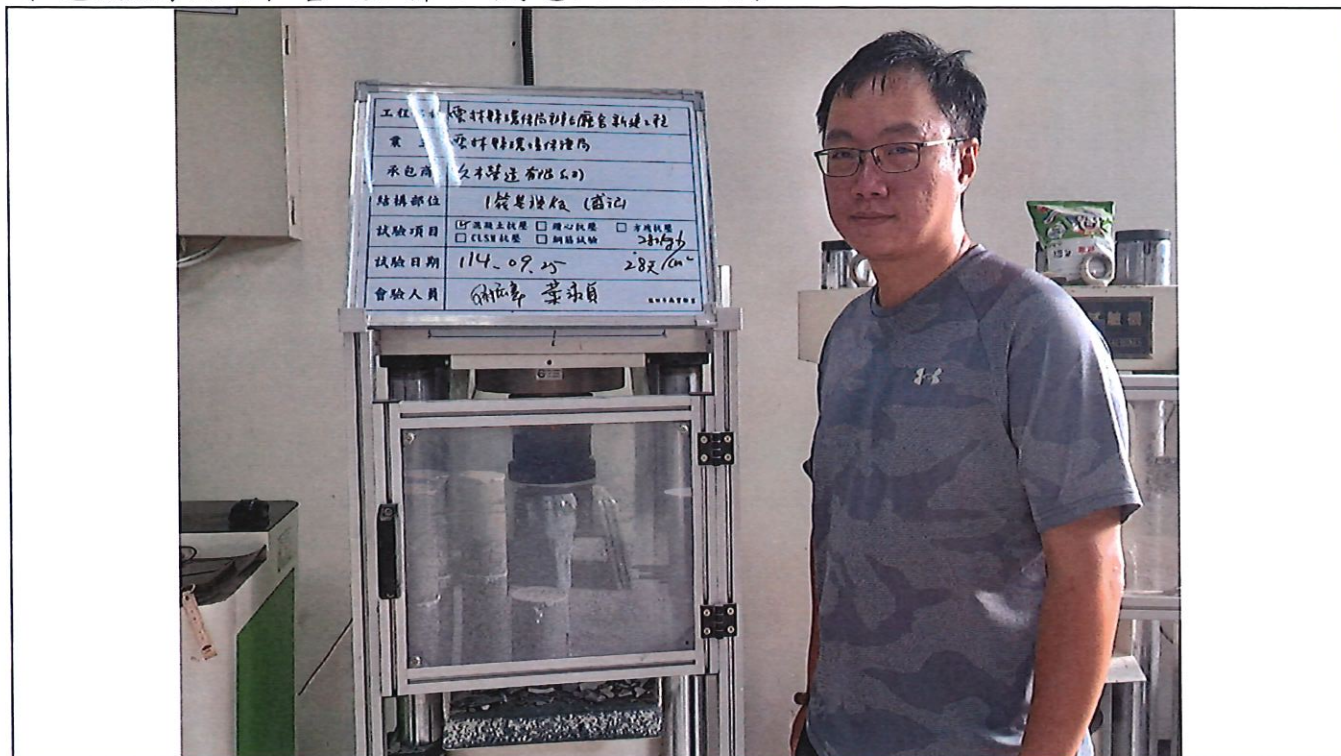

相片說明

13

1140925_筏基頂版混凝土抗壓試驗(280kg. cm2)



相片說明

14

1140929-B1F頂版清水模板組立完成

