

檔 號：
保存年限：

雲林縣環境保護局 函

地址：雲林縣斗六市雲林路一段170號
承辦人：馬弘任
電話：05-5526323
傳真：05-5370420
電子信箱：ylepb1289@ylepb.gov.tw

受文者：本局行政科

發文日期：中華民國114年7月29日
發文字號：雲環行字第1141026663號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關貴事務所轉知，久木營造有限公司提送「雲林縣環保局辦公廳舍新建工程」114年6月份安全監測報告（初始值），本局敬悉，請查照。

說明：

- 一、復貴事務所114年7月25日碩環字第1140725001號函。
- 二、旨揭文件1式3份，由貴事務所、久木營造有限公司及本局各執1份，據以辦理後續事宜。

正本：吳建志賴人碩聯合建築師事務所
副本：久木營造有限公司(含附件)、本局行政科

局長張喬維

本案依分層負責規定授權業務主管決行

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

114年7月3日
安全監測報告

承攬廠商:久木營造有限公司
監測廠商:揚聯科技股份有限公司




傾斜管監測報告

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

初值日期：114年6月28日

[illegible]

位移量 單位：MM

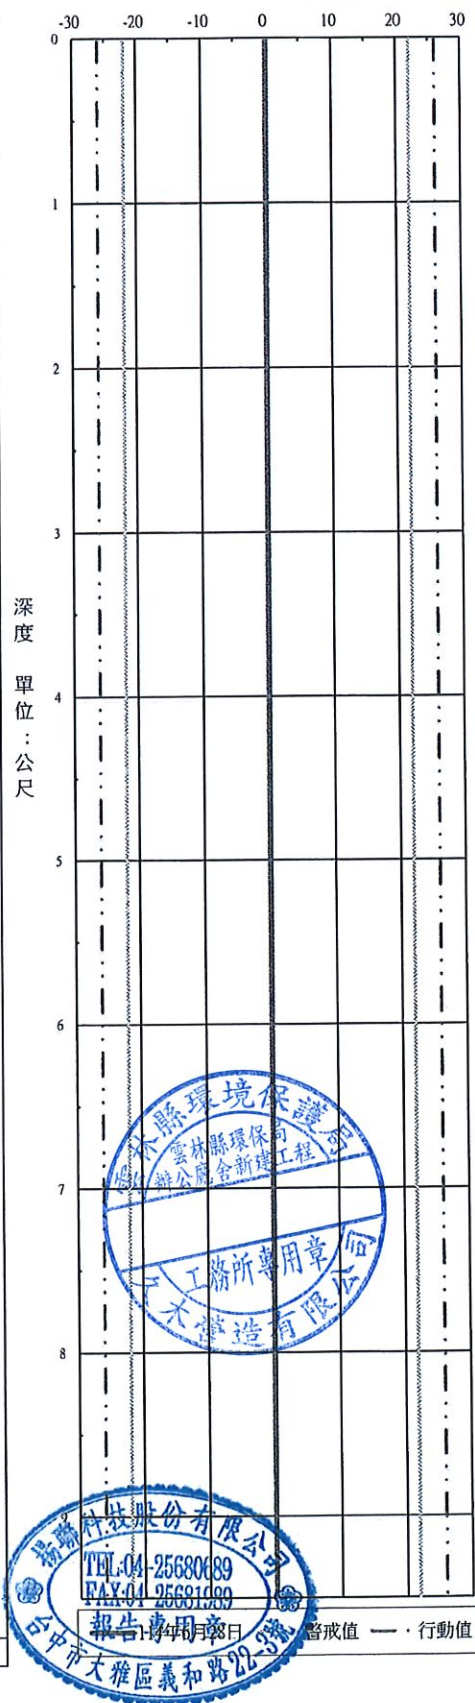

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

傾斜管監測報告

承攬廠商：久木營造有限公司


監測廠商：揚聯科技股份有限公司


量測日期：114年6月28日

初值日期：114年6月28日

儀器編號	觀測深度 (m)	初始值		觀測值		變化量 (mm)	位移量 (mm)	備註
		A+	A-	A+	A-			
SO2	0.0	0	0	0	0	0.00	0.00	本次量測最大變化位移量為0mm，其值均在警戒值範圍內，因屬正常之變化。
	0.5	-250	277	-250	277	0.00	0.00	
	1.0	-122	133	-122	133	0.00	0.00	
	1.5	127	-100	127	-100	0.00	0.00	
	2.0	171	-147	171	-147	0.00	0.00	
	2.5	140	-115	140	-115	0.00	0.00	
	3.0	111	-86	111	-86	0.00	0.00	
	3.5	56	-33	56	-33	0.00	0.00	
	4.0	27	-3	27	-3	0.00	0.00	
	4.5	23	5	23	5	0.00	0.00	
	5.0	127	-101	127	-101	0.00	0.00	
	5.5	274	-240	274	-240	0.00	0.00	
	6.0	398	-367	398	-367	0.00	0.00	
	6.5	357	-327	357	-327	0.00	0.00	
	7.0	321	-287	321	-287	0.00	0.00	
	7.5	297	-270	297	-270	0.00	0.00	
	8.0	228	-199	228	-199	0.00	0.00	
	8.5	93	-75	93	-75	0.00	0.00	
	9.0	152	-132	152	-132	0.00	0.00	
	9.5	133	-115	133	-115	0.00	0.00	
								警戒值:22mm 行動值:26mm
								變化量 [(量測值(A+)-(A-))-(初值(A+)-(A-))]/100 位移量 [單點(變化量+位移量)] 為上一深度位移量

SO2量測曲線圖

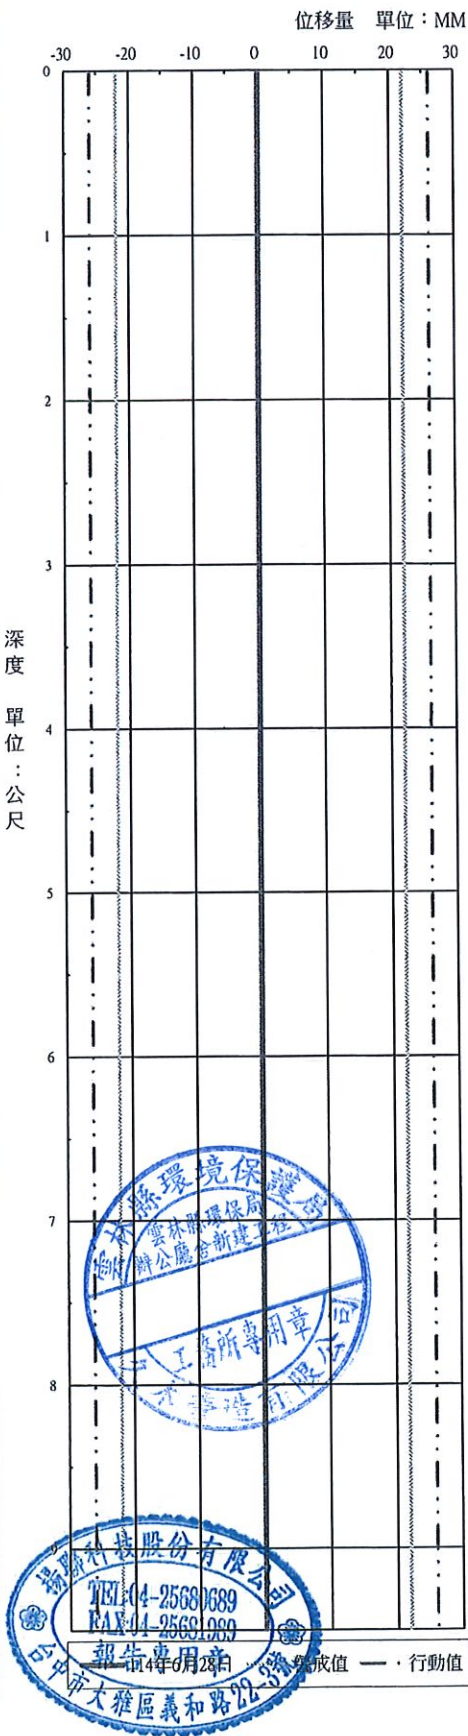

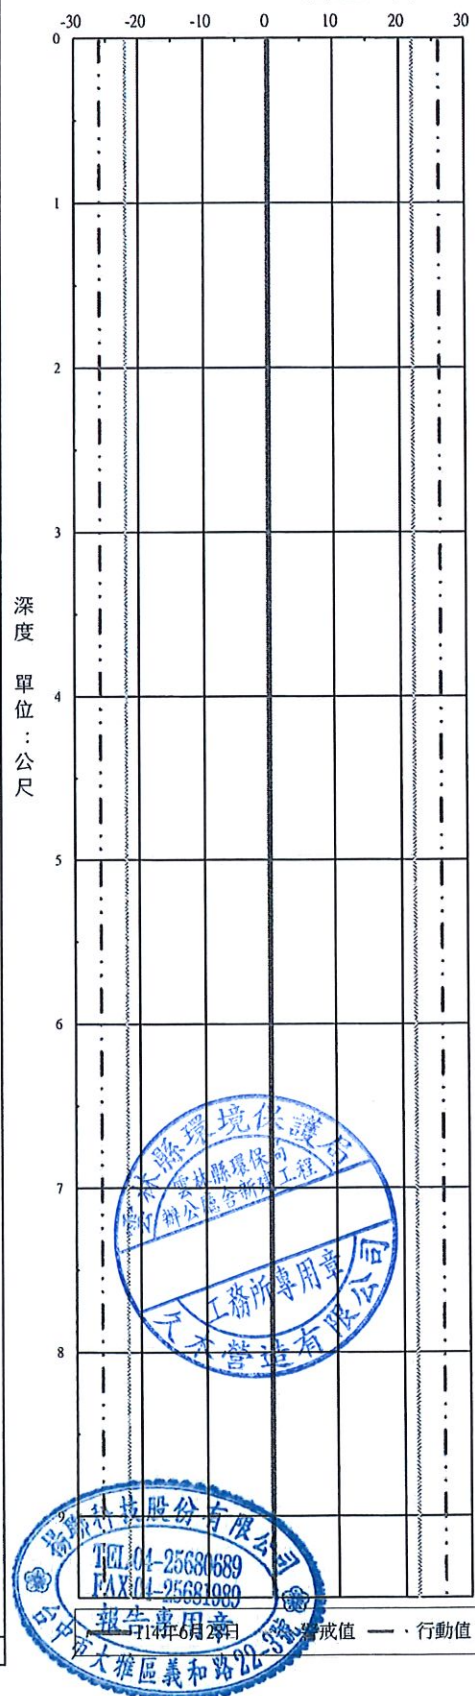

傾斜管監測報告

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

初值日期：114年6月28日


變化量

$$\frac{[(量測值(A+)-(A-))-(初值(A+)-(A-))]}{100}$$
 位移量

$$\frac{[單點(變化量+位移量)]}{為上一深度位移量}$$

SO₄量測曲線圖

位移量 單位：MM

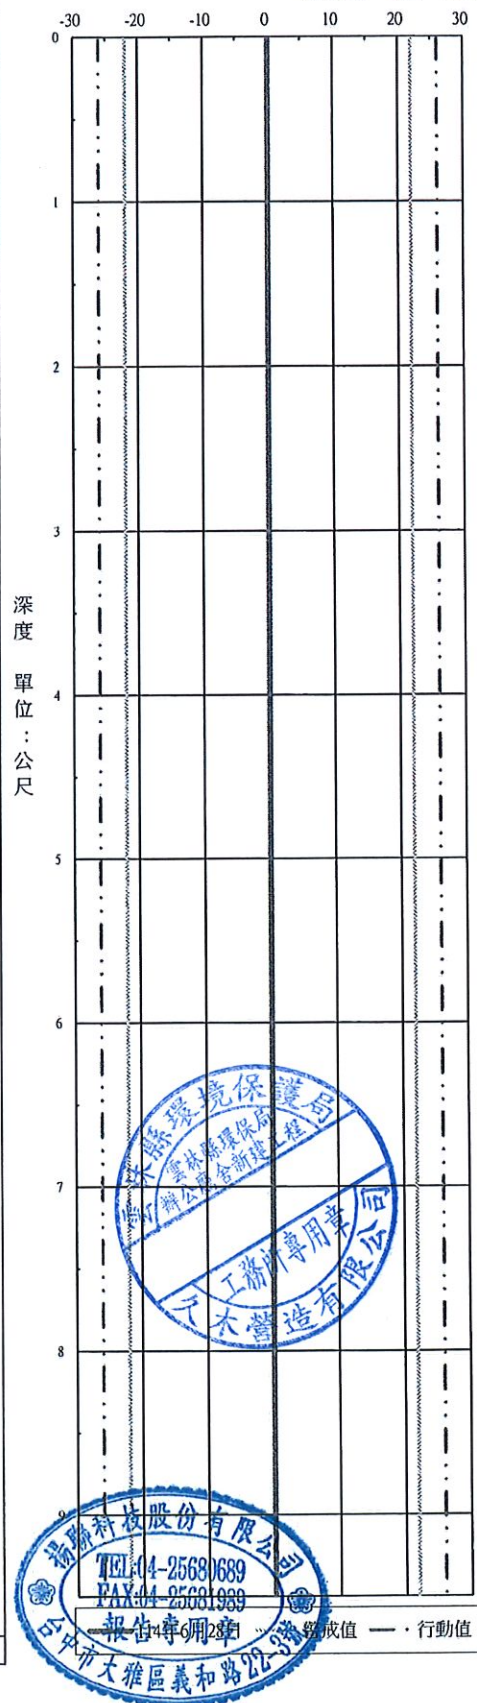

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

沉陷觀測點監測報告

承攬廠商：久木營造有限公司

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

讀值單位：公分

沉陷點沉陷量

[illegible]

管理值			
觀測項目	單位	警戒值	行動值
沉陷觀測點	公分	3.0	4.0

備註：負值(-)為沉陷，正值(+)為隆起。

量測結果：本次監測項目之變化量均處於安全管理值內，故現階段應無安全上之顧慮



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

水位觀測井監測報告

承攬廠商：久木營造有限公司

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

觀測儀器：水位觀測井

單位：公尺

[illegible]

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

水壓計監測報告

承攬廠商：久木營造有限公司

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

日期	編號	水壓 (T/M^2)	水位高程(m)
114年7月3日	EP1	6.92	-7.08m
	EP2	7.15	-6.85m
管理值		警戒值	行動值
地下水壓		水位GL-1.0m	水位OL-0.5m



雲林縣環保局辦公廳舍新建工程

筏基礎板水壓監測報告

承攬廠商：久木營造有限公司

監測廠商：揚聯科技股份有限公司

觀測儀器：電子式水壓計

初值日期：114年7月3日

[illegible]
